Lista de Corte			
Cantidad	Perfil	Longitud	
1	PGC100X0.90	81 mm	(A)
1	PGC100X0.90	171 mm	(B)
1	PGC100X0.90	222 mm	(C)
1	PGC100X0.90	352 mm	(D)
1	PGC100X0.90	444 mm	(E)
1	PGC100X0.90	537 mm	(F)
1	PGC100X0.90	629 mm	(G)
1	PGC100X0.90	721 mm	(H)
1	PGU 100x0.90	704 mm	
1	PGU 100x0.90	779 mm	
1	PGU 100x0.90	2205 mm	
1	PGU 100x0.90	2263 mm	

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

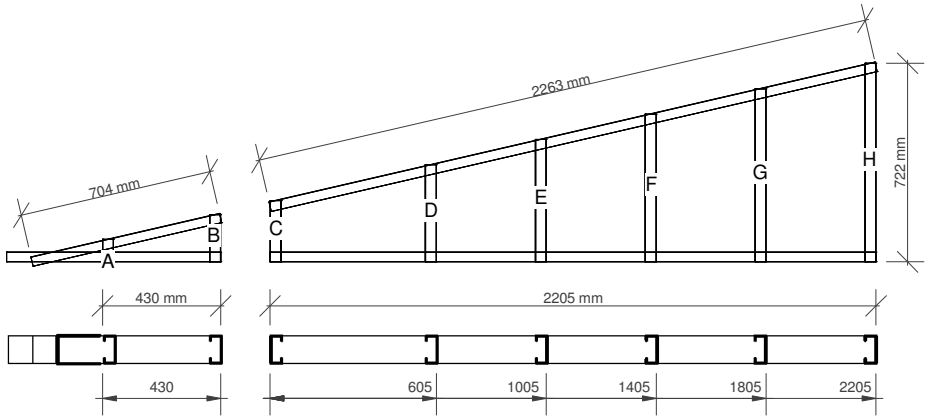

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PEX1

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
1	PGC100X0.90	154 mm (A)
1	PGC100X0.90	276 mm (B)
1	PGC100X0.90	398 mm (C)
1	PGC100X0.90	520 mm (D)
1	PGC100X0.90	643 mm (E)
1	PGC100X0.90	765 mm (F)
1	PGC100X0.90	887 mm (G)
1	PGU 100x0.90	2868 mm
1	PGU 100x0.90	2999 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

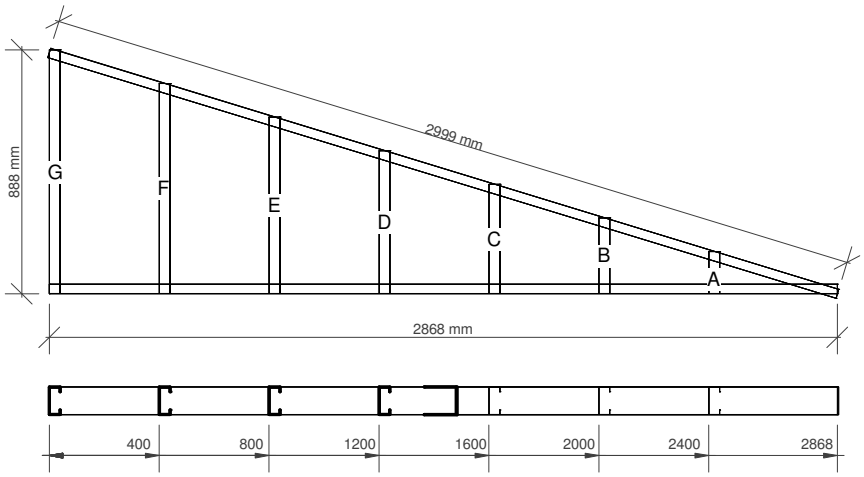

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PEX2

ESCALA 1:25

Lista de Corte			
Cantidad	Perfil	Longitud	
1	PGC100X0.90	81 mm	(A)
1	PGC100X0.90	167 mm	(B)
1	PGC100X0.90	260 mm	(C)
1	PGC100X0.90	352 mm	(D)
1	PGC100X0.90	444 mm	(E)
1	PGC100X0.90	537 mm	(F)
1	PGC100X0.90	629 mm	(G)
1	PGC100X0.90	721 mm	(H)
1	PGU 100x0.90	3152 mm	
1	PGU 100x0.90	3164 mm	

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

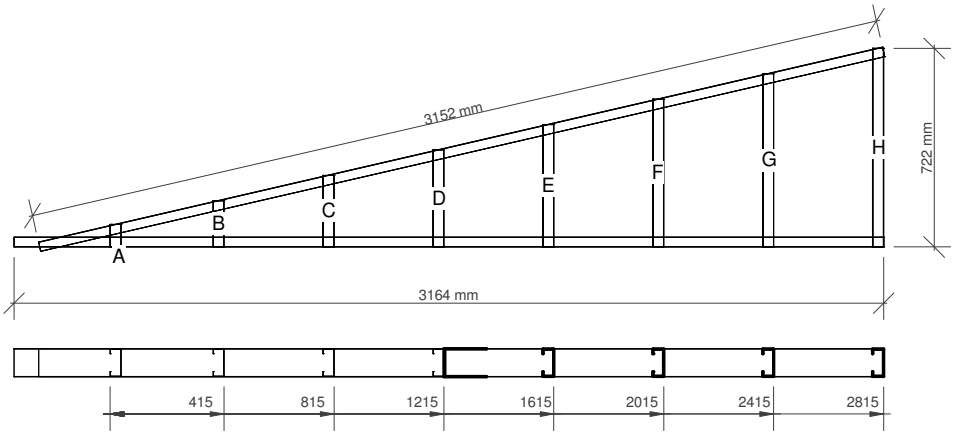

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PEX3

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
1	PGC100X0.90	205 mm
4	PGC100X0.90	716 mm
4	PGC100X0.90	2133 mm
2	PGC100X0.90	3277 mm
2	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGC150x1.60	1598 mm
2	PGU 100x0.90	100 mm
1	PGU 100x0.90	285 mm
1	PGU 100x0.90	1598 mm
2	PGU 100x0.90	1678 mm
2	PGU 100x0.90	1883 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

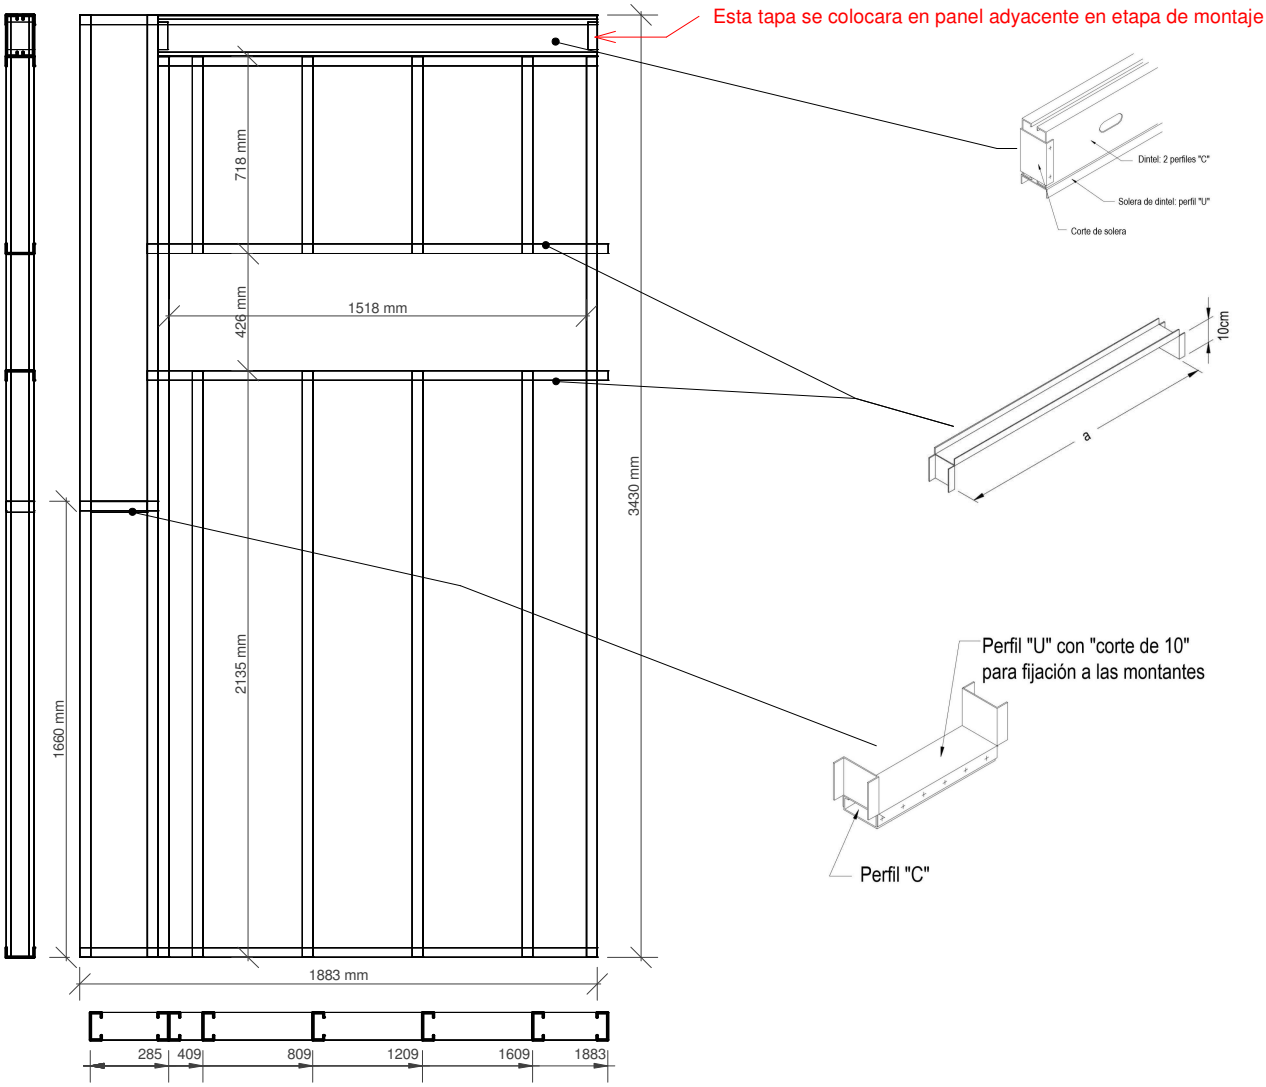

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PEX101

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
1	PGC100X0.90	374 mm
3	PGC100X0.90	716 mm
3	PGC100X0.90	2133 mm
2	PGC100X0.90	3277 mm
3	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGC150x1.60	1598 mm
2	PGU 100x0.90	100 mm
1	PGU 100x0.90	454 mm
1	PGU 100x0.90	1598 mm
2	PGU 100x0.90	1678 mm
2	PGU 100x0.90	2177 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

Esta tapa se colocara en panel adyacente en etapa de montaje

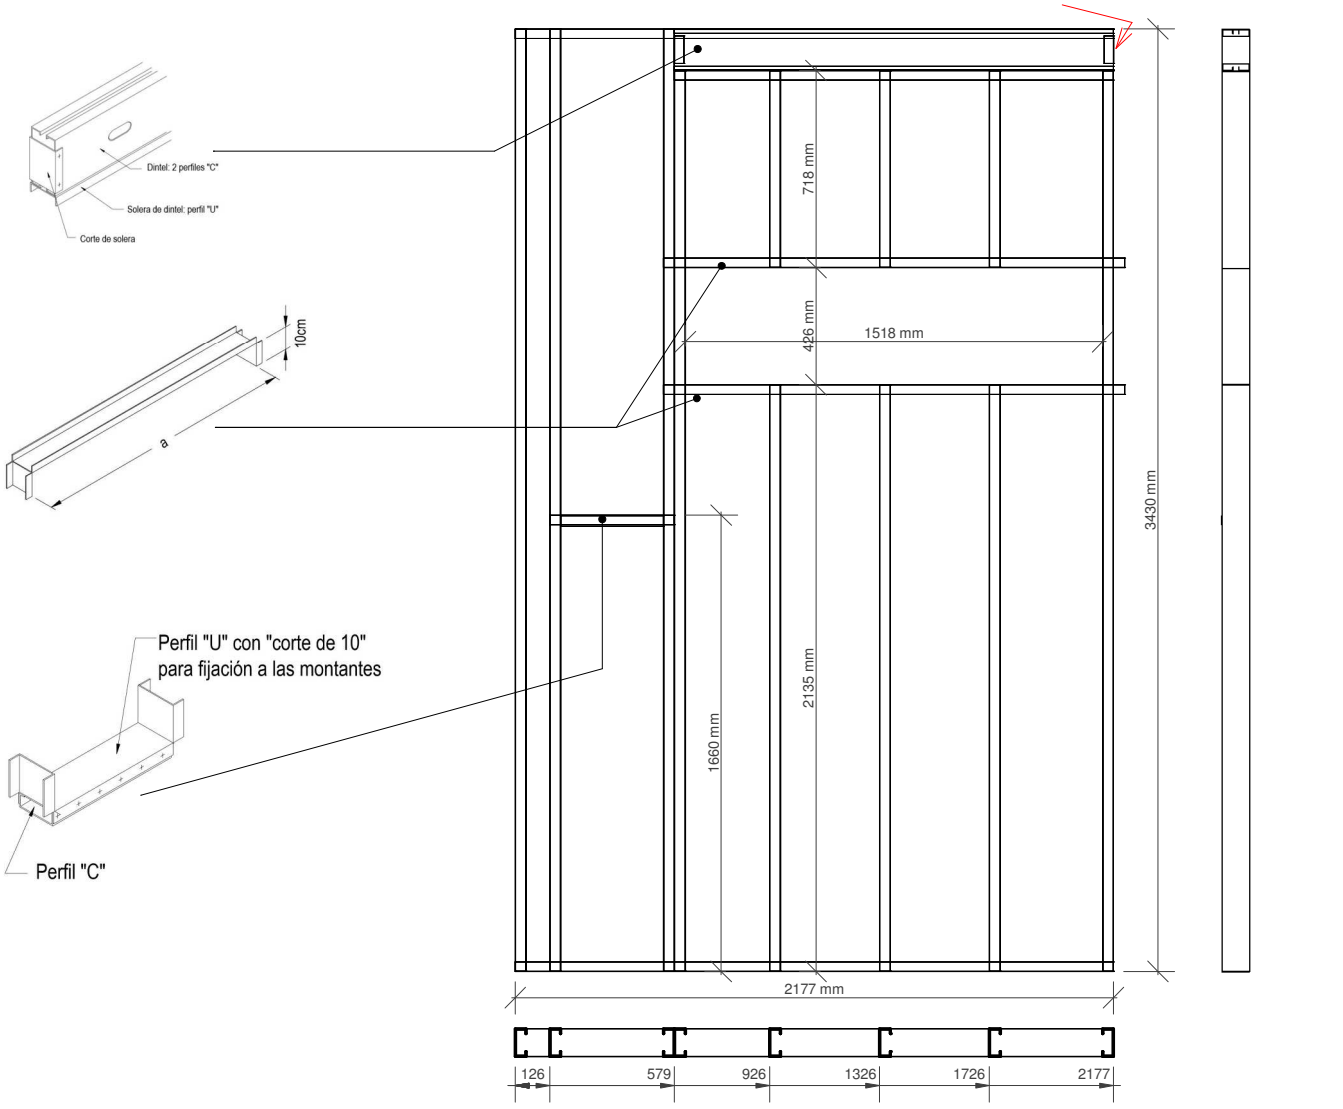

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PEX102

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
1	PGC100X0.90	308 mm
4	PGC100X0.90	3428 mm
1	PGU 100x0.90	388 mm
2	PGU 100x0.90	918 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

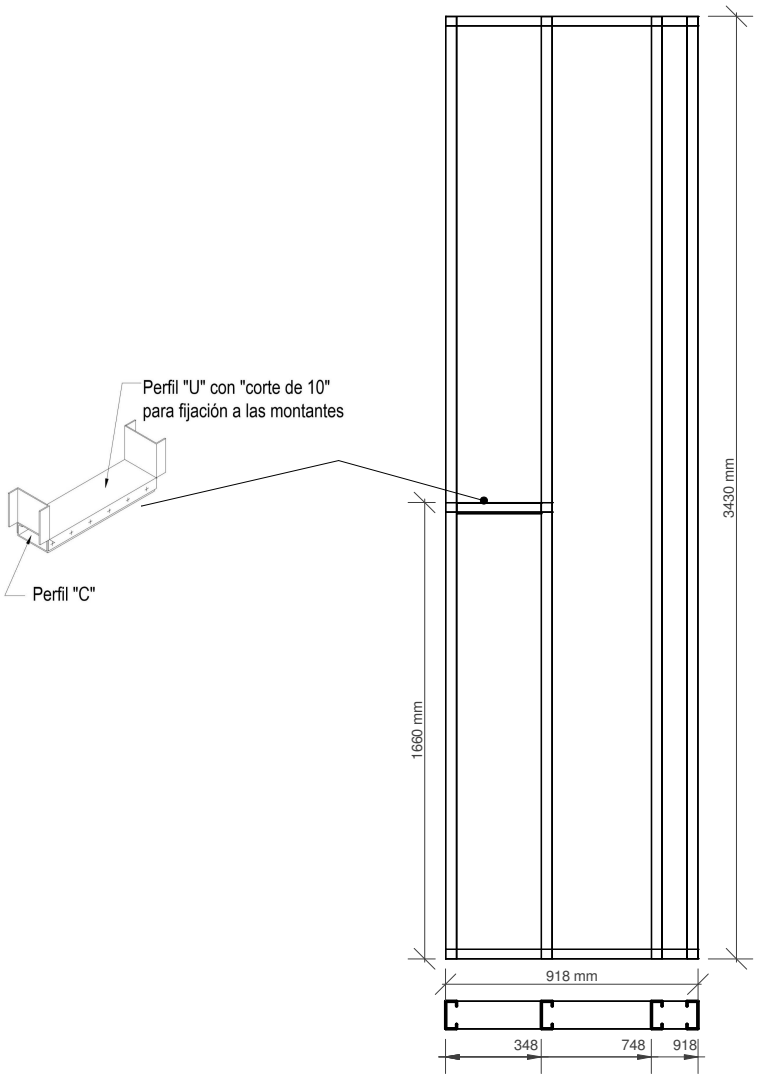

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PEX103

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
2	PGC100X0.90	3227 mm
4	PGC100X0.90	3428 mm
1	PGU 100x0.90	101 mm
1	PGU 100x0.90	824 mm
1	PGU 100x0.90	925 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

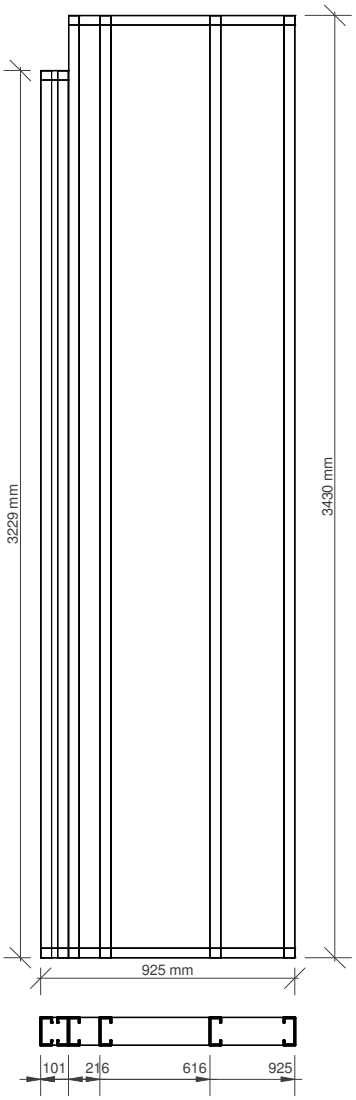

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PEX104

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
5	PGC100X0.90	716 mm
1	PGC100X0.90	3277 mm
3	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGC150x1.60	1479 mm
2	PGU 100x0.90	100 mm
1	PGU 100x0.90	1479 mm
1	PGU 100x0.90	1498 mm
2	PGU 100x0.90	1621 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

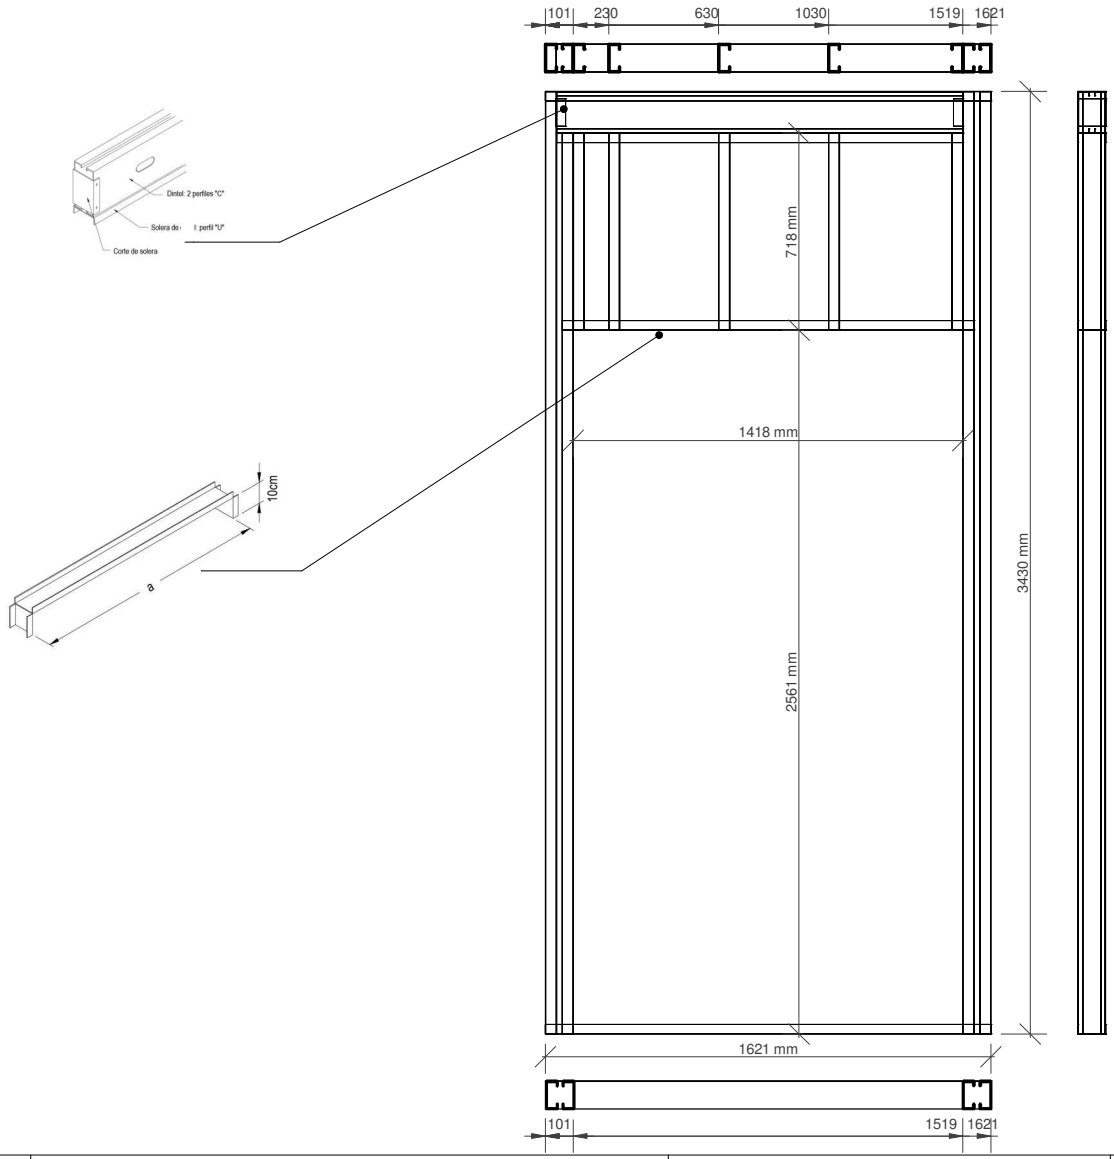

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PEX105

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
2	PGC100X0.90	3227 mm
4	PGC100X0.90	3428 mm
1	PGU 100x0.90	101 mm
1	PGU 100x0.90	824 mm
1	PGU 100x0.90	925 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

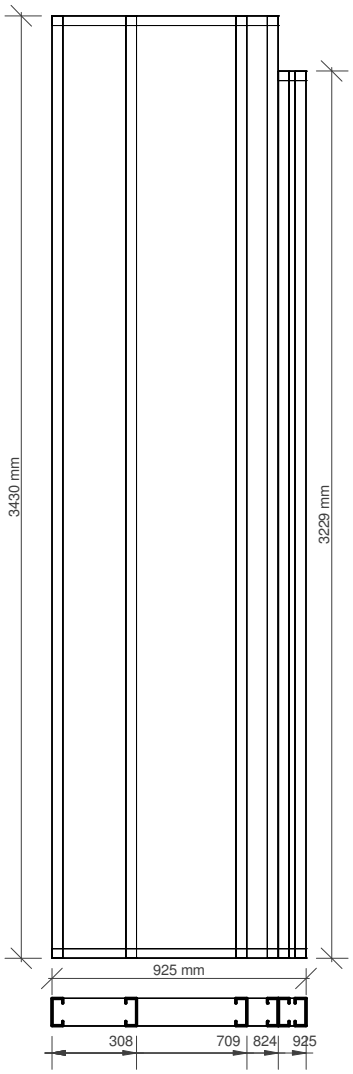

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PEX106

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
1	PGC100X0.90	360 mm
3	PGC100X0.90	716 mm
3	PGC100X0.90	983 mm
2	PGC100X0.90	3277 mm
4	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGC150x1.60	1298 mm
2	PGU 100x0.90	100 mm
1	PGU 100x0.90	440 mm
1	PGU 100x0.90	1298 mm
2	PGU 100x0.90	1378 mm
1	PGU 100x0.90	2148 mm
1	PGU 100x0.90	2149 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

Esta tapa se colocara en panel adyacente en etapa de montaje

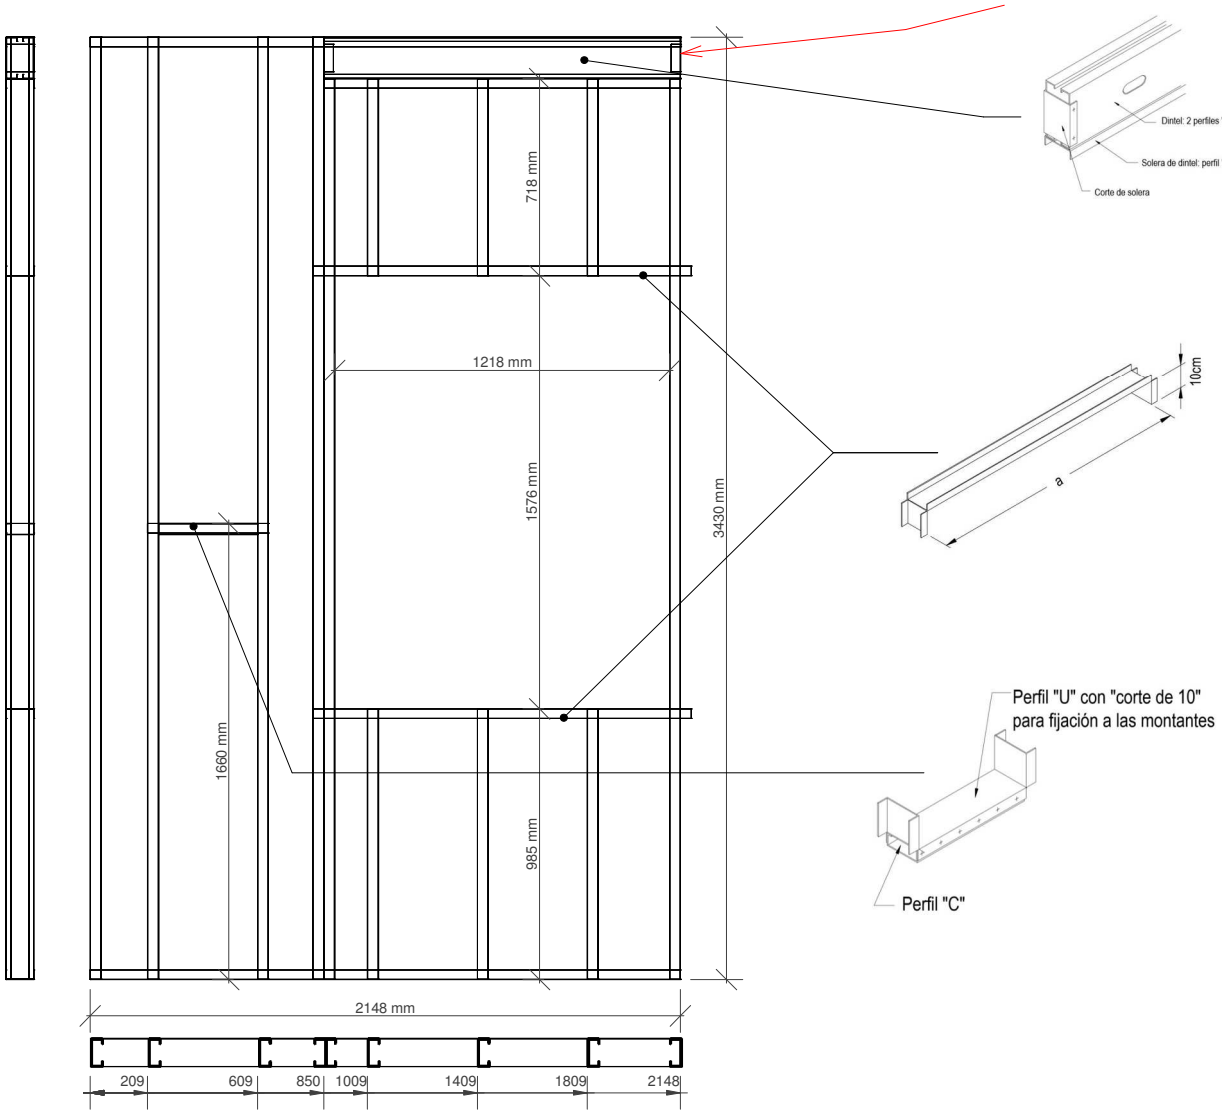

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PEX107

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
1	PGC100X0.90	360 mm
4	PGC100X0.90	3428 mm
1	PGU 100x0.90	440 mm
2	PGU 100x0.90	630 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

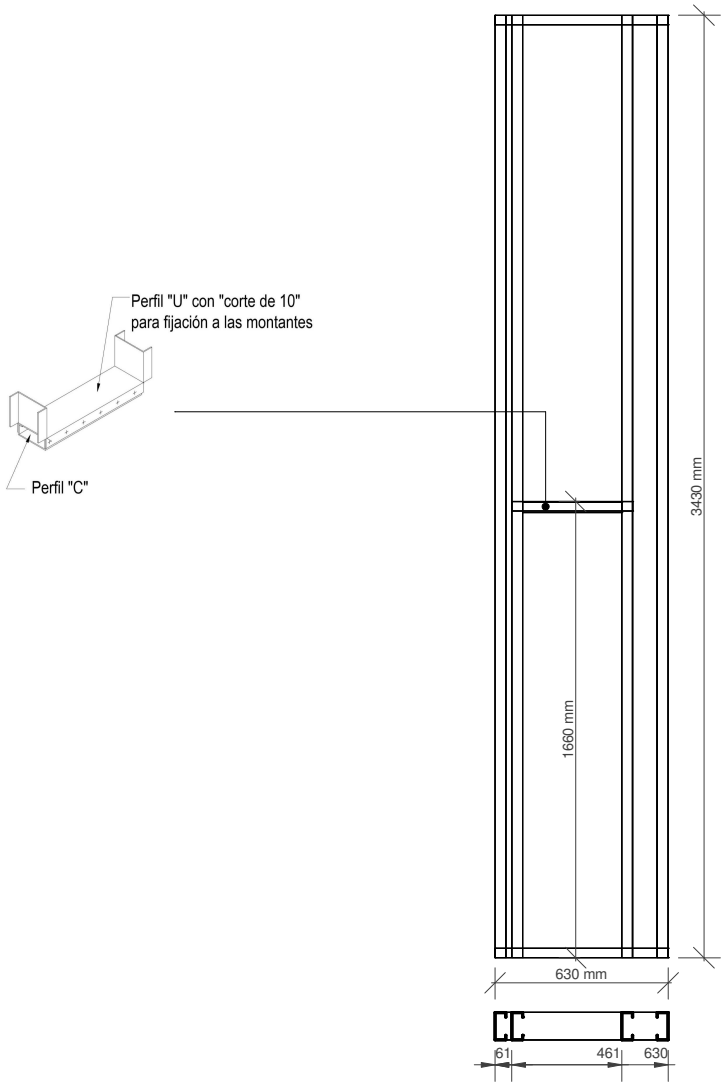

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PEX108

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
2	PGC100X0.90	3227 mm
3	PGC100X0.90	3428 mm
1	PGC100X0.90	3429 mm
1	PGU 100x0.90	101 mm
1	PGU 100x0.90	820 mm
1	PGU 100x0.90	921 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

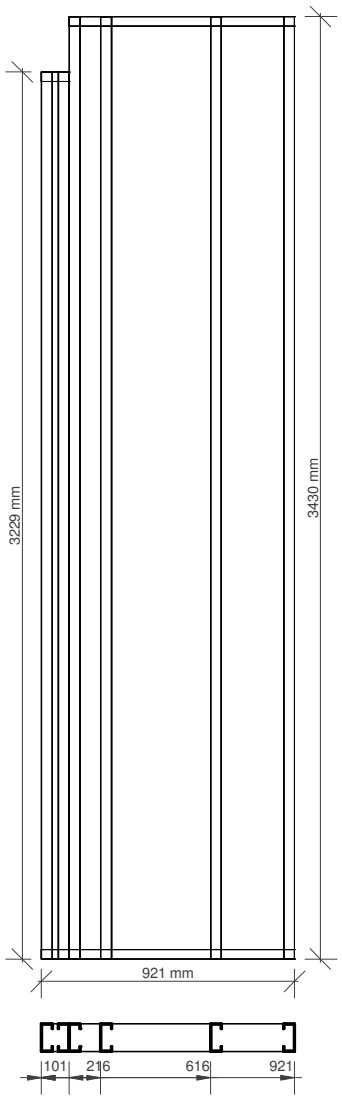

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PEX109

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
5	PGC100X0.90	716 mm
4	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGC150x1.60	1418 mm
2	PGU 100x0.90	100 mm
1	PGU 100x0.90	1418 mm
3	PGU 100x0.90	1622 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

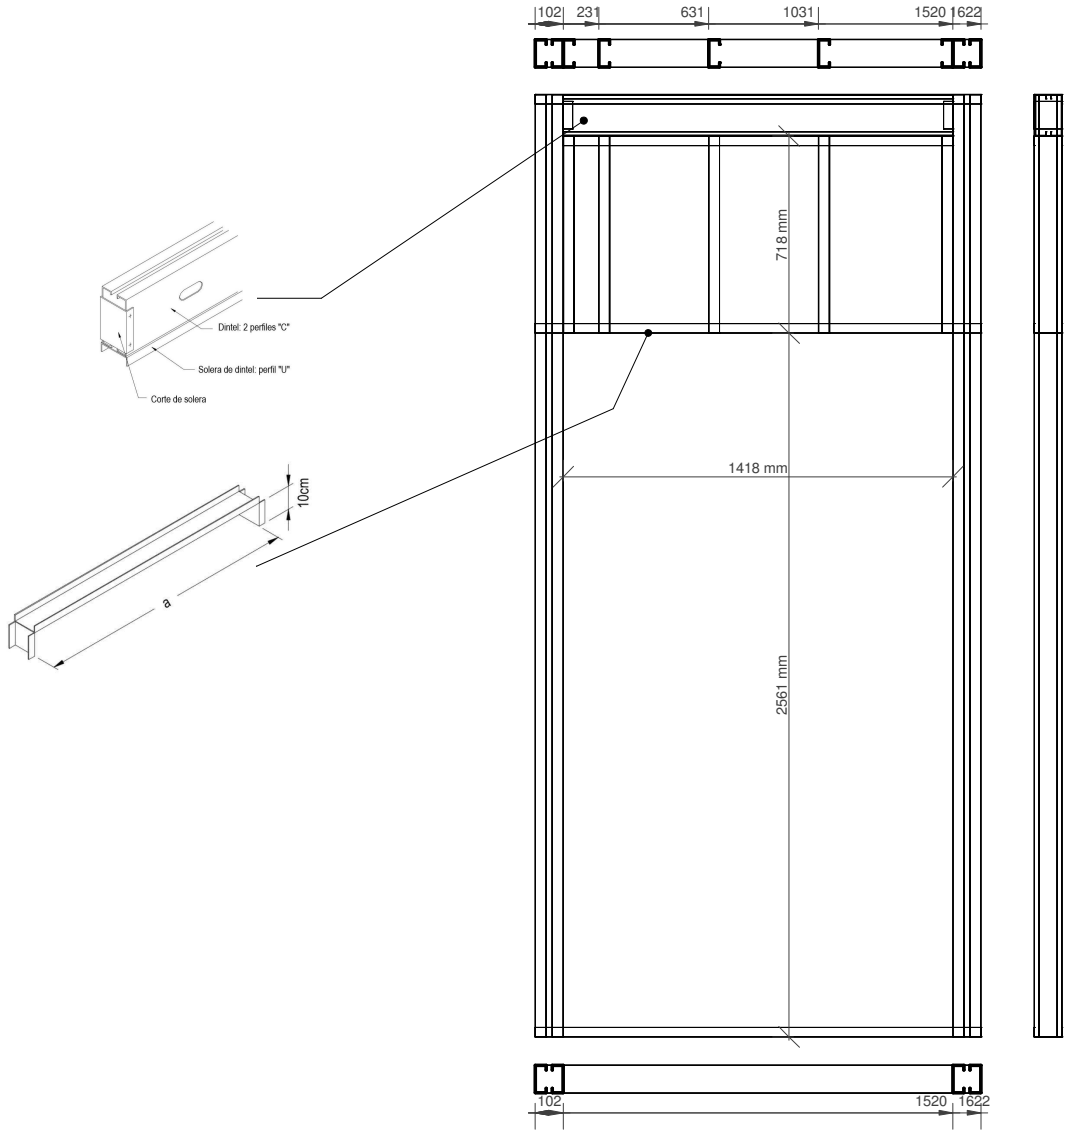

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PEX110

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
2	PGC100X0.90	3227 mm
3	PGC100X0.90	3428 mm
1	PGC100X0.90	3429 mm
1	PGU 100x0.90	101 mm
1	PGU 100x0.90	820 mm
1	PGU 100x0.90	921 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

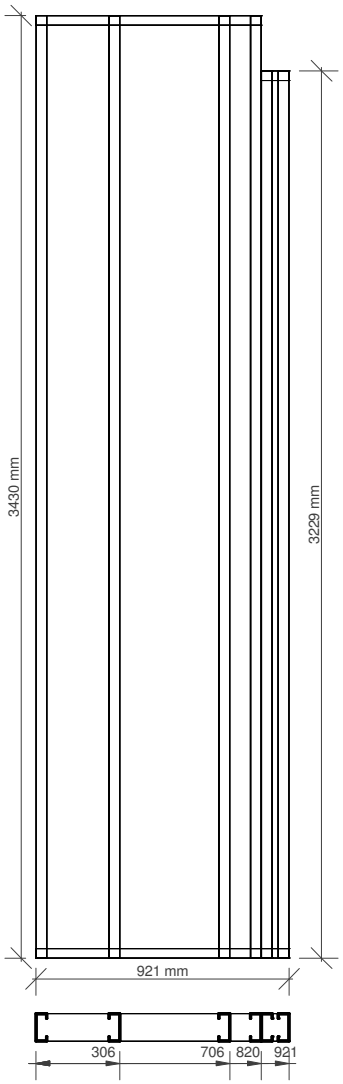

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PEX111

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
1	PGC100X0.90	138 mm
1	PGC100X0.90	211 mm
3	PGC100X0.90	716 mm
3	PGC100X0.90	2133 mm
2	PGC100X0.90	3277 mm
4	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGC150x1.60	1598 mm
2	PGU 100x0.90	100 mm
1	PGU 100x0.90	218 mm
1	PGU 100x0.90	291 mm
1	PGU 100x0.90	1598 mm
2	PGU 100x0.90	1678 mm
2	PGU 100x0.90	2107 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

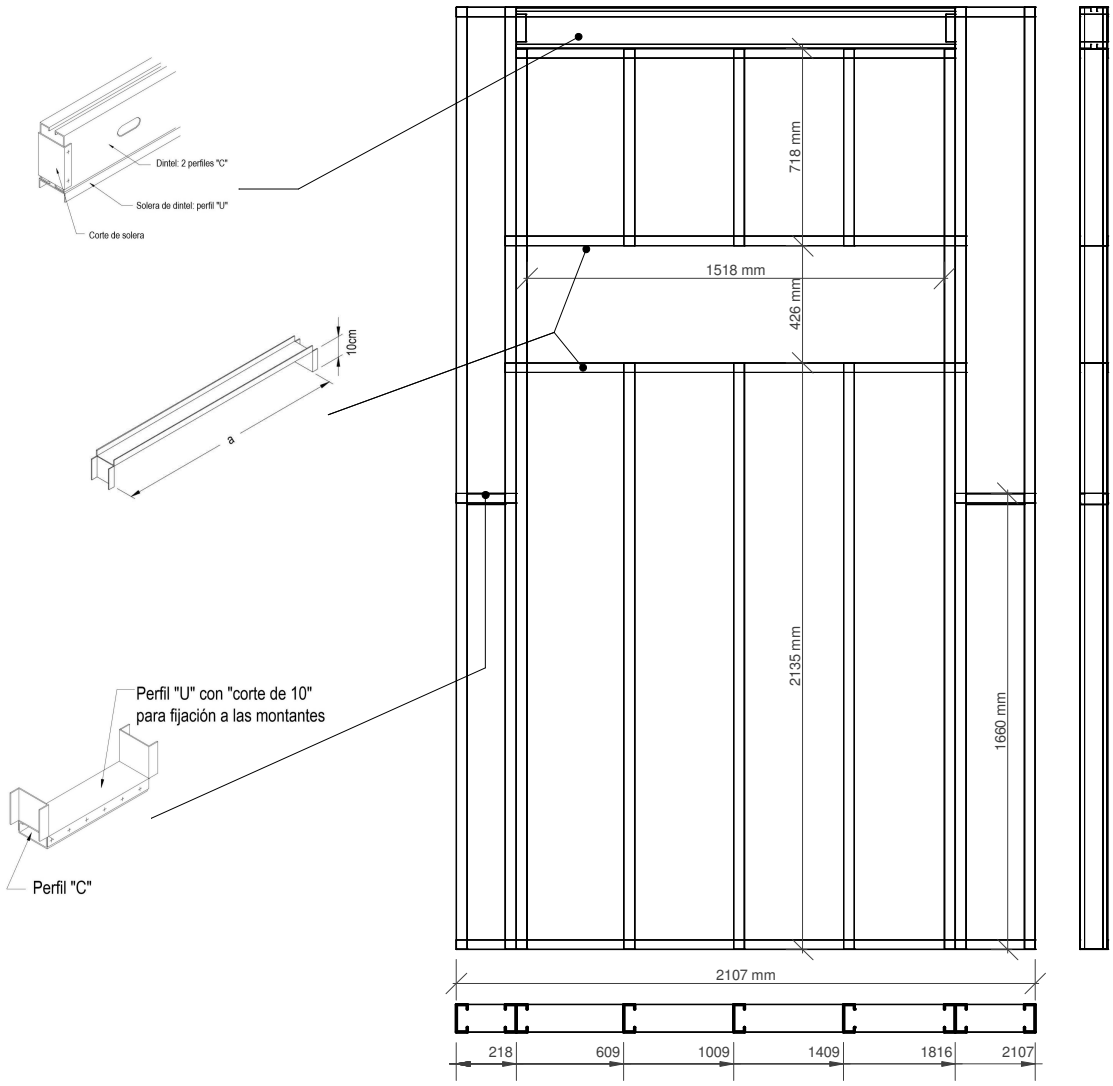

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PEX112

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
2	PGC100X0.90	132 mm
1	PGC100X0.90	3707 mm (A)
1	PGC100X0.90	3721 mm (B)
1	PGC100X0.90	3731 mm (C)
1	PGC100X0.90	3757 mm (D)
1	PGC100X0.90	3849 mm (E)
1	PGC100X0.90	3889 mm (F)
2	PGU 100x0.90	212 mm
1	PGU 100x0.90	827 mm
1	PGU 100x0.90	849 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

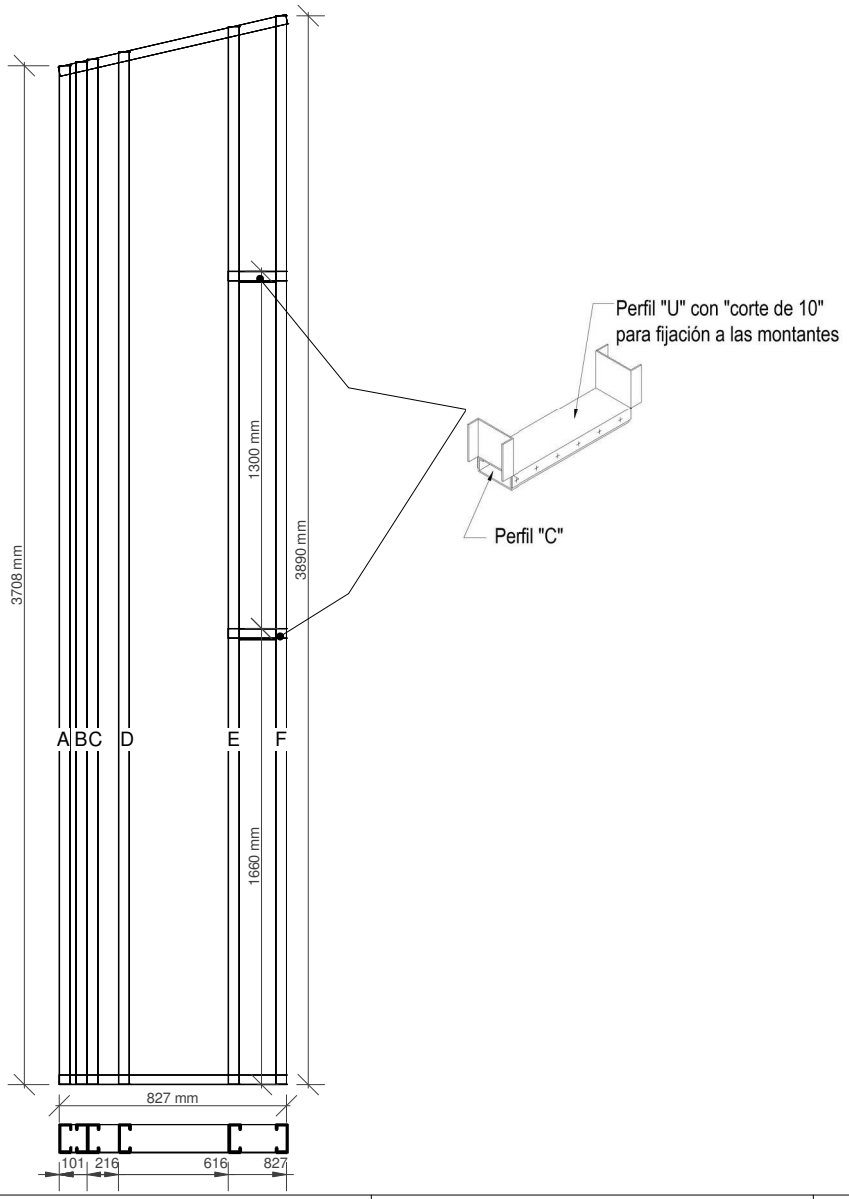

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PEX113

ESCALA 1:25

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

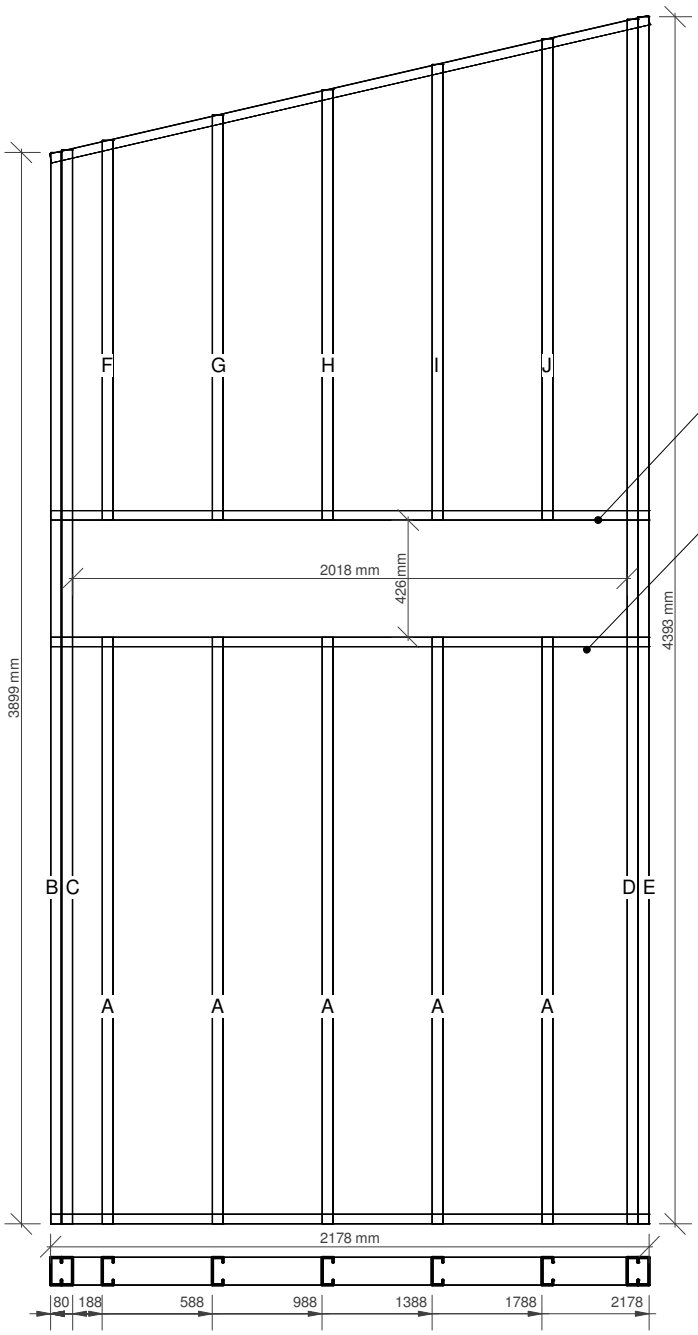



Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
1	PGC100X0.90	1381 mm (F)
1	PGC100X0.90	1473 mm (G)
1	PGC100X0.90	1565 mm (H)
1	PGC100X0.90	1658 mm (I)
1	PGC100X0.90	1750 mm (J)
5	PGC100X0.90	2133 mm (A)
1	PGC100X0.90	3898 mm (B)
1	PGC100X0.90	3907 mm (C)
1	PGC100X0.90	4383 mm (D)
1	PGC100X0.90	4392 mm (E)
3	PGU 100x0.90	2178 mm
1	PGU 100x0.90	2235 mm

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PEX114

ESCALA 1:25

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

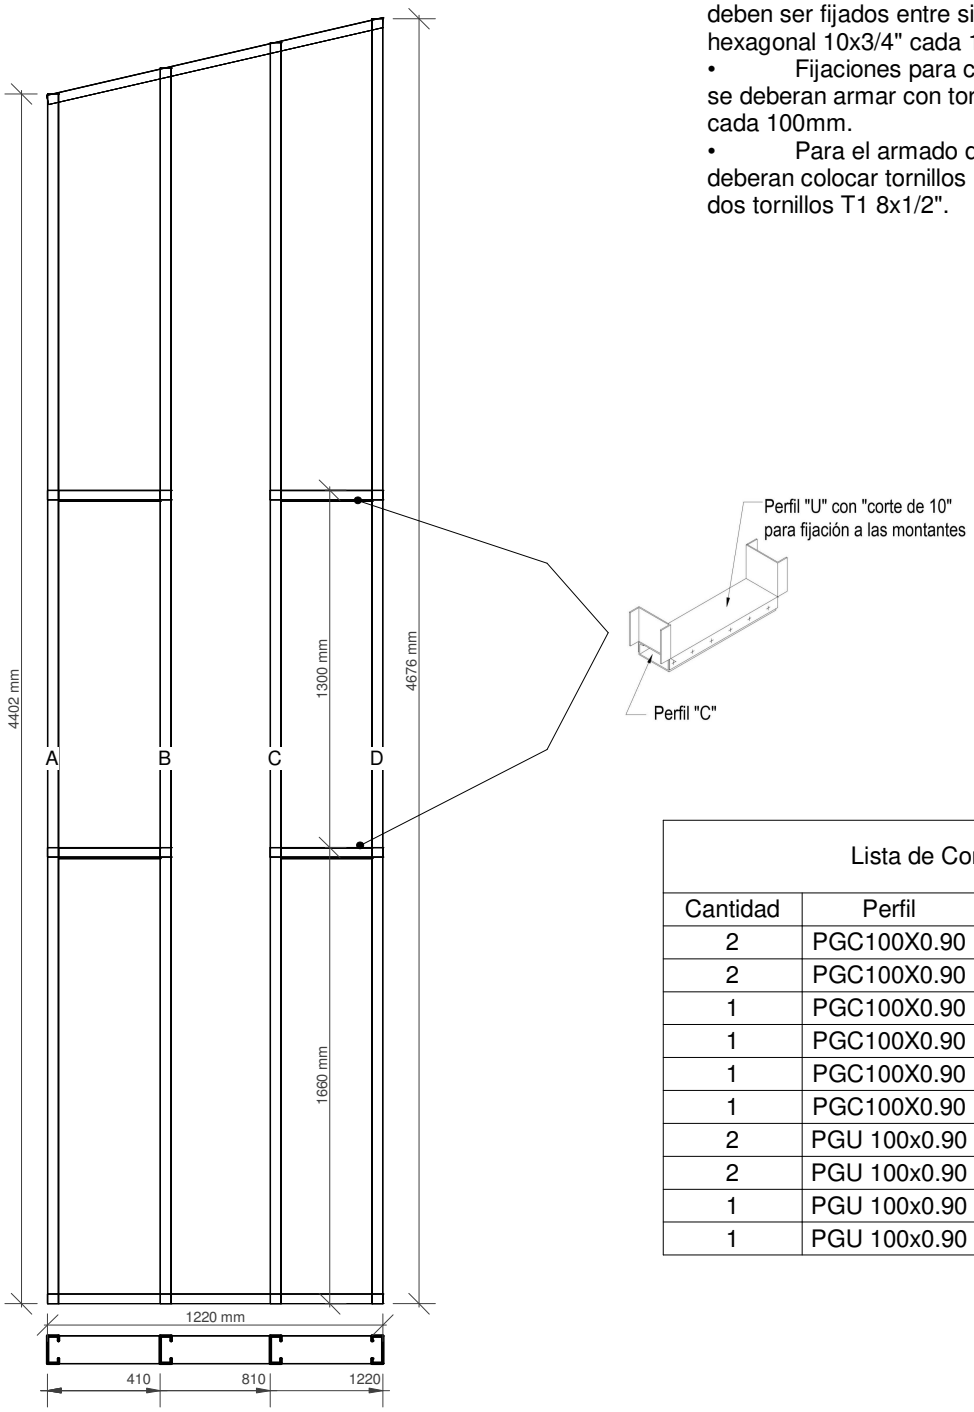

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
2	PGC100X0.90	330 mm
2	PGC100X0.90	370 mm
1	PGC100X0.90	4401 mm (A)
1	PGC100X0.90	4496 mm (B)
1	PGC100X0.90	4588 mm (C)
1	PGC100X0.90	4675 mm (D)
2	PGU 100x0.90	410 mm
2	PGU 100x0.90	450 mm
1	PGU 100x0.90	1220 mm
1	PGU 100x0.90	1256 mm

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PEX115

ESCALA 1:25

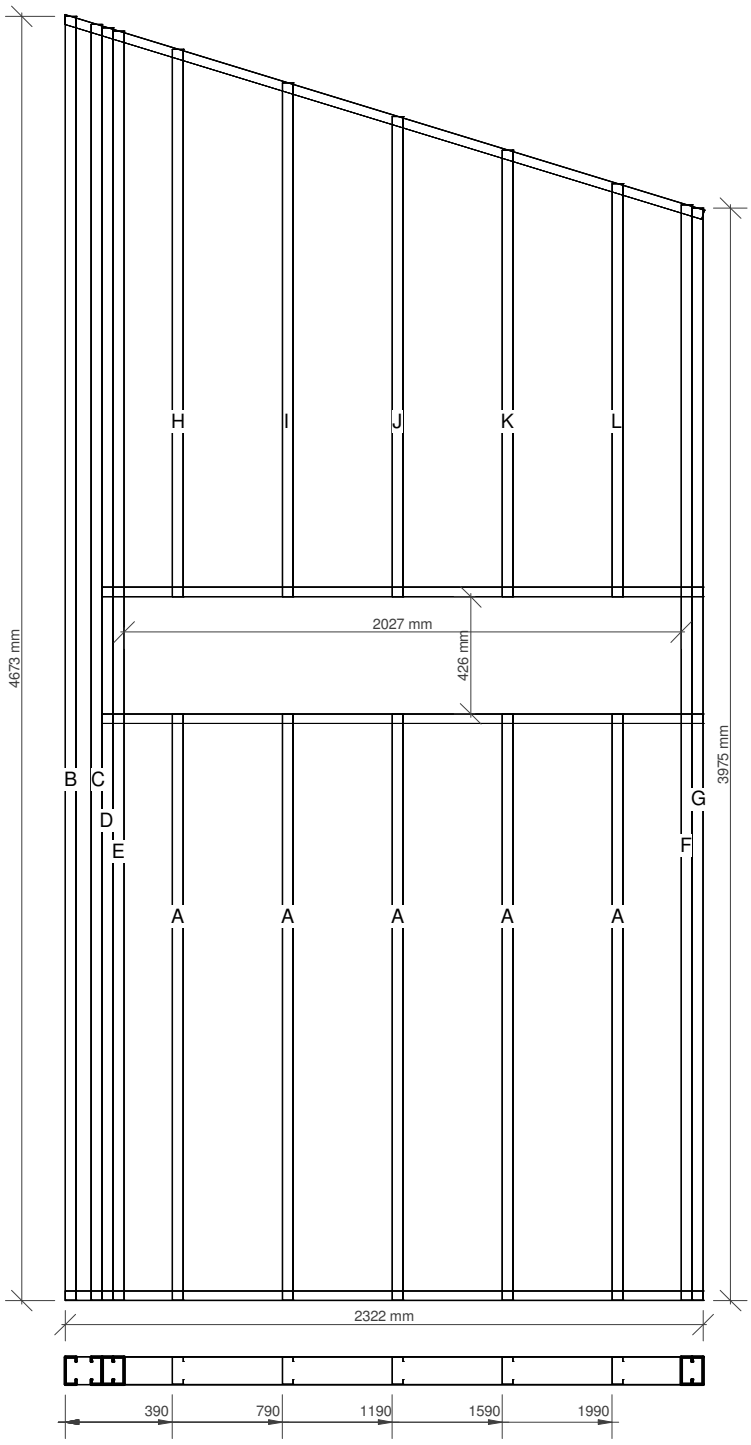

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
1	PGC100X0.90	1503 mm (L)
1	PGC100X0.90	1625 mm (K)
1	PGC100X0.90	1747 mm (J)
1	PGC100X0.90	1870 mm (I)
1	PGC100X0.90	1992 mm (H)
5	PGC100X0.90	2133 mm (A)
1	PGC100X0.90	3974 mm (G)
1	PGC100X0.90	3987 mm (F)
1	PGC100X0.90	4619 mm (E)
1	PGC100X0.90	4631 mm (D)
1	PGC100X0.90	4643 mm (C)
1	PGC100X0.90	4672 mm (B)
2	PGU 100x0.90	2187 mm
1	PGU 100x0.90	2322 mm
1	PGU 100x0.90	2433 mm

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PEX116

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
2	PGC100X0.90	428 mm
1	PGC100X0.90	3709 mm
1	PGC100X0.90	3728 mm
1	PGC100X0.90	3740 mm
1	PGC100X0.90	3819 mm
1	PGC100X0.90	3962 mm
2	PGU 100x0.90	508 mm
1	PGU 100x0.90	868 mm
1	PGU 100x0.90	908 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

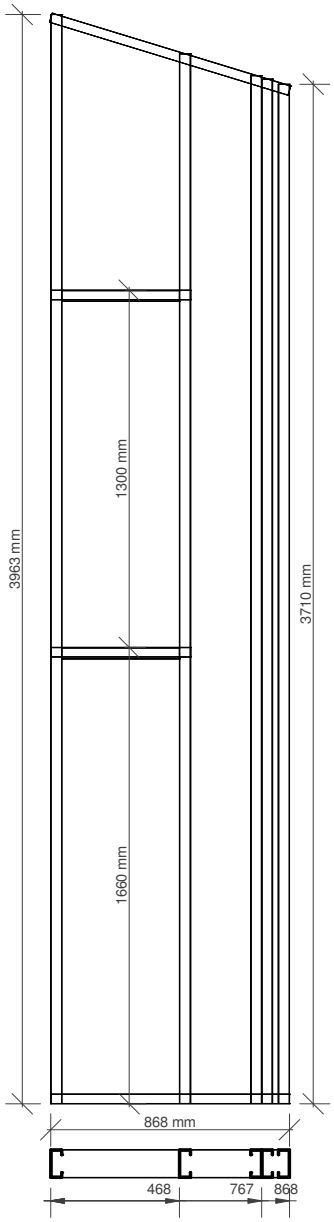

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PEX117

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
1	PGC100X0.90	212 mm
3	PGC100X0.90	716 mm
3	PGC100X0.90	2133 mm
2	PGC100X0.90	3277 mm
2	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGC150x1.60	1598 mm
2	PGU 100x0.90	100 mm
1	PGU 100x0.90	292 mm
1	PGU 100x0.90	1598 mm
2	PGU 100x0.90	1678 mm
2	PGU 100x0.90	1890 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

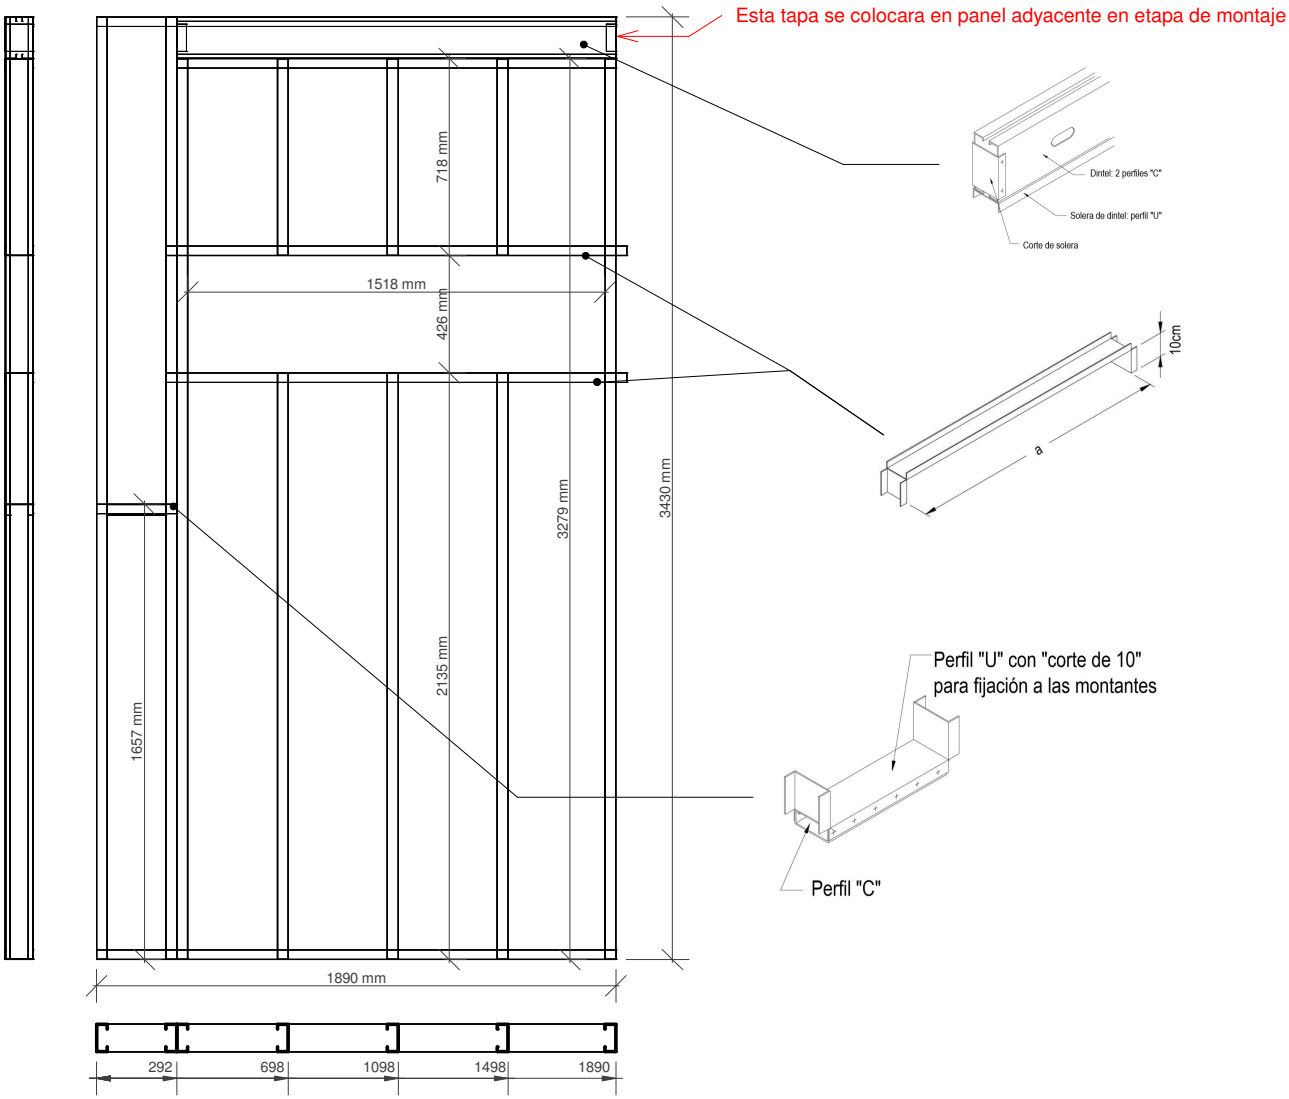

	GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD	OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA	PEX118 ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
1	PGC100X0.90	328 mm
4	PGC100X0.90	716 mm
4	PGC100X0.90	2133 mm
2	PGC100X0.90	3277 mm
3	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGC150x1.60	1598 mm
2	PGU 100x0.90	100 mm
1	PGU 100x0.90	408 mm
1	PGU 100x0.90	1598 mm
2	PGU 100x0.90	1678 mm
2	PGU 100x0.90	2118 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

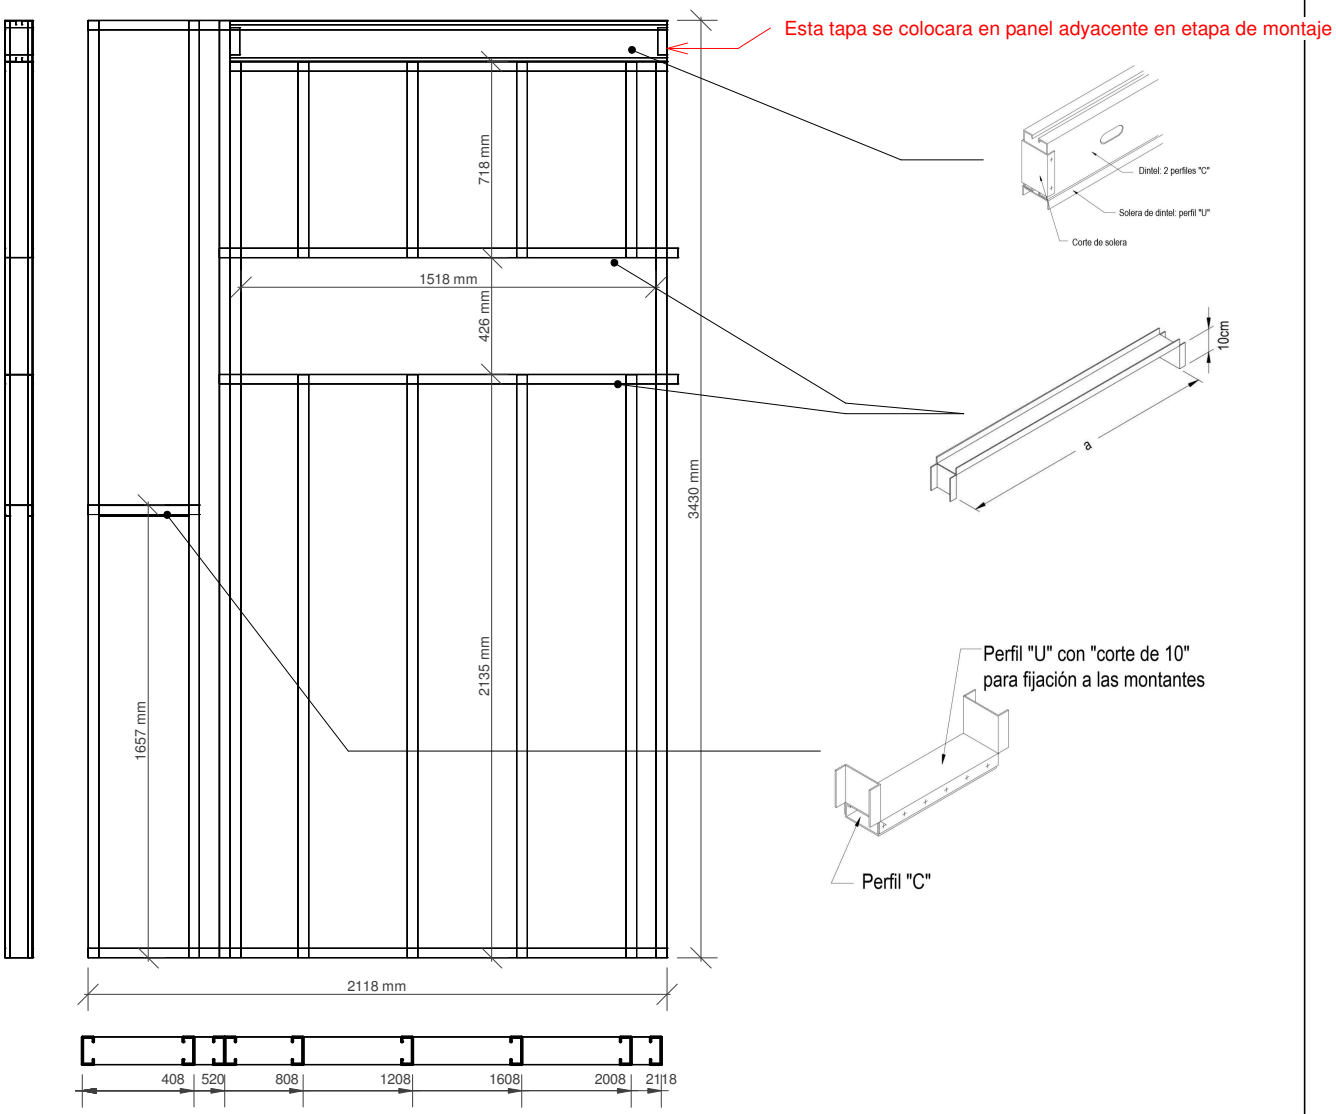

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PEX119

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
1	PGC100X0.90	299 mm
3	PGC100X0.90	716 mm
3	PGC100X0.90	2133 mm
2	PGC100X0.90	3277 mm
3	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGC150x1.60	1598 mm
2	PGU 100x0.90	100 mm
1	PGU 100x0.90	379 mm
1	PGU 100x0.90	1598 mm
2	PGU 100x0.90	1678 mm
2	PGU 100x0.90	2226 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

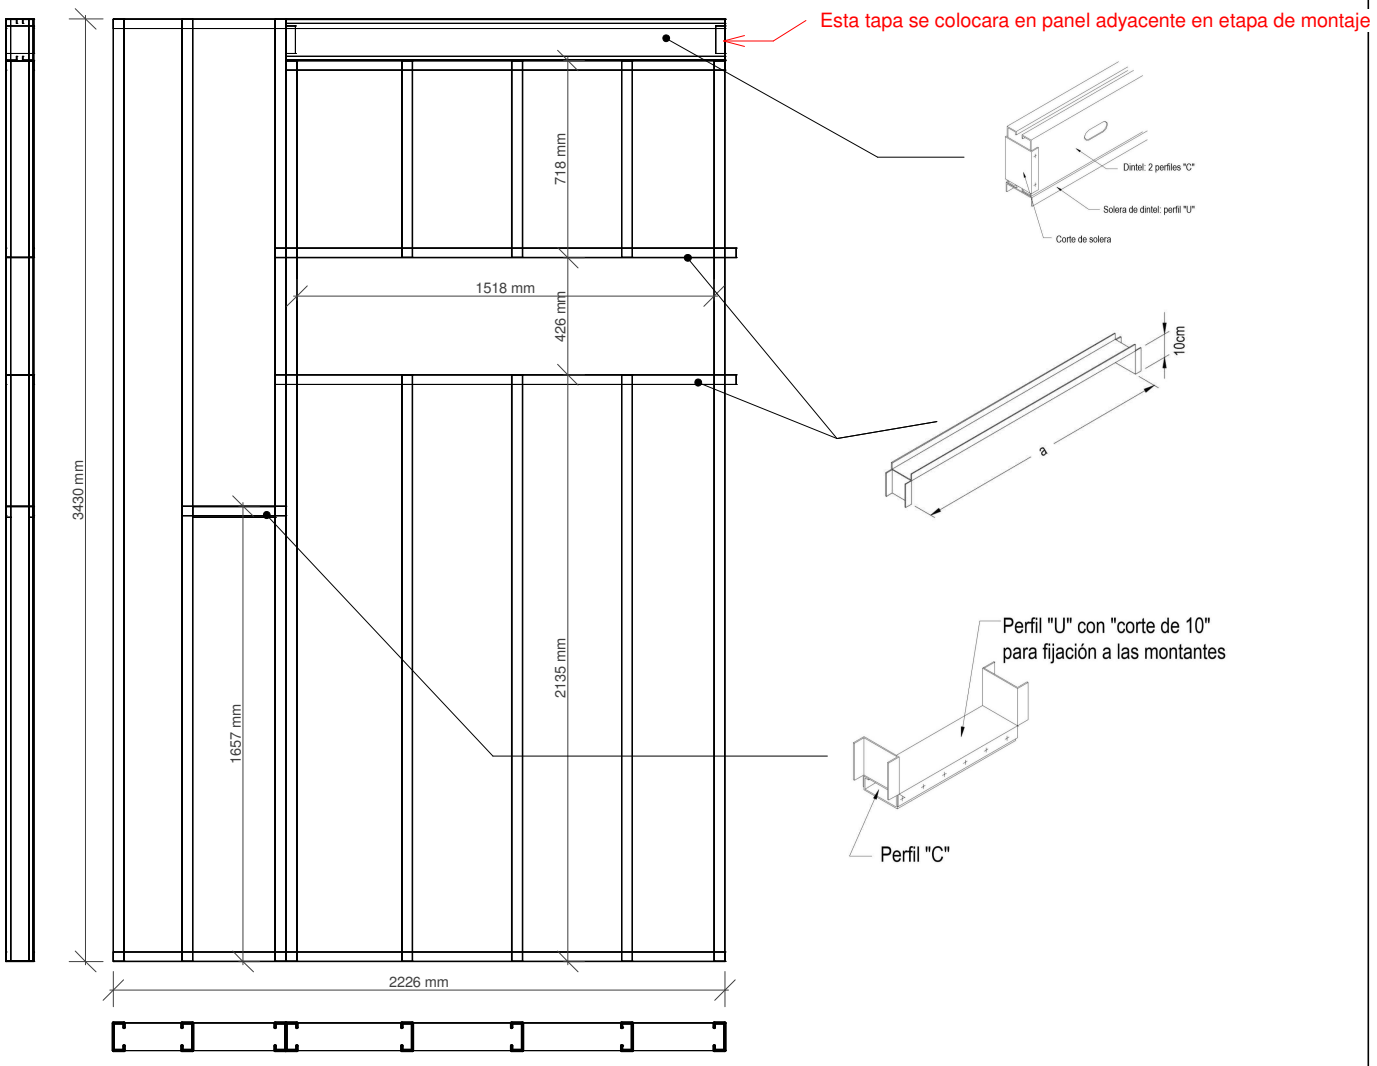

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PEX120

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
1	PGC100X0.90	193 mm
4	PGC100X0.90	716 mm
4	PGC100X0.90	2133 mm
2	PGC100X0.90	3277 mm
5	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGC150x1.60	1598 mm
2	PGU 100x0.90	100 mm
1	PGU 100x0.90	273 mm
1	PGU 100x0.90	1598 mm
2	PGU 100x0.90	1678 mm
2	PGU 100x0.90	2137 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

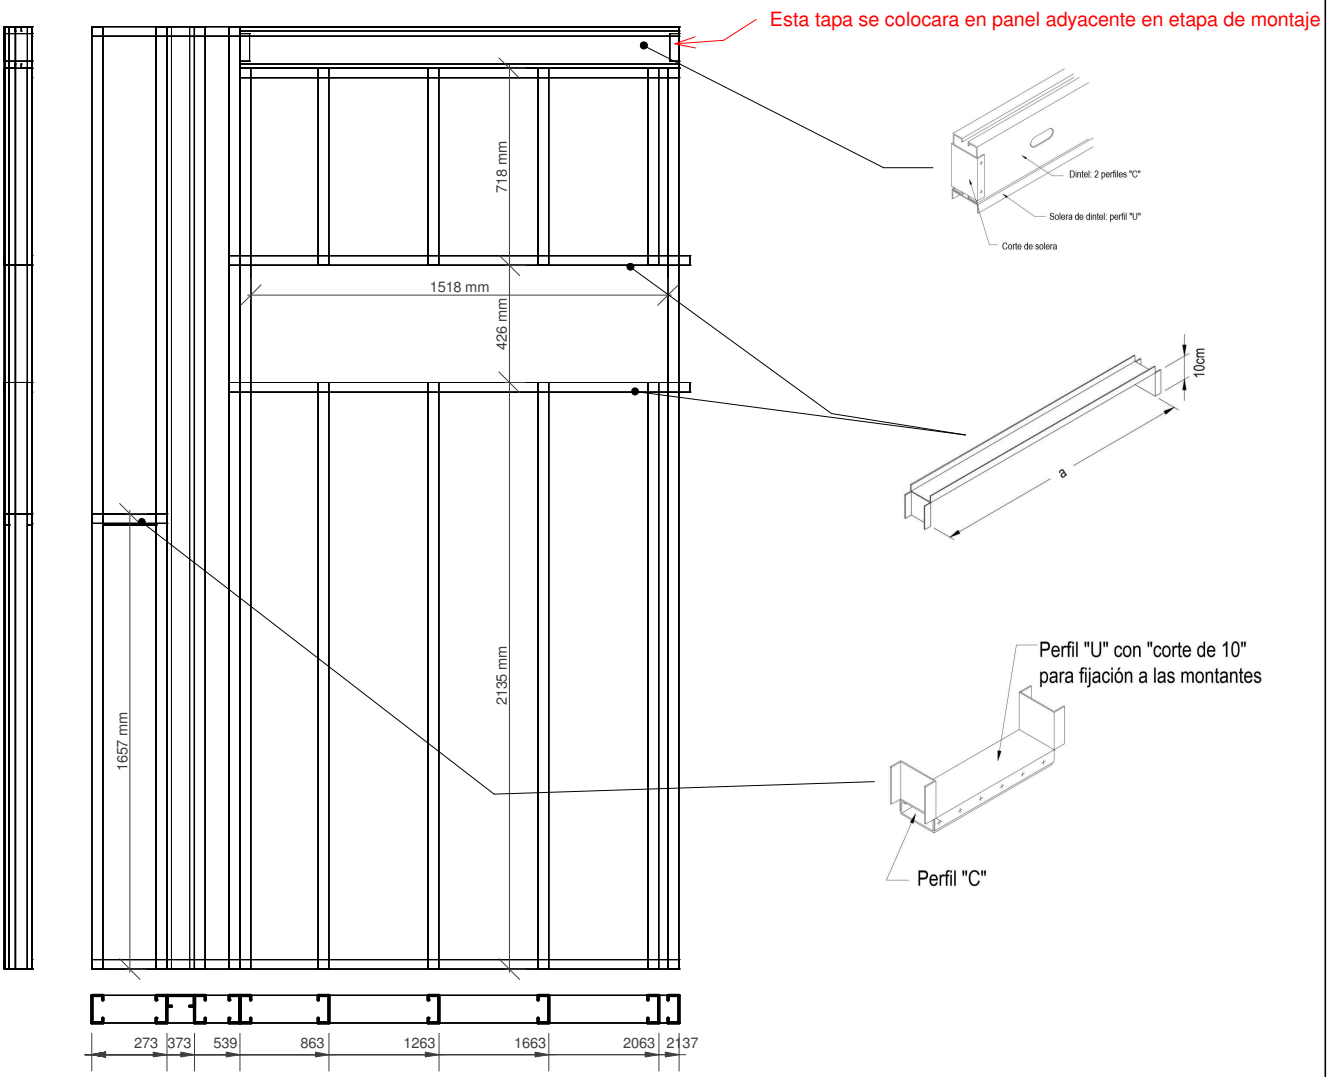

	GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD	OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA	PEX121 ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
1	PGC100X0.90	246 mm
3	PGC100X0.90	716 mm
3	PGC100X0.90	2133 mm
2	PGC100X0.90	3277 mm
3	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGC150x1.60	1598 mm
2	PGU 100x0.90	100 mm
1	PGU 100x0.90	326 mm
1	PGU 100x0.90	1598 mm
2	PGU 100x0.90	1678 mm
2	PGU 100x0.90	2325 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

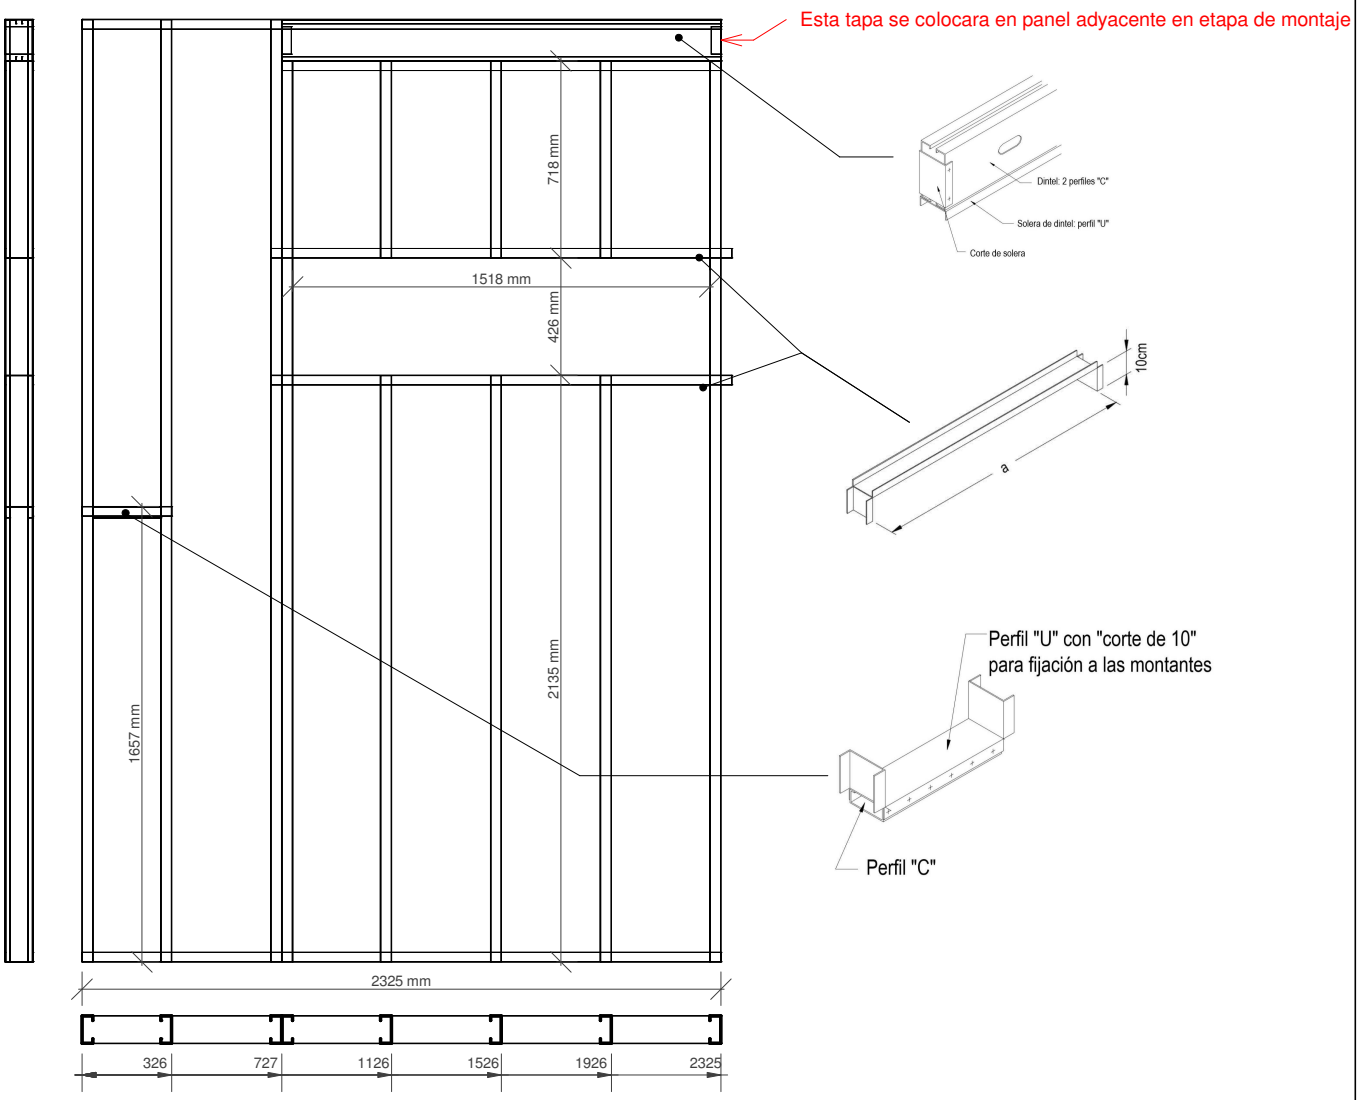

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PEX122

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
1	PGC100X0.90	250 mm
1	PGC100X0.90	321 mm
4	PGC100X0.90	716 mm
4	PGC100X0.90	2133 mm
2	PGC100X0.90	3277 mm
5	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGC150x1.60	1598 mm
2	PGU 100x0.90	100 mm
1	PGU 100x0.90	330 mm
1	PGU 100x0.90	401 mm
1	PGU 100x0.90	1598 mm
2	PGU 100x0.90	1678 mm
2	PGU 100x0.90	2410 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

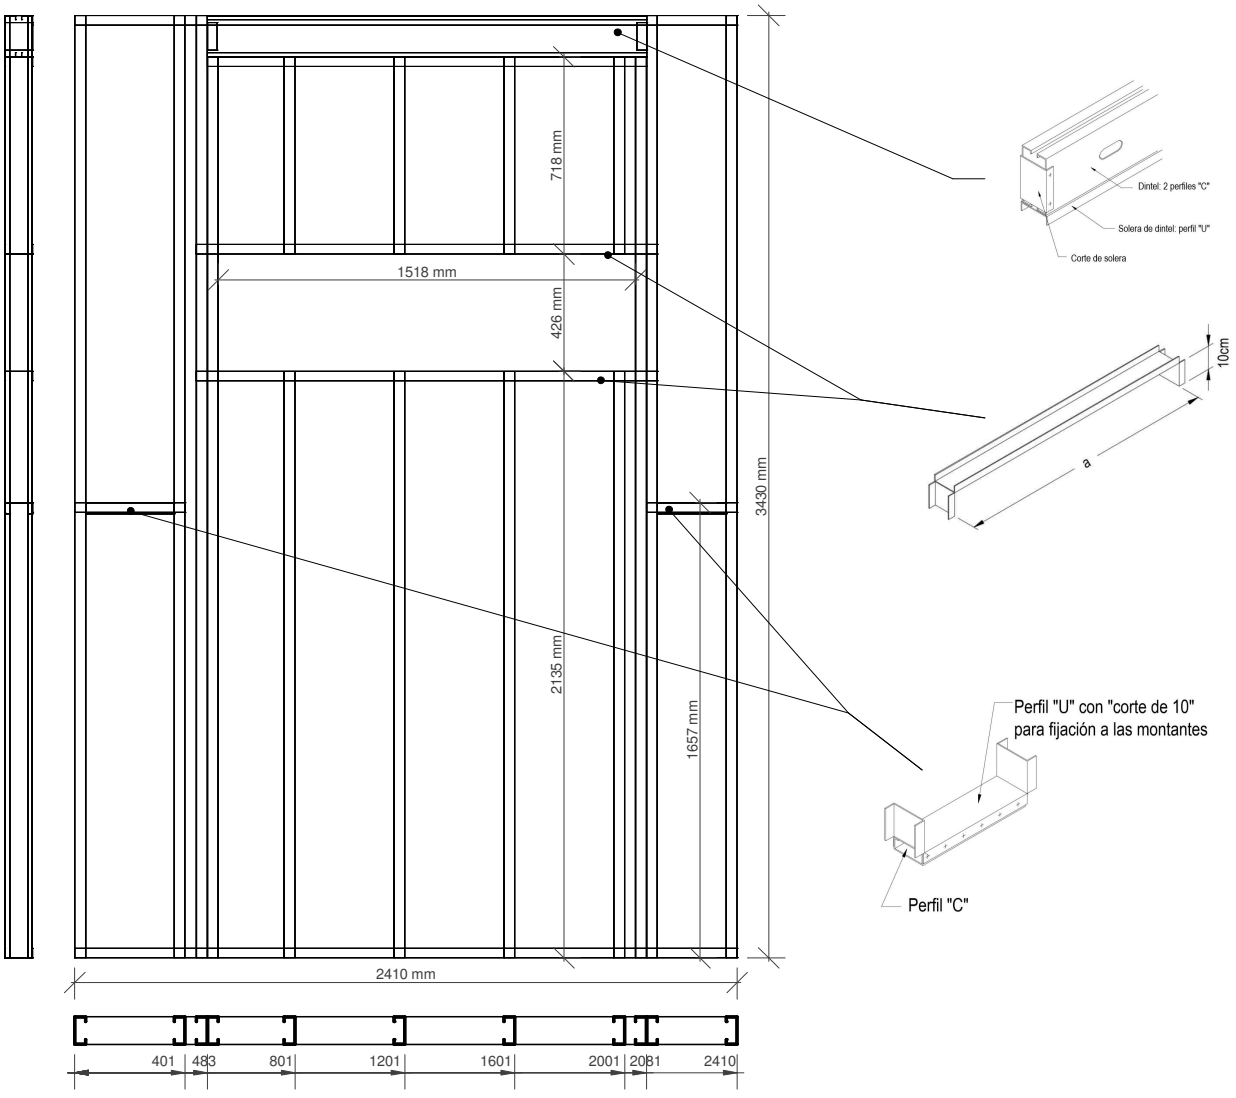

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PEX123

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
9	PGC100X0.90	3968 mm
1	PGC100X0.90	3969 mm
2	PGU 100x0.90	1600 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

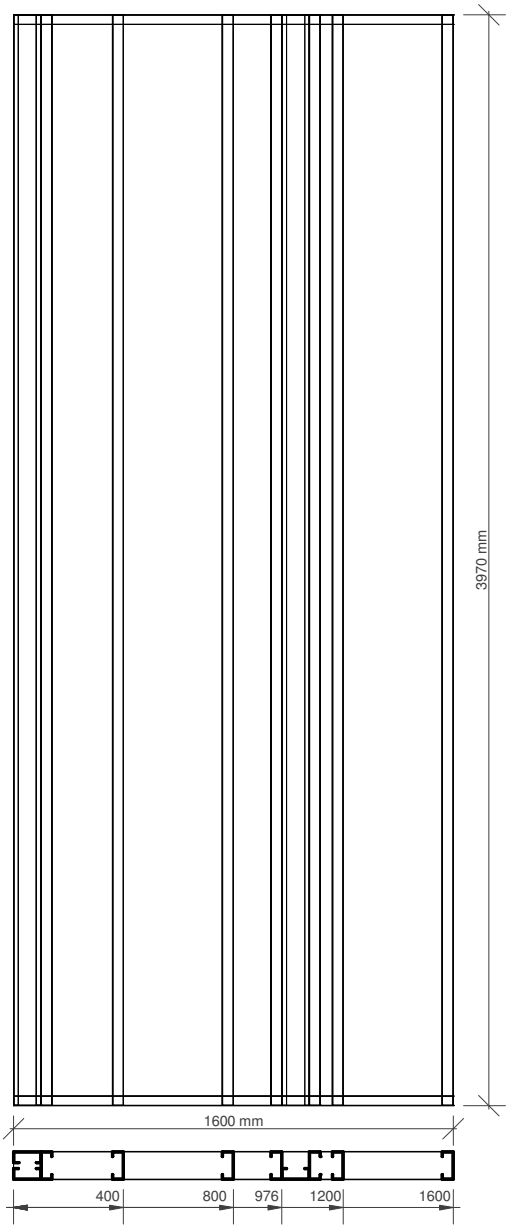

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PEX124

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
7	PGC100X0.90	3968 mm
2	PGU 100x0.90	1600 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

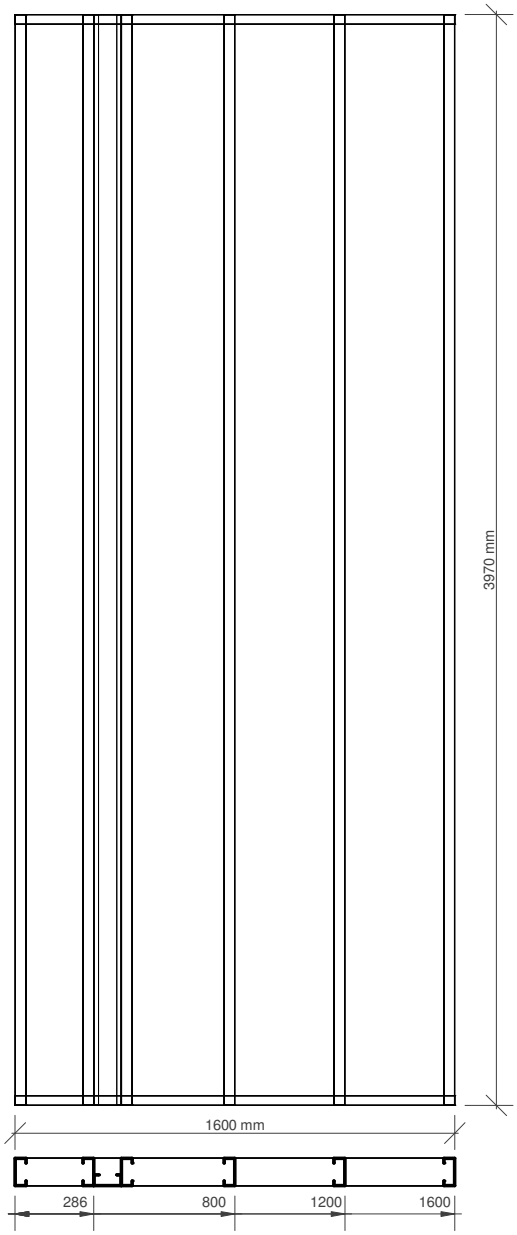

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PEX125

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
8	PGC100X0.90	3968 mm
1	PGC100X0.90	3969 mm
2	PGU 100x0.90	2000 mm

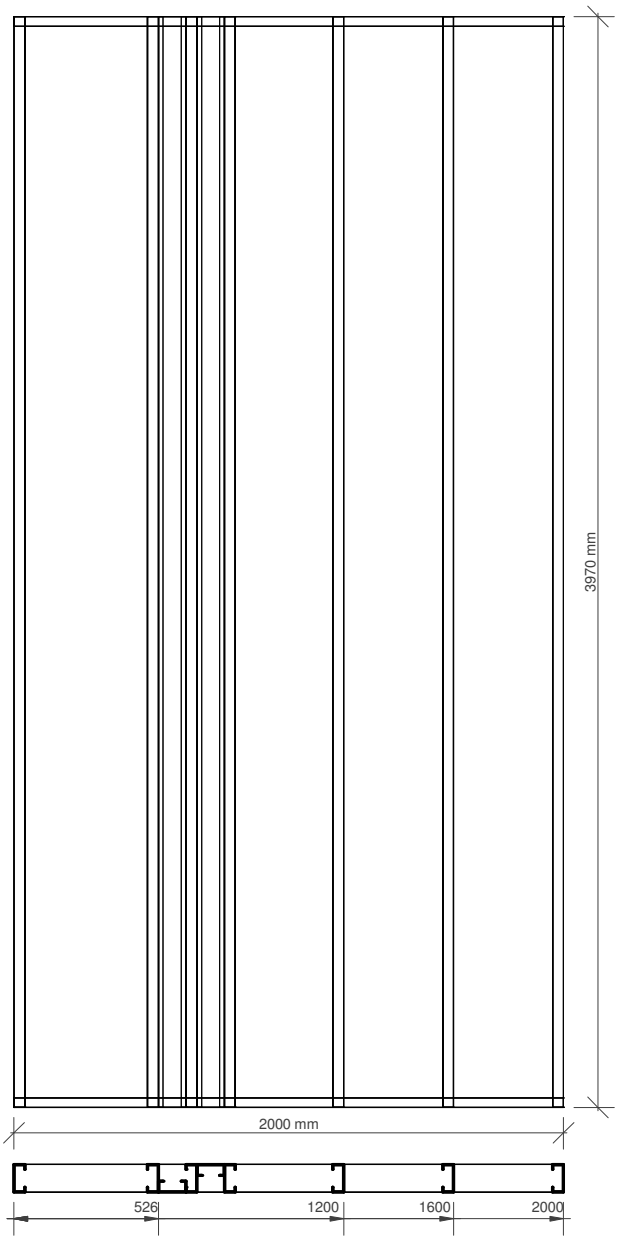

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PEX126

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
9	PGC100X0.90	3968 mm
2	PGU 100x0.90	2216 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

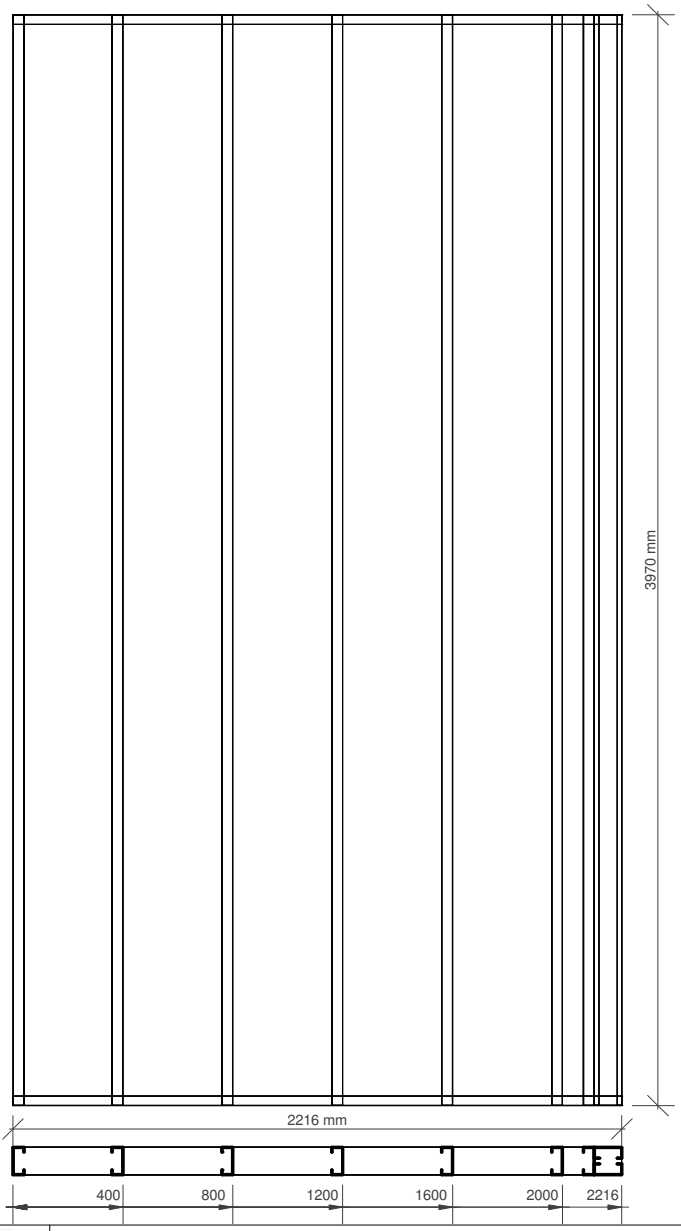

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PEX127

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
1	PGC100X0.90	346 mm
3	PGC100X0.90	716 mm
3	PGC100X0.90	983 mm
2	PGC100X0.90	3277 mm
3	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGC150x1.60	1298 mm
2	PGU 100x0.90	100 mm
1	PGU 100x0.90	426 mm
1	PGU 100x0.90	1298 mm
2	PGU 100x0.90	1378 mm
2	PGU 100x0.90	2133 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

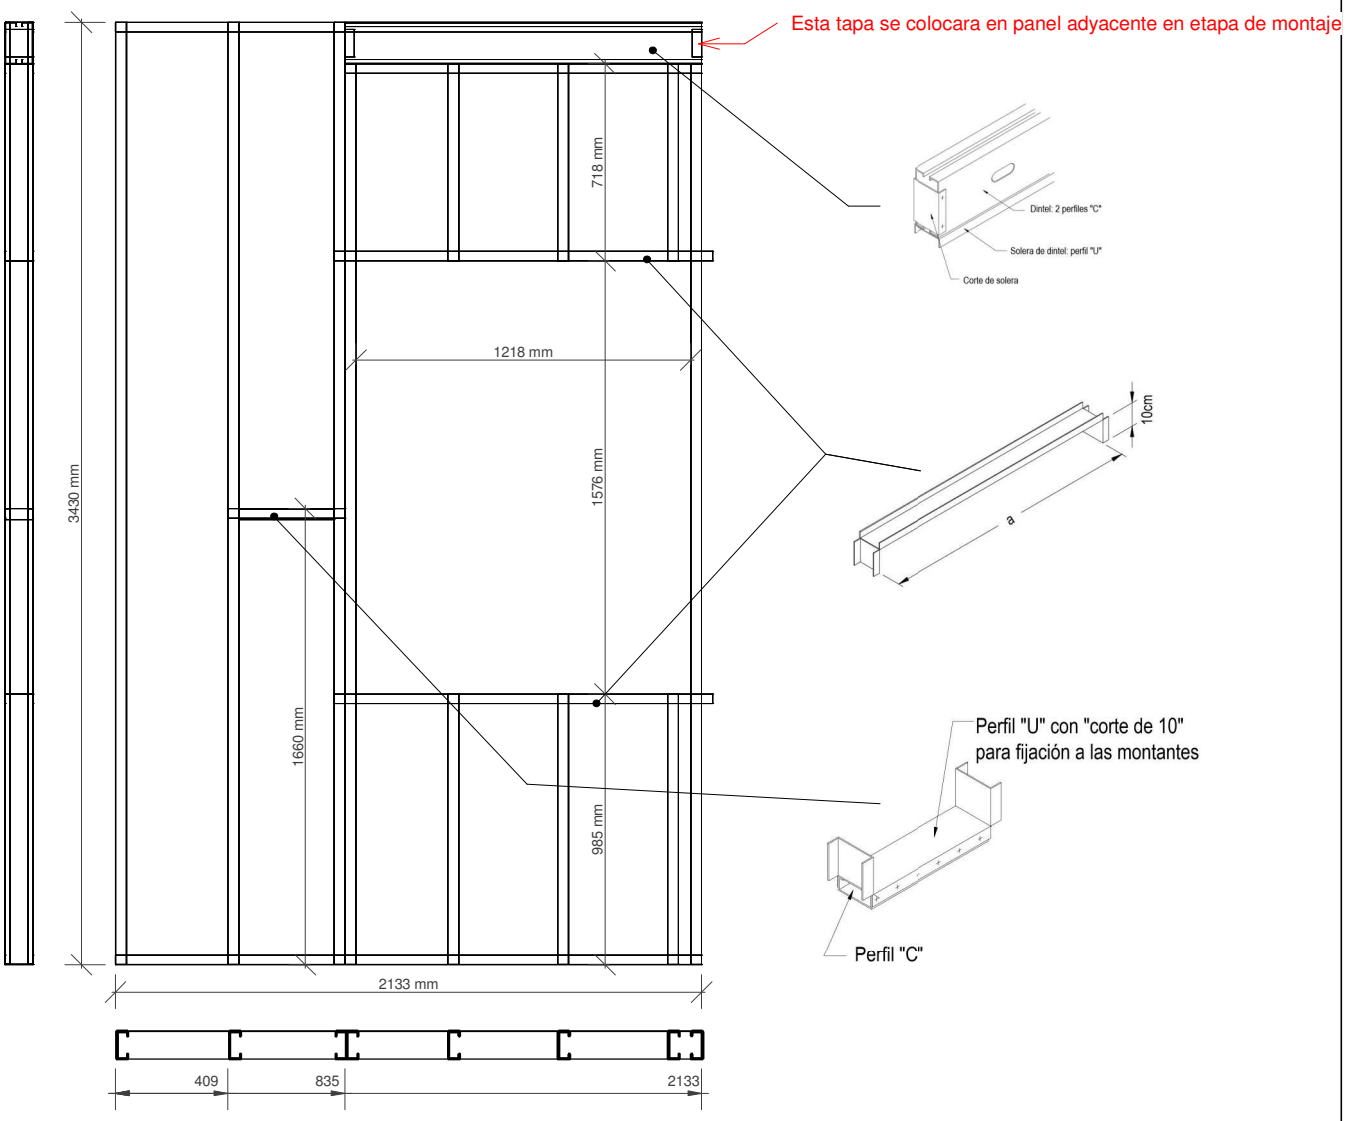

	GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD	OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA	PEX201 ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
1	PGC100X0.90	271 mm
3	PGC100X0.90	716 mm
2	PGC100X0.90	3277 mm
5	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGC150x1.60	1498 mm
2	PGU 100x0.90	100 mm
1	PGU 100x0.90	351 mm
1	PGU 100x0.90	1498 mm
1	PGU 100x0.90	1578 mm
2	PGU 100x0.90	2276 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

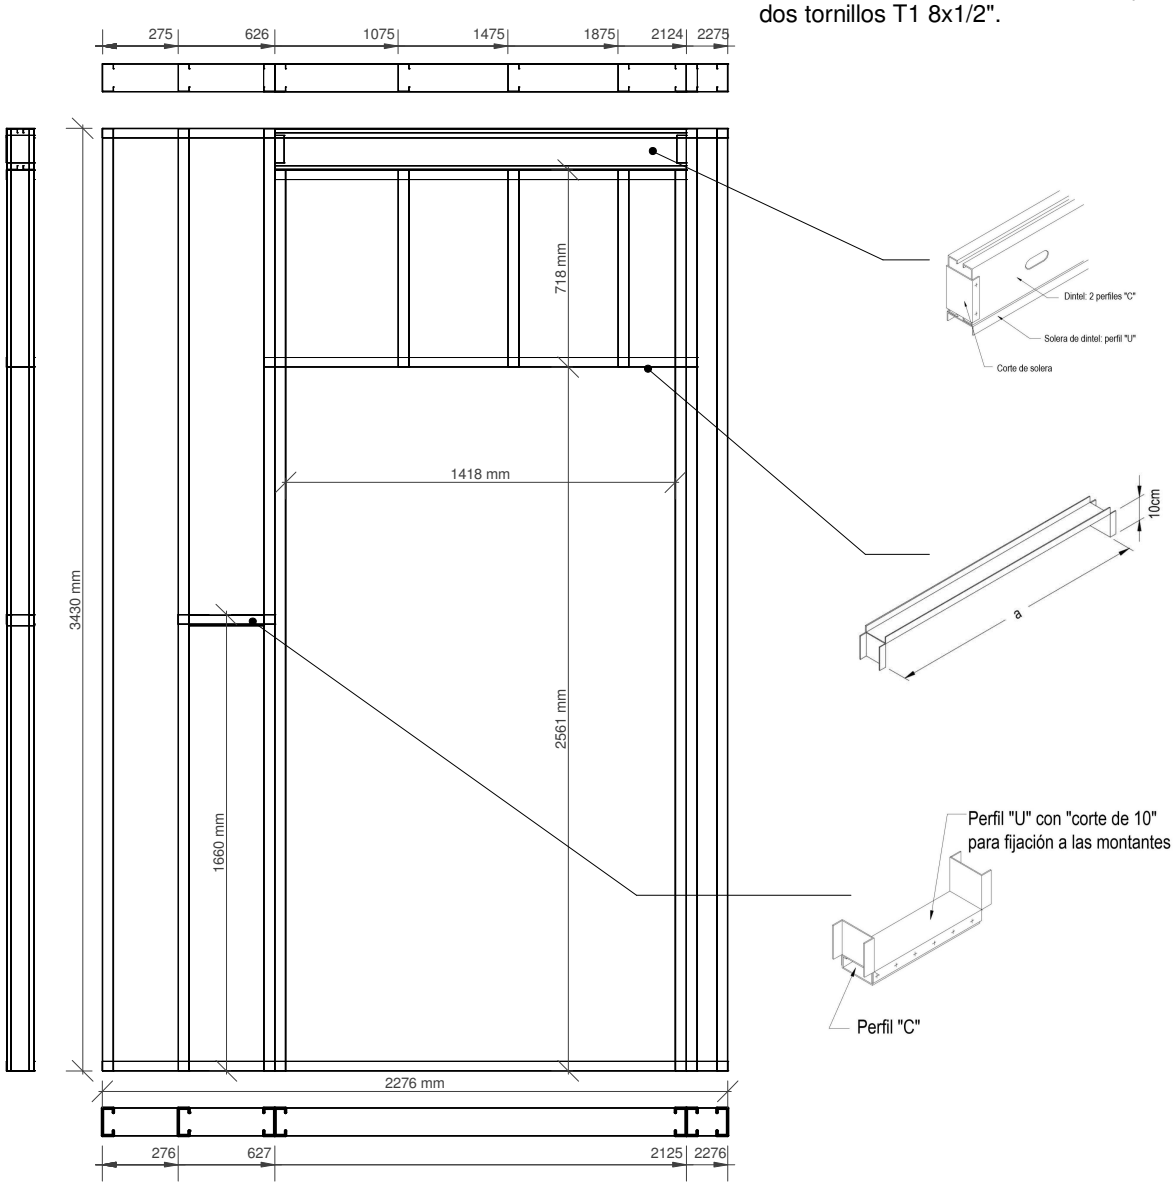

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PEX202

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
1	PGC100X0.90	266 mm
1	PGC100X0.90	316 mm
2	PGC100X0.90	716 mm
2	PGC100X0.90	983 mm
2	PGC100X0.90	3277 mm
8	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGC150x1.60	1298 mm
2	PGU 100x0.90	100 mm
1	PGU 100x0.90	346 mm
1	PGU 100x0.90	396 mm
1	PGU 100x0.90	1298 mm
2	PGU 100x0.90	1378 mm
2	PGU 100x0.90	2400 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

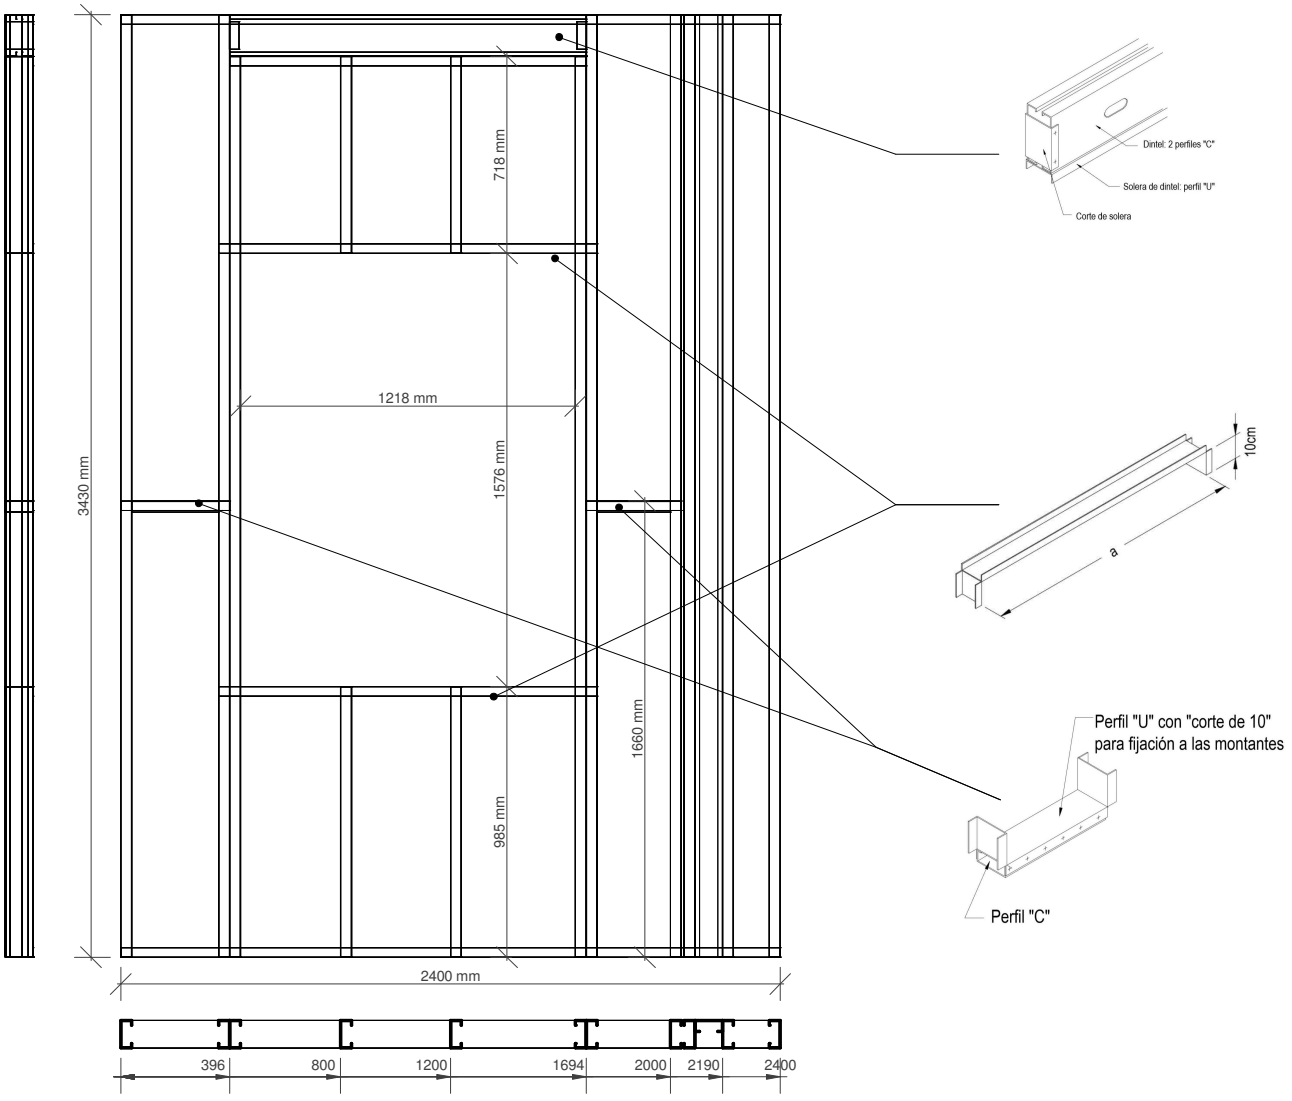

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PEX203

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
1	PGC100X0.90	282 mm
1	PGC100X0.90	293 mm
2	PGC100X0.90	716 mm
2	PGC100X0.90	2133 mm
2	PGC100X0.90	3277 mm
5	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGC150x1.60	1098 mm
2	PGU 100x0.90	100 mm
1	PGU 100x0.90	362 mm
1	PGU 100x0.90	373 mm
1	PGU 100x0.90	1098 mm
2	PGU 100x0.90	1178 mm
2	PGU 100x0.90	1973 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

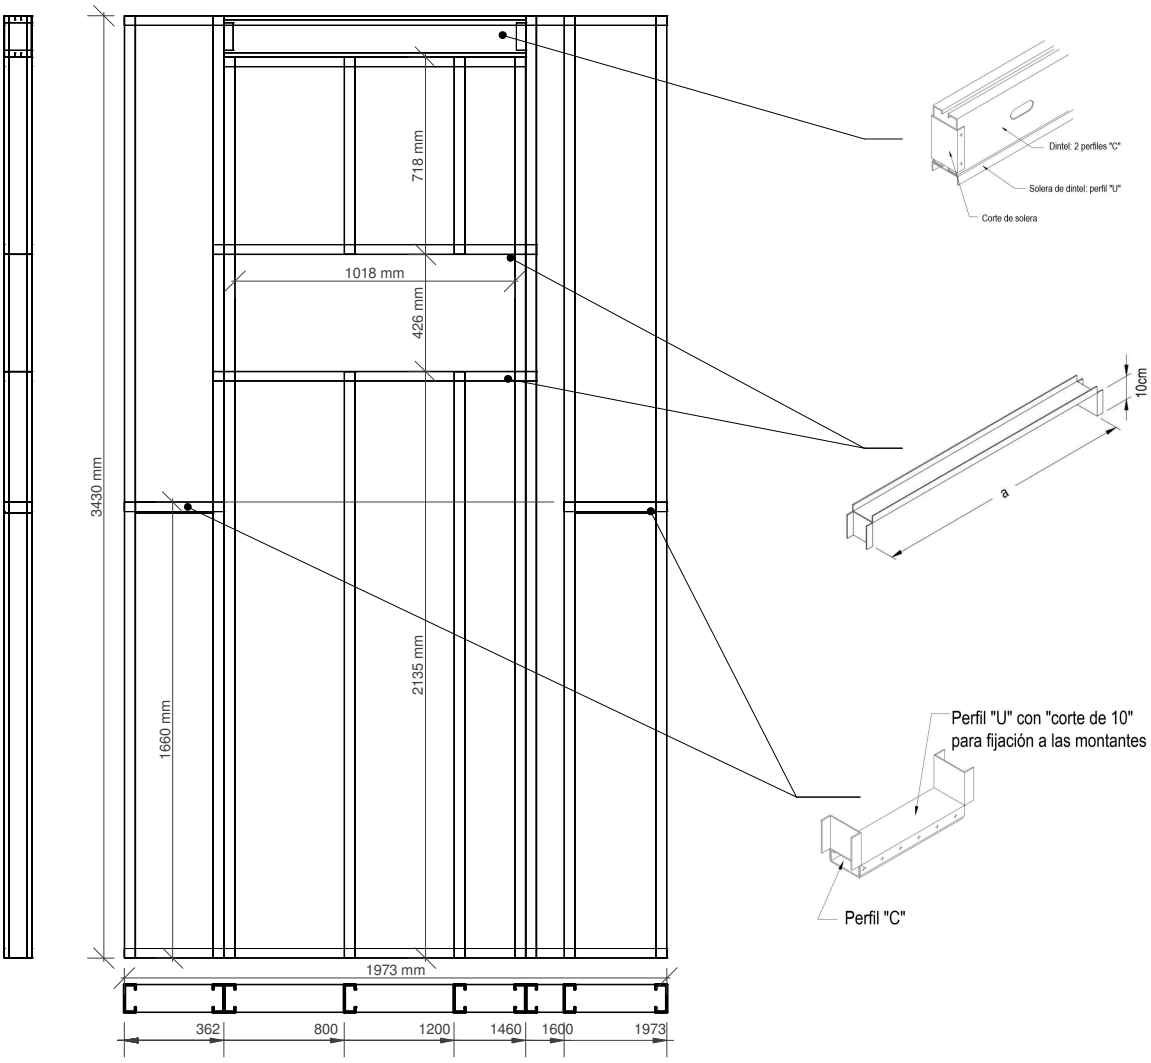

	GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD	OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA	PEX204 ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
4	PGC100X0.90	716 mm
4	PGC100X0.90	3277 mm
2	PGC100X0.90	3428 mm
4	PGC150x1.60	998 mm
4	PGU 100x0.90	100 mm
2	PGU 100x0.90	998 mm
2	PGU 100x0.90	1038 mm
2	PGU 100x0.90	2096 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

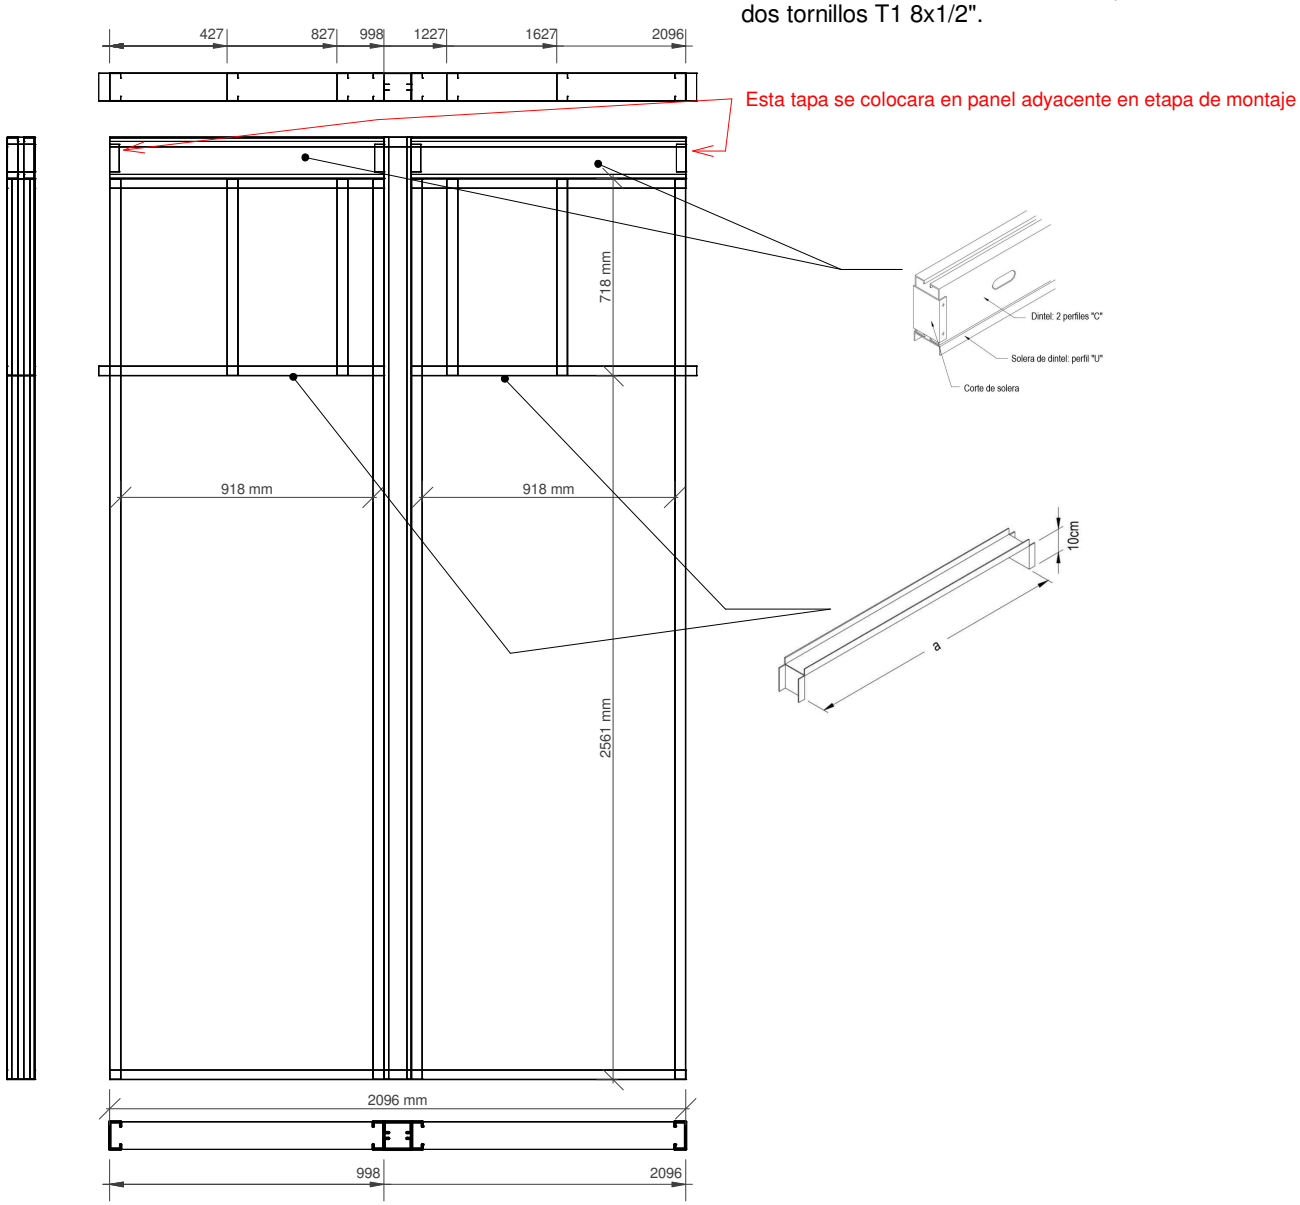

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PEX205

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
1	PGC100X0.90	208 mm
2	PGC100X0.90	716 mm
2	PGC100X0.90	2133 mm
2	PGC100X0.90	3277 mm
6	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGC150x1.60	1098 mm
2	PGU 100x0.90	100 mm
1	PGU 100x0.90	288 mm
1	PGU 100x0.90	1098 mm
2	PGU 100x0.90	1178 mm
2	PGU 100x0.90	2219 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

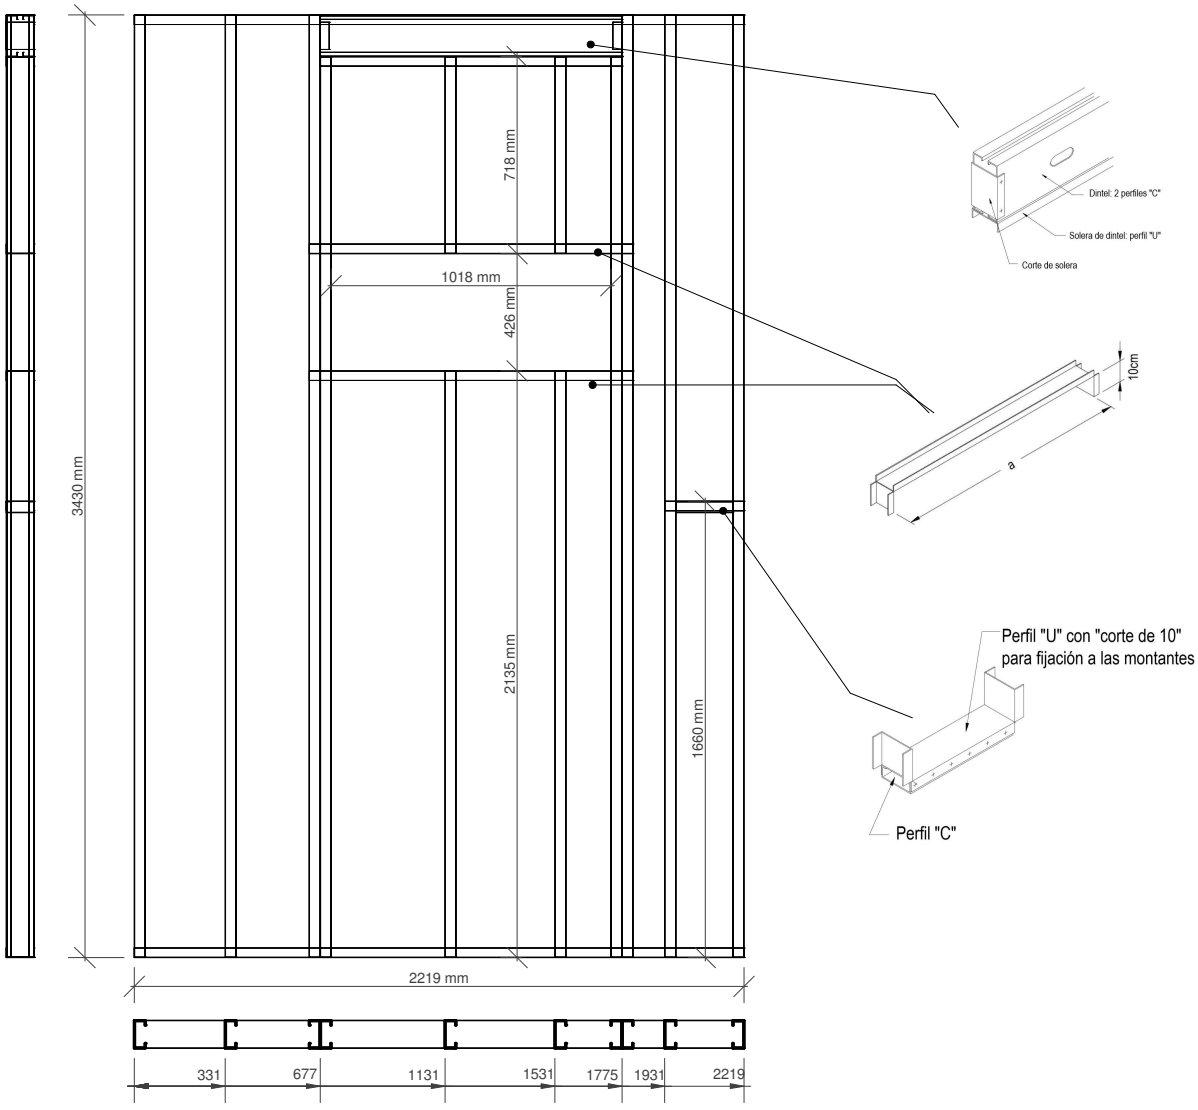

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PEX206

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
1	PGC100X0.90	212 mm
3	PGC100X0.90	716 mm
1	PGC100X0.90	717 mm
4	PGC100X0.90	2133 mm
2	PGC100X0.90	3277 mm
5	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGC150x1.60	1598 mm
2	PGU 100x0.90	100 mm
1	PGU 100x0.90	292 mm
1	PGU 100x0.90	1598 mm
2	PGU 100x0.90	1678 mm
2	PGU 100x0.90	2289 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

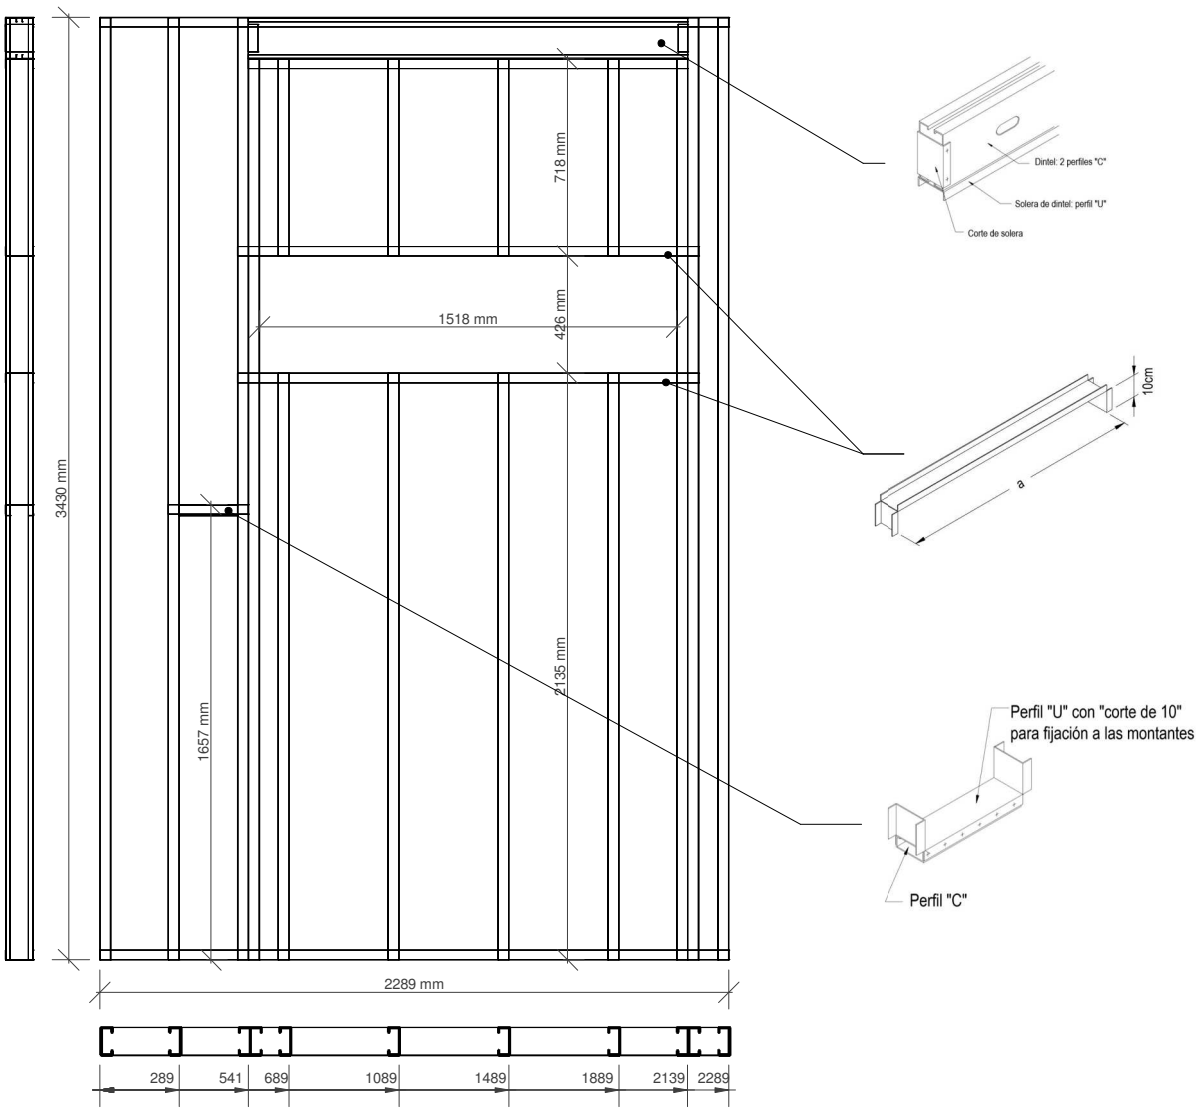

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PEX207

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
8	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGU 100x0.90	1600 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

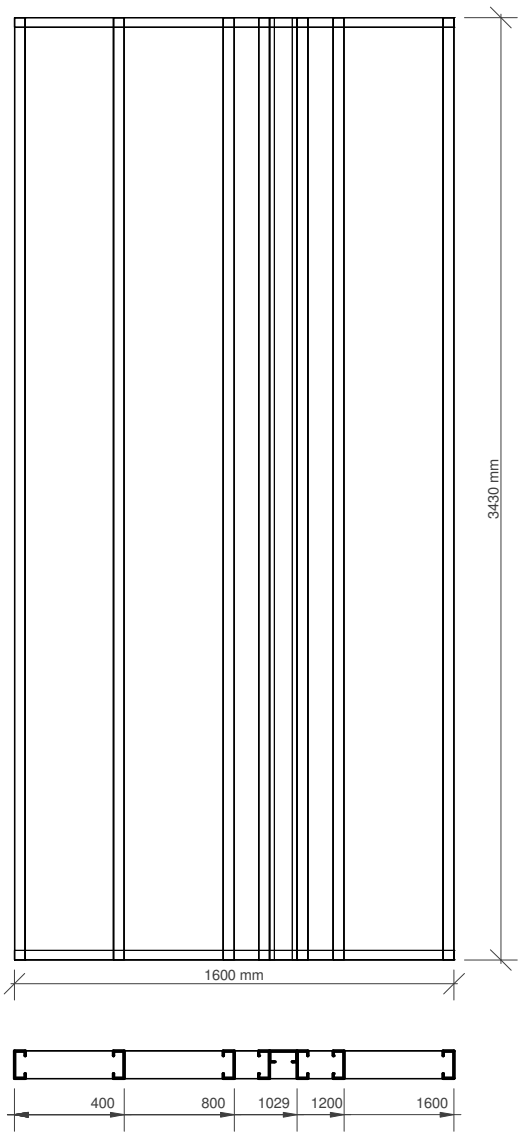

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PEX208

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
1	PGC100X0.90	252 mm
1	PGC100X0.90	320 mm
4	PGC100X0.90	716 mm
4	PGC100X0.90	2133 mm
2	PGC100X0.90	3277 mm
5	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGC150x1.60	1598 mm
2	PGU 100x0.90	100 mm
1	PGU 100x0.90	332 mm
1	PGU 100x0.90	400 mm
1	PGU 100x0.90	1598 mm
2	PGU 100x0.90	1678 mm
2	PGU 100x0.90	2400 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

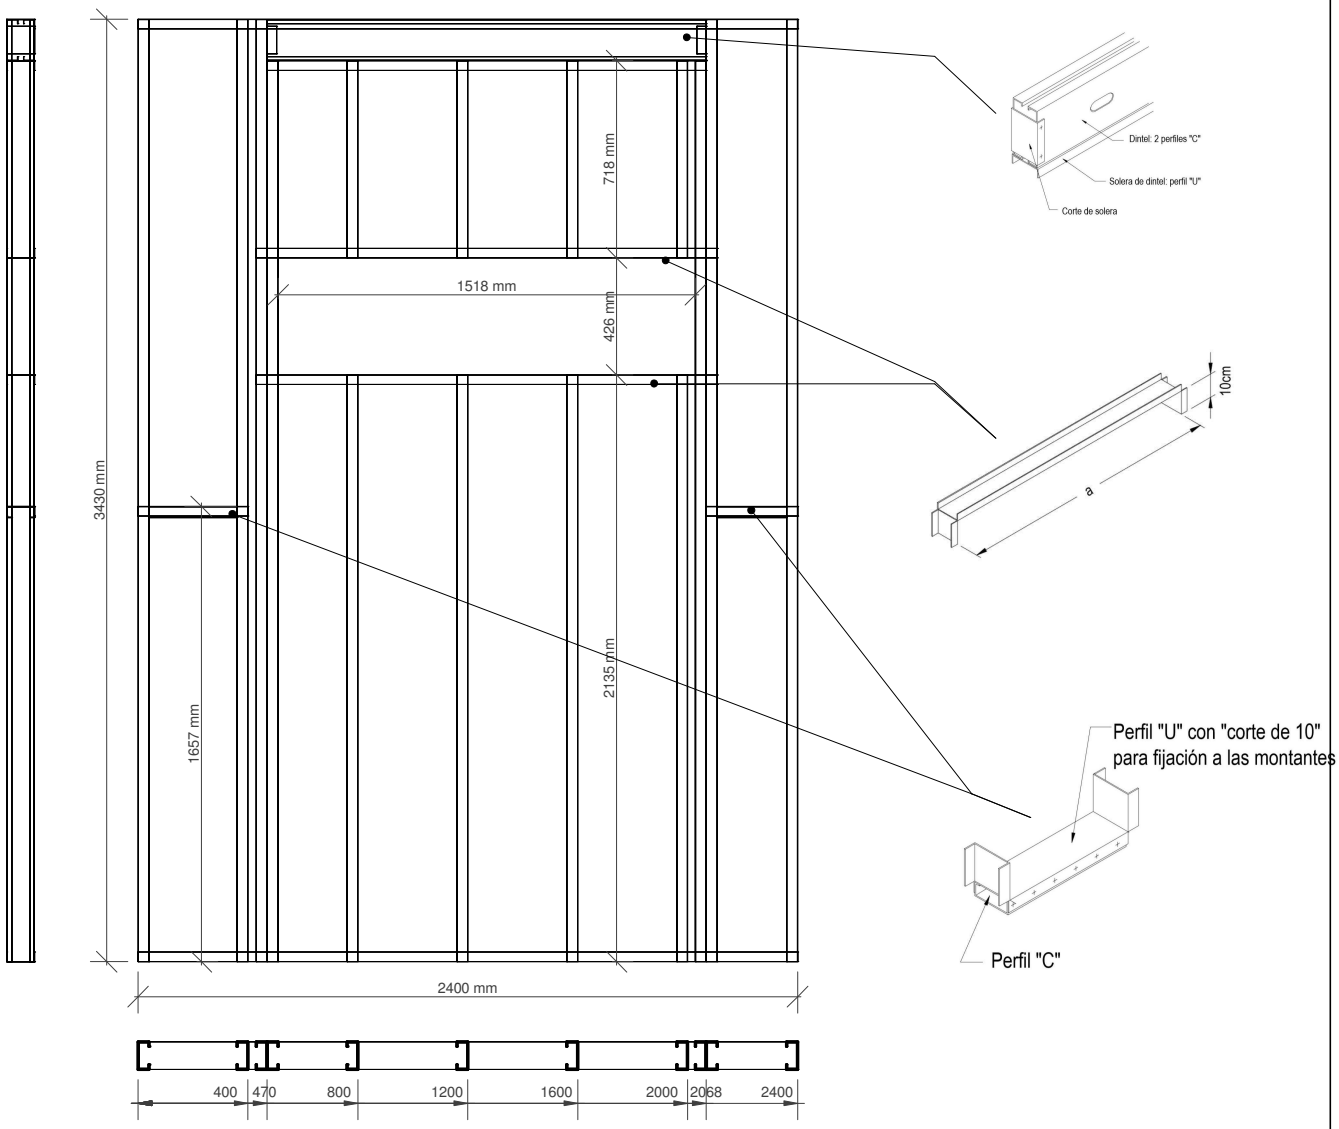

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PEX209

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
2	PGC100X0.90	698 mm
1	PGC100X0.90	766 mm
1	PGC100X0.90	2133 mm
2	PGC100X0.90	3327 mm
12	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGU 100x0.90	50 mm
1	PGU 100x0.90	698 mm
2	PGU 100x0.90	778 mm
2	PGU 100x0.90	2400 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

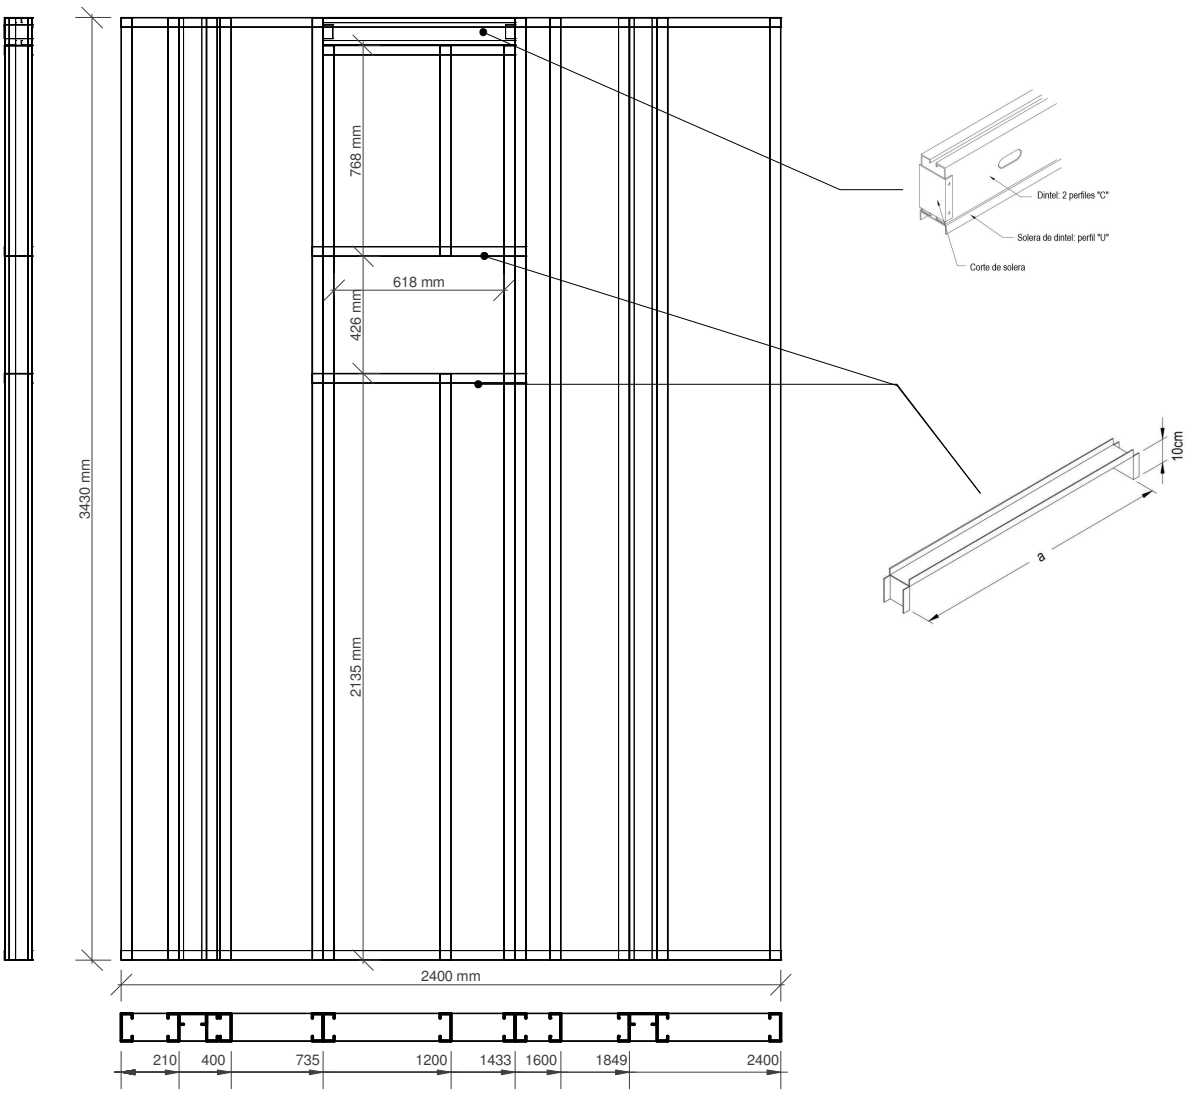

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PEX210

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
1	PGC100X0.90	332 mm
3	PGC100X0.90	716 mm
3	PGC100X0.90	2133 mm
2	PGC100X0.90	3277 mm
2	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGC150x1.60	1598 mm
2	PGU 100x0.90	100 mm
1	PGU 100x0.90	412 mm
1	PGU 100x0.90	1598 mm
2	PGU 100x0.90	1678 mm
2	PGU 100x0.90	2010 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

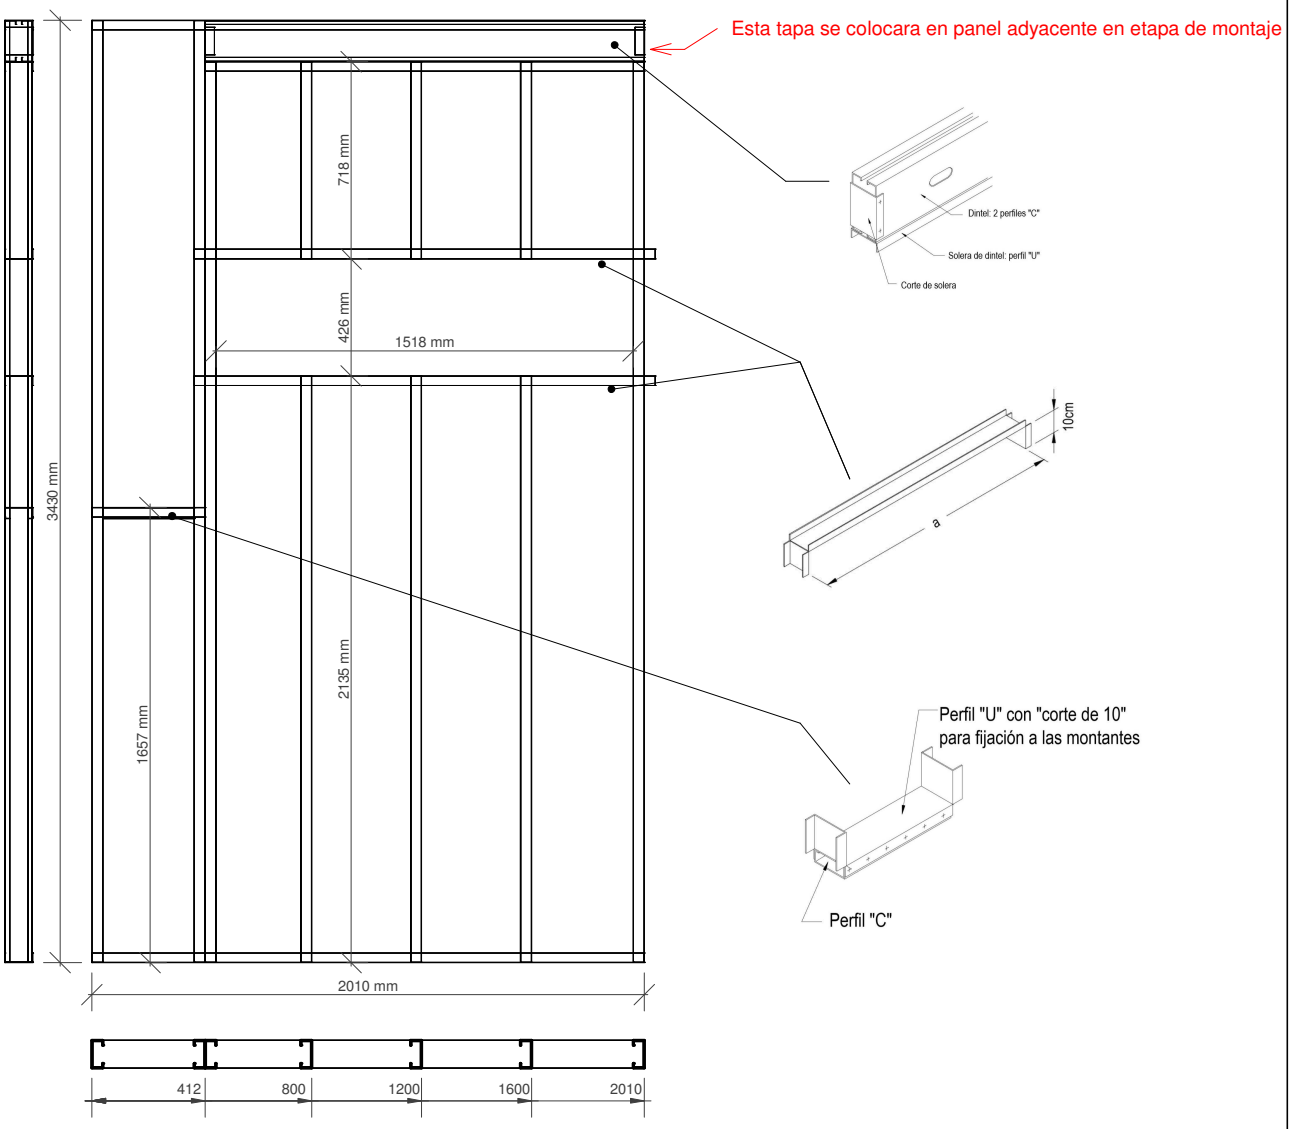

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PEX211

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
1	PGC100X0.90	171 mm
1	PGC100X0.90	310 mm
4	PGC100X0.90	716 mm
4	PGC100X0.90	2133 mm
2	PGC100X0.90	3277 mm
5	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGC150x1.60	1598 mm
2	PGU 100x0.90	100 mm
1	PGU 100x0.90	251 mm
1	PGU 100x0.90	390 mm
1	PGU 100x0.90	1598 mm
2	PGU 100x0.90	1678 mm
2	PGU 100x0.90	2399 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

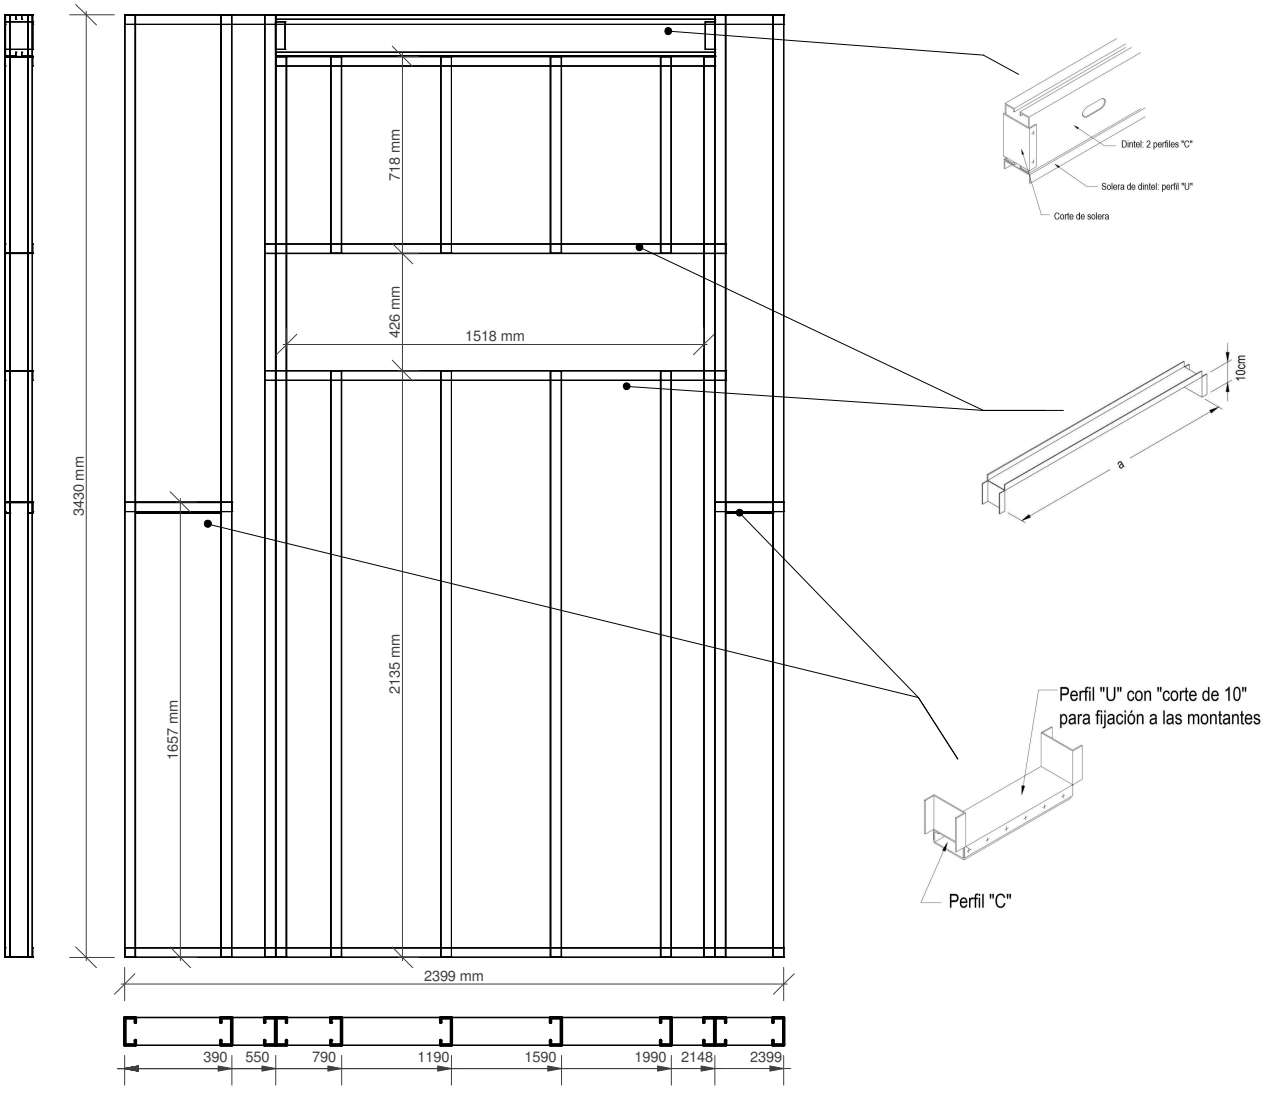

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PEX212

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
7	PGC100X0.90	3968 mm
2	PGU 100x0.90	1600 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

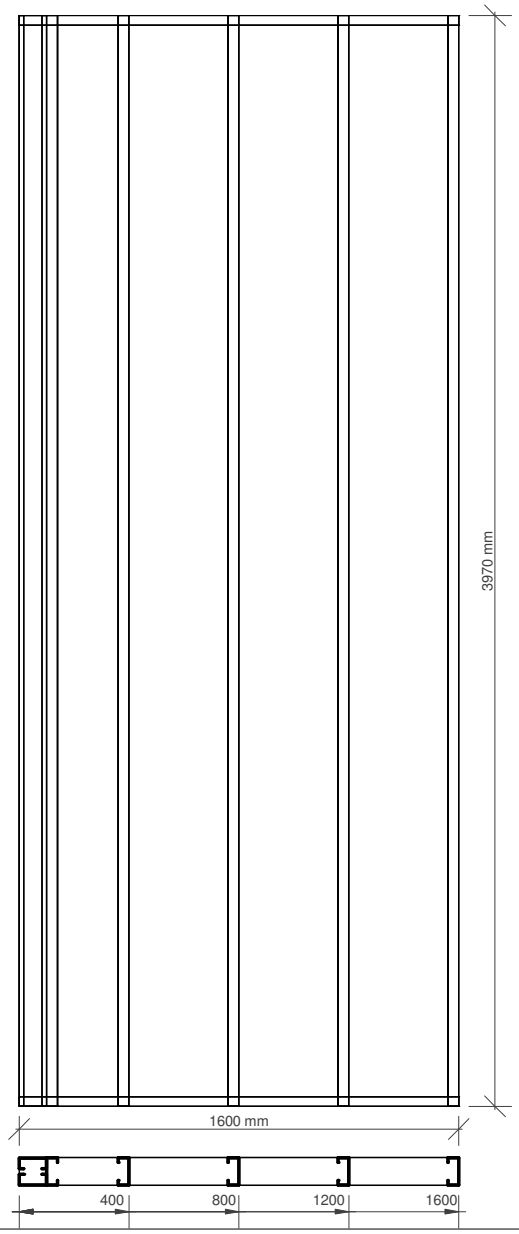

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PEX213

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
7	PGC100X0.90	3968 mm
1	PGC100X0.90	3970 mm
1	PGU 100x0.90	1560 mm
1	PGU 100x0.90	1600 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

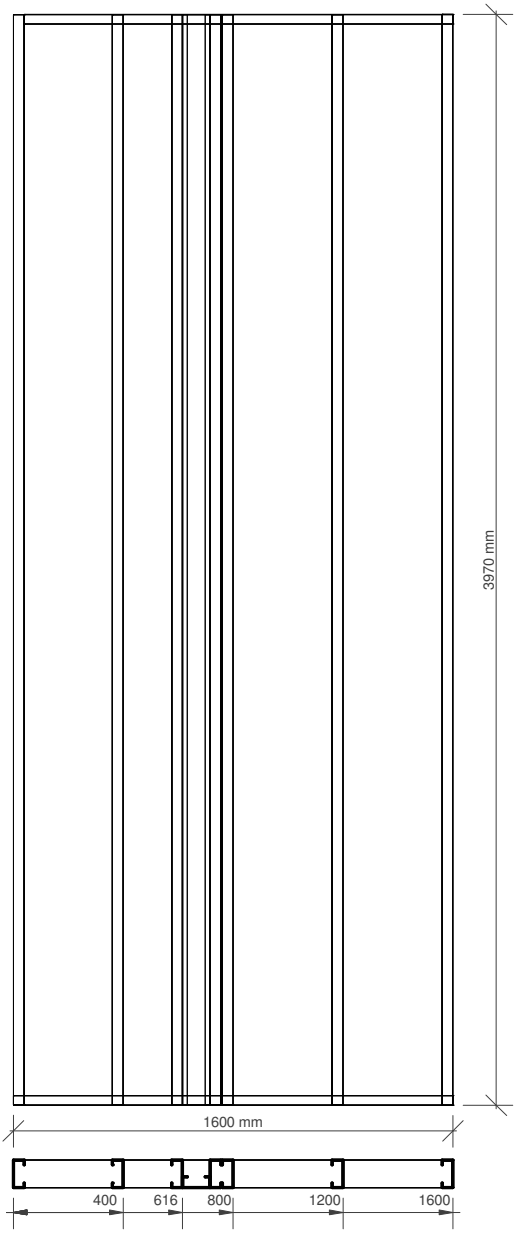

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PEX214

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
8	PGC100X0.90	3968 mm
1	PGC100X0.90	3970 mm
2	PGU 100x0.90	2000 mm

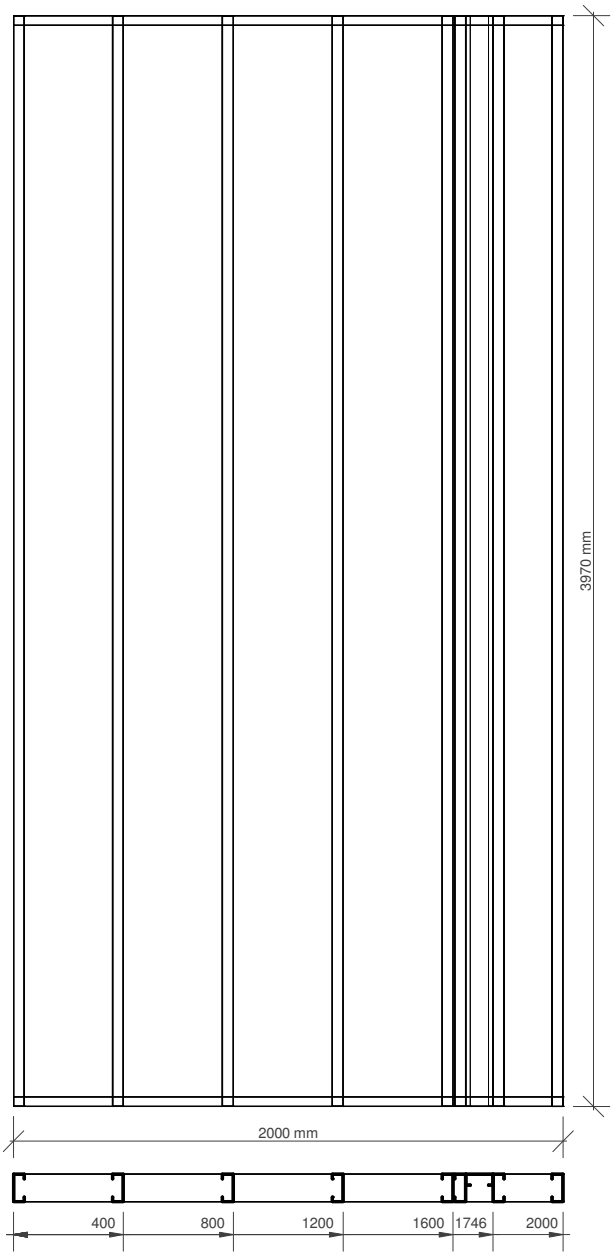

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PEX215

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
9	PGC100X0.90	3968 mm
1	PGU 100x0.90	2215 mm
1	PGU 100x0.90	2216 mm

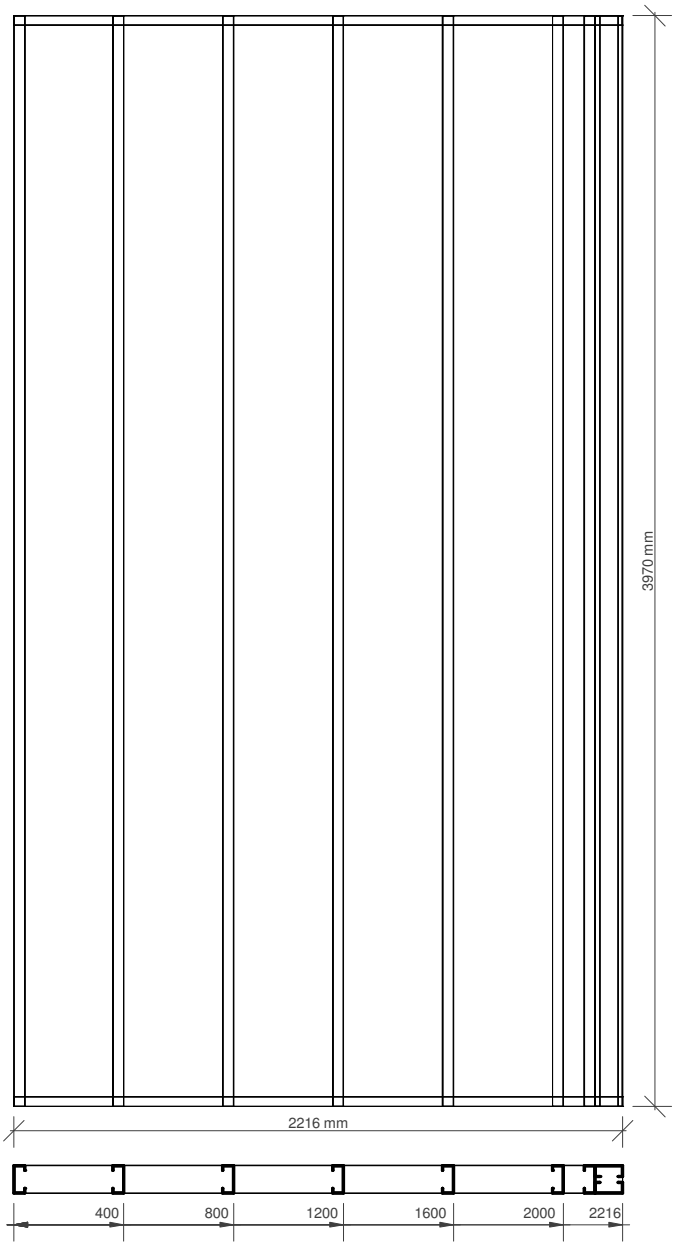

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PEX216

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
4	PGC100X0.90	716 mm
3	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGC150x1.60	1458 mm
2	PGU 100x0.90	100 mm
1	PGU 100x0.90	1458 mm
1	PGU 100x0.90	1498 mm
2	PGU 100x0.90	1560 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

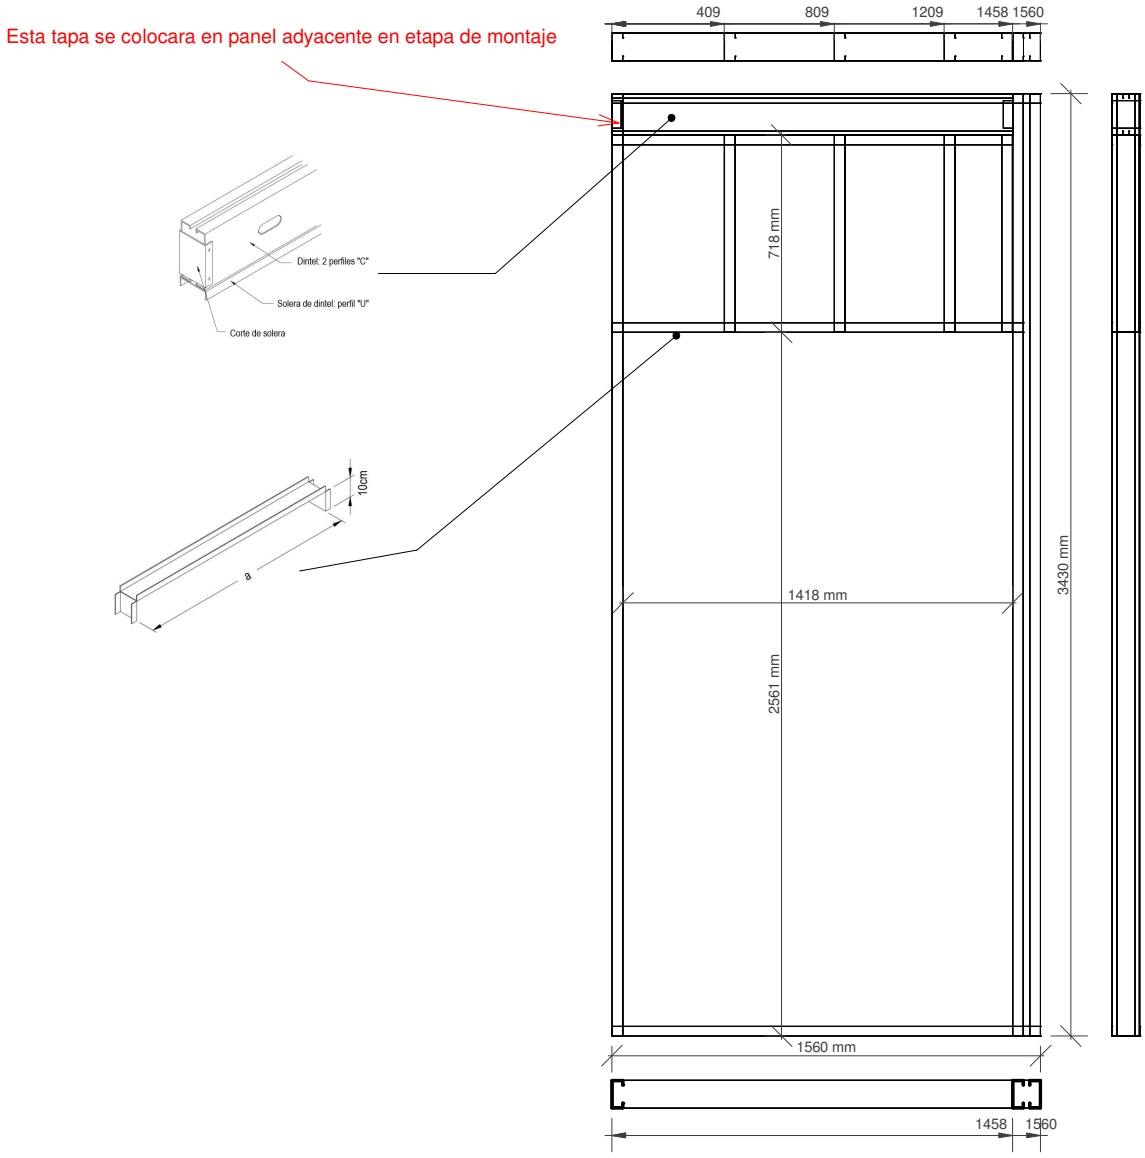

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PEX301

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
4	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGU 100x0.90	809 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

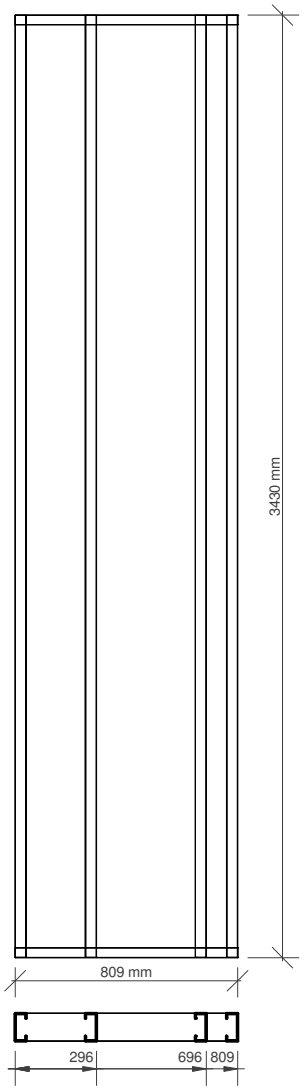

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PEX302

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
1	PGC100X0.90	372 mm
2	PGC100X0.90	3226 mm
2	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGC100X0.90	3429 mm
1	PGU 100x0.90	100 mm
1	PGU 100x0.90	452 mm
1	PGU 100x0.90	903 mm
1	PGU 100x0.90	1003 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

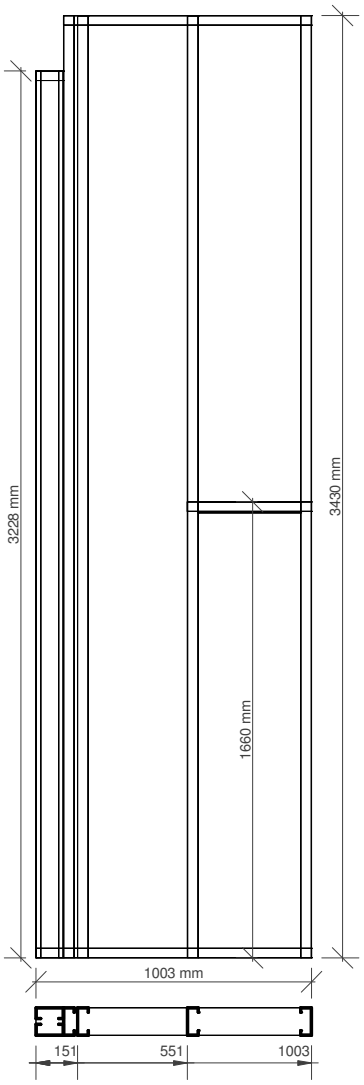

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PEX303

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
1	PGC100X0.90	310 mm
3	PGC100X0.90	716 mm
3	PGC100X0.90	2133 mm
2	PGC100X0.90	3277 mm
3	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGC150x1.60	1598 mm
2	PGU 100x0.90	100 mm
1	PGU 100x0.90	390 mm
1	PGU 100x0.90	1598 mm
2	PGU 100x0.90	1678 mm
2	PGU 100x0.90	2348 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

Esta tapa se colocara en panel adyacente en etapa de montaje

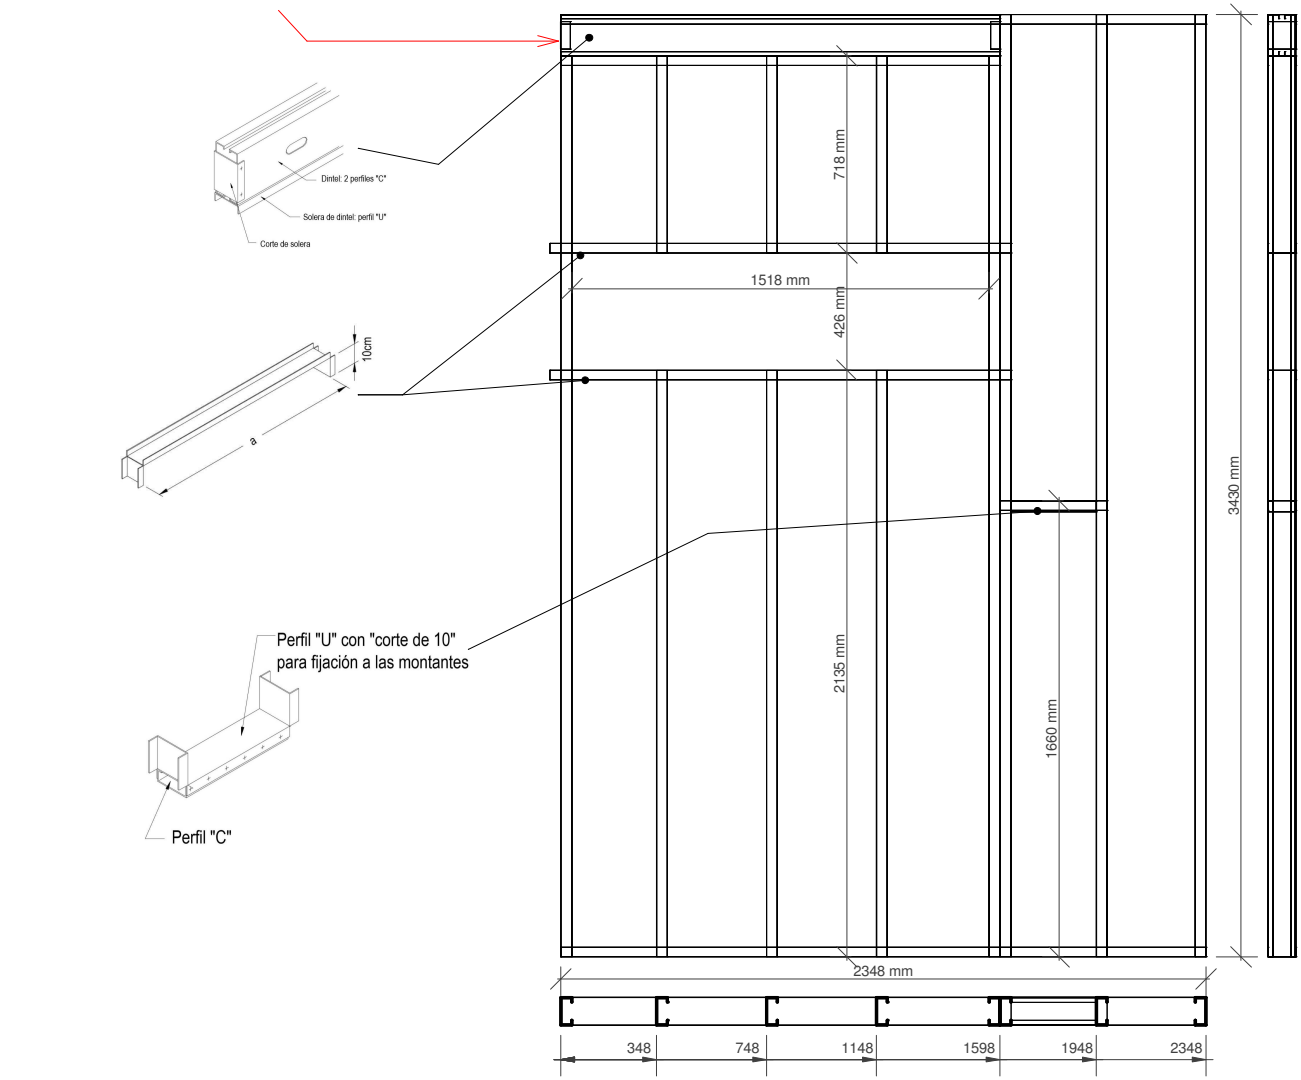

	GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD	OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA	PEX304 ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
2	PGC100X0.90	716 mm
1	PGC100X0.90	3277 mm
6	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGC150x1.60	958 mm
2	PGU 100x0.90	100 mm
1	PGU 100x0.90	958 mm
1	PGU 100x0.90	1038 mm
2	PGU 100x0.90	1600 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

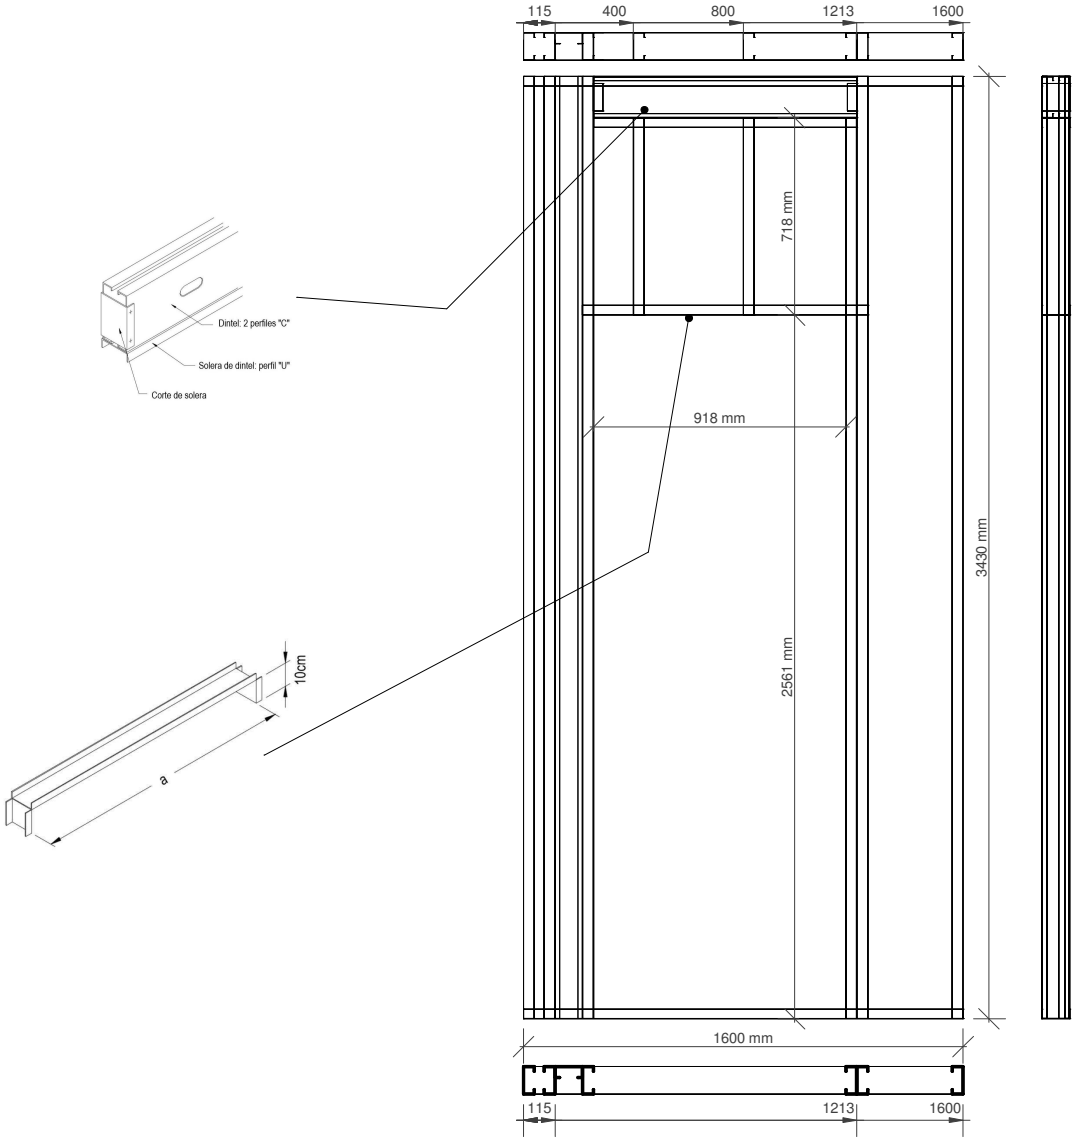

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PEX305

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
1	PGC100X0.90	361 mm
3	PGC100X0.90	716 mm
3	PGC100X0.90	983 mm
2	PGC100X0.90	3277 mm
3	PGC100X0.90	3428 mm
1	PGC100X0.90	3430 mm
2	PGC150x1.60	1598 mm
2	PGU 100x0.90	100 mm
1	PGU 100x0.90	441 mm
1	PGU 100x0.90	1598 mm
2	PGU 100x0.90	1678 mm
2	PGU 100x0.90	2289 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

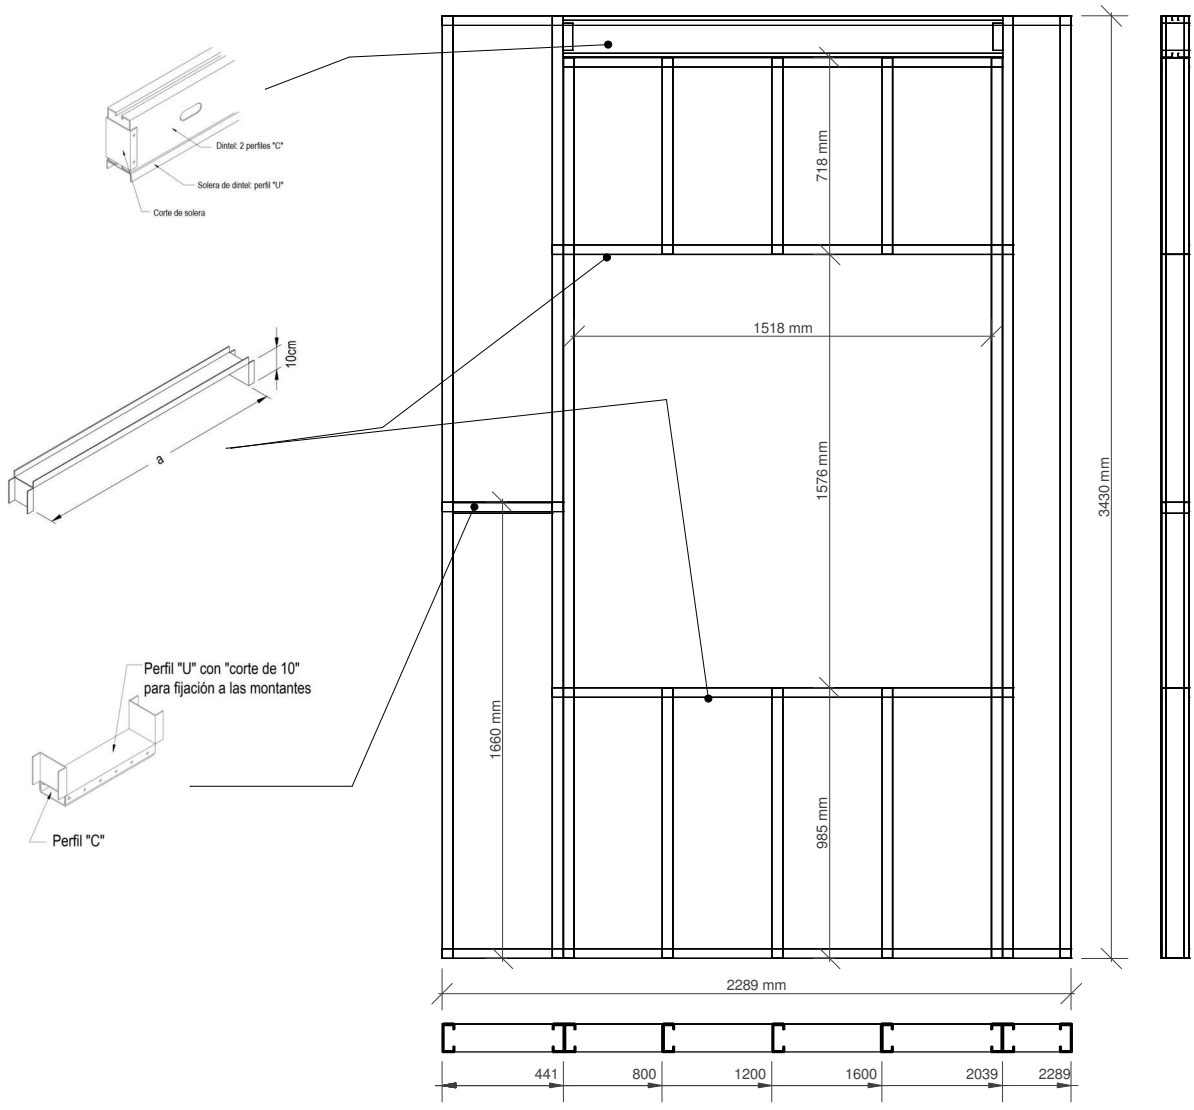

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PEX306

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
1	PGC100X0.90	221 mm
1	PGC100X0.90	310 mm
3	PGC100X0.90	716 mm
3	PGC100X0.90	2133 mm
2	PGC100X0.90	3277 mm
4	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGC150x1.60	1598 mm
2	PGU 100x0.90	100 mm
1	PGU 100x0.90	301 mm
1	PGU 100x0.90	390 mm
1	PGU 100x0.90	1598 mm
2	PGU 100x0.90	1678 mm
2	PGU 100x0.90	2289 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

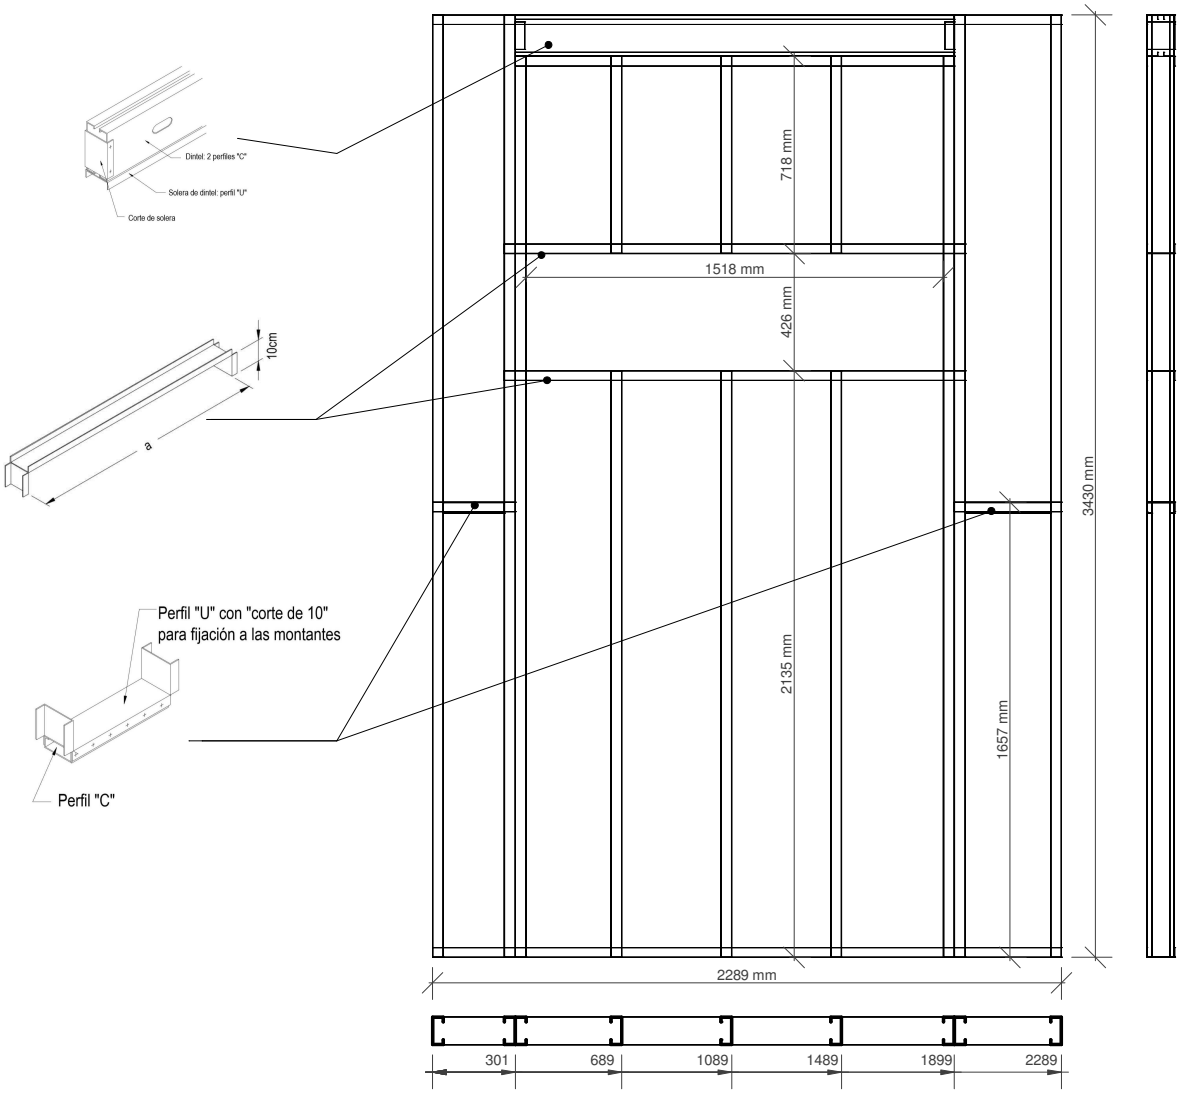

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PEX307

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
1	PGC100X0.90	266 mm
9	PGC100X0.90	3428 mm
1	PGU 100x0.90	346 mm
2	PGU 100x0.90	2306 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

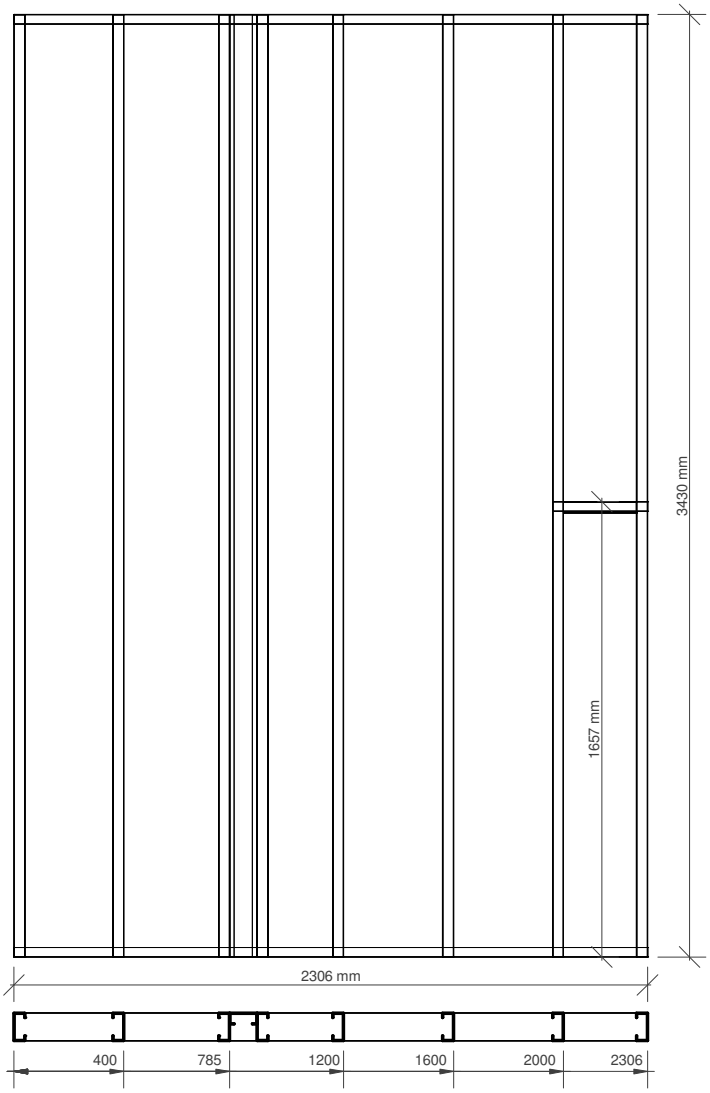

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PEX308

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
3	PGC100X0.90	716 mm
3	PGC100X0.90	2133 mm
2	PGC100X0.90	3277 mm
3	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGC150x1.60	1598 mm
2	PGU 100x0.90	100 mm
1	PGU 100x0.90	1598 mm
2	PGU 100x0.90	1678 mm
2	PGU 100x0.90	2094 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

Esta tapa se colocara en panel adyacente en etapa de montaje

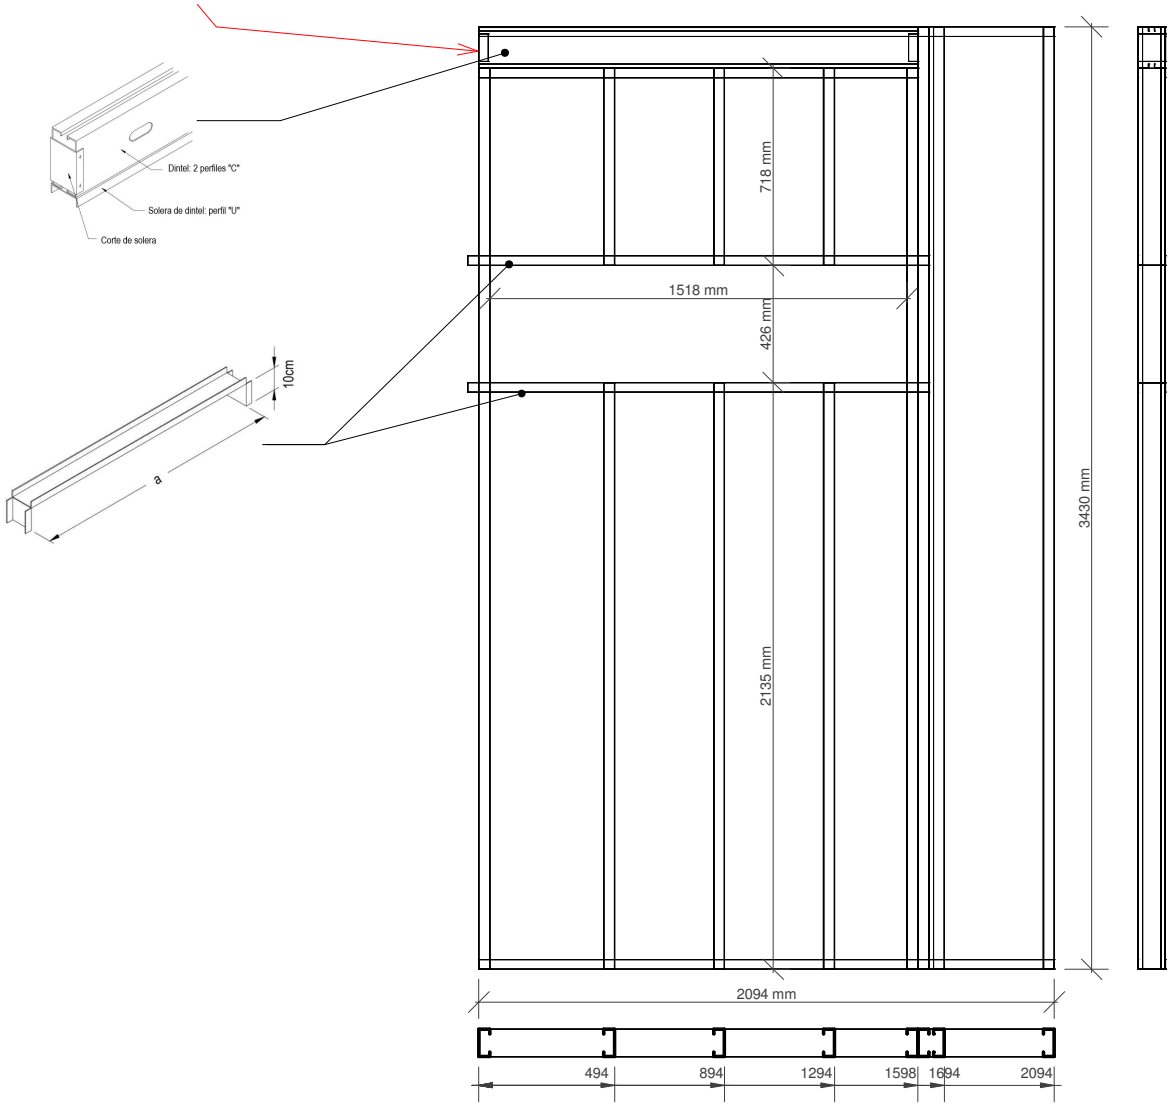

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PEX309

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
1	PGC100X0.90	320 mm
3	PGC100X0.90	716 mm
2	PGC100X0.90	3277 mm
3	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGC150x1.60	1498 mm
2	PGU 100x0.90	100 mm
1	PGU 100x0.90	400 mm
1	PGU 100x0.90	1498 mm
1	PGU 100x0.90	1538 mm
2	PGU 100x0.90	2009 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

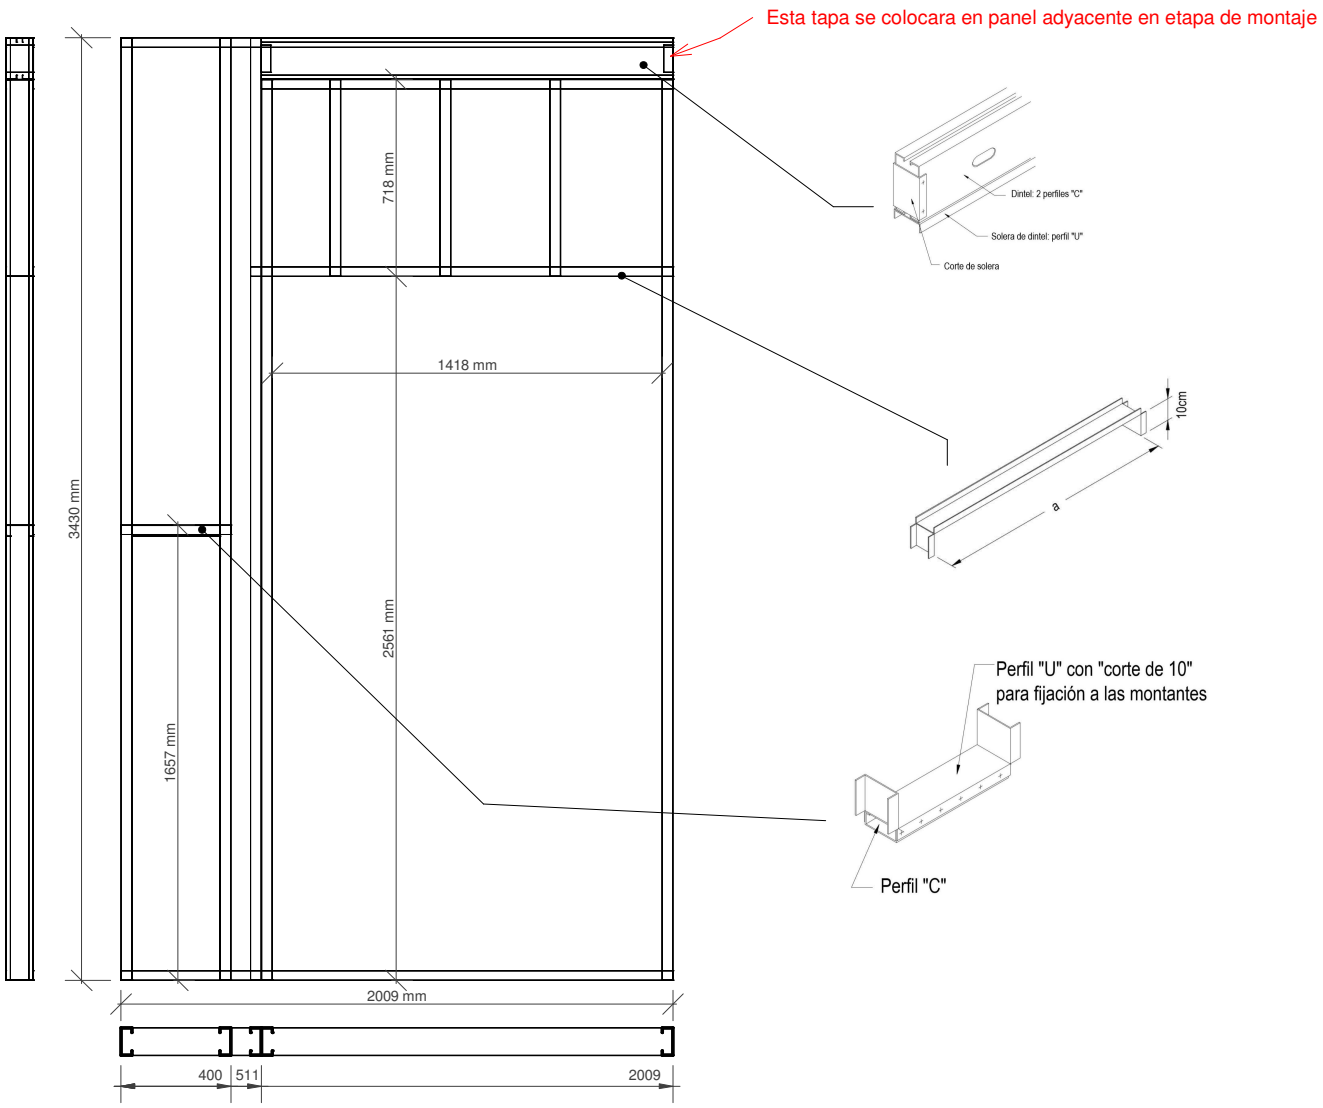

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PEX310

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
7	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGU 100x0.90	1600 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

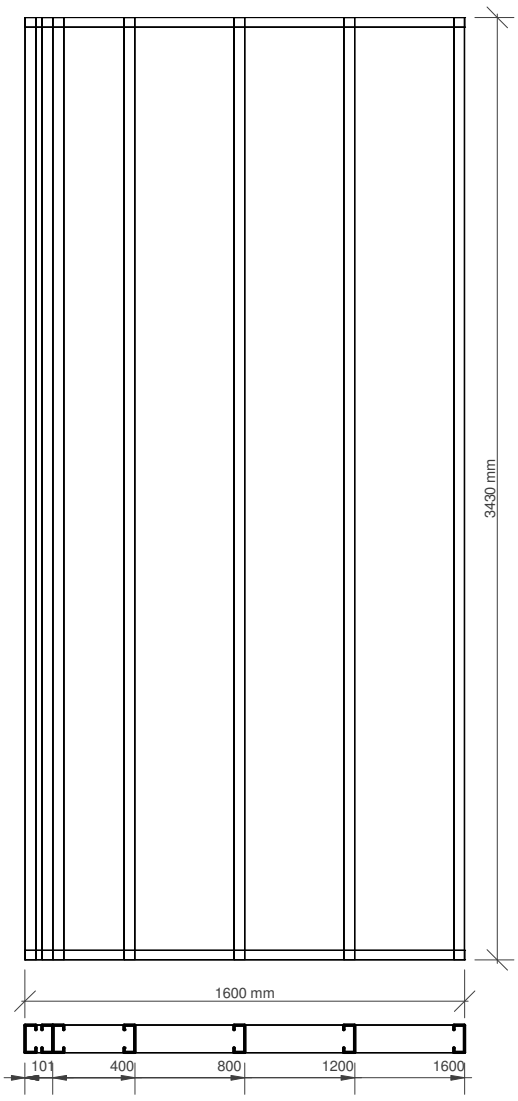

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PEX311

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
5	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGU 100x0.90	1600 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

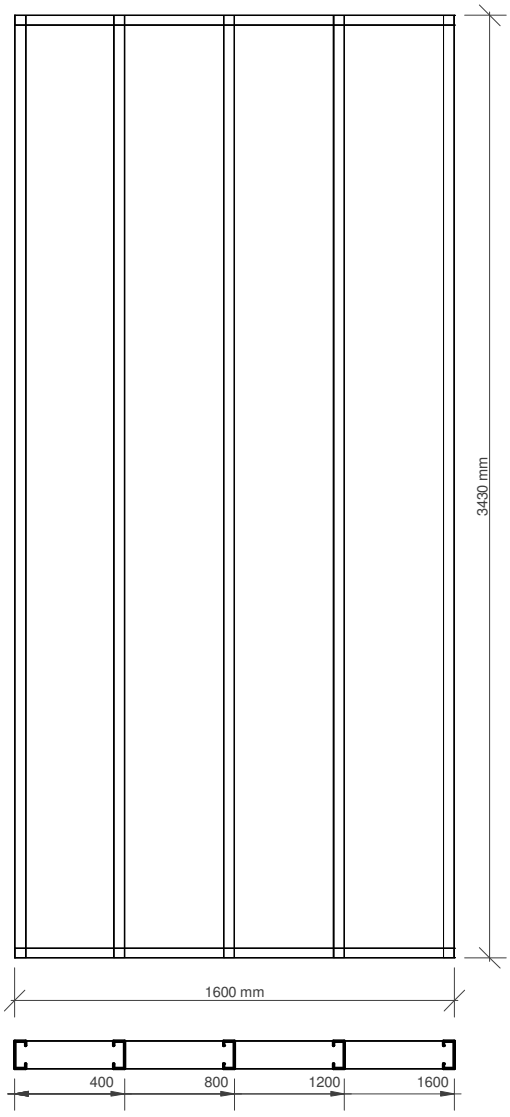

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PEX312

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
6	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGU 100x0.90	2000 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

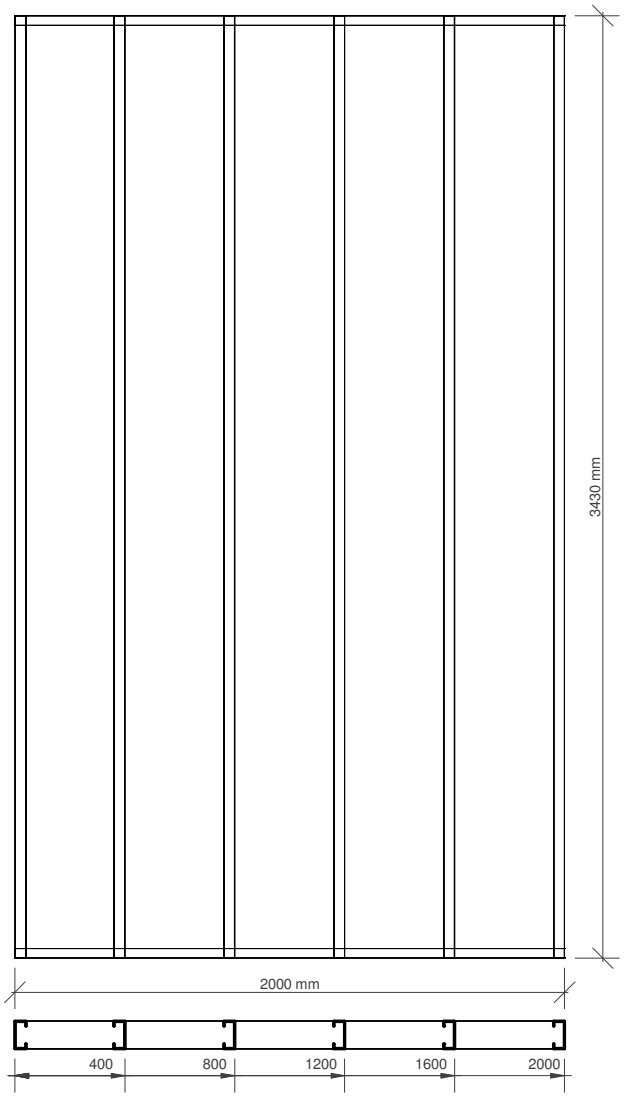

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PEX313

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
2	PGC100X0.90	3226 mm
9	PGC100X0.90	3428 mm
1	PGU 100x0.90	101 mm
1	PGU 100x0.90	2115 mm
1	PGU 100x0.90	2216 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

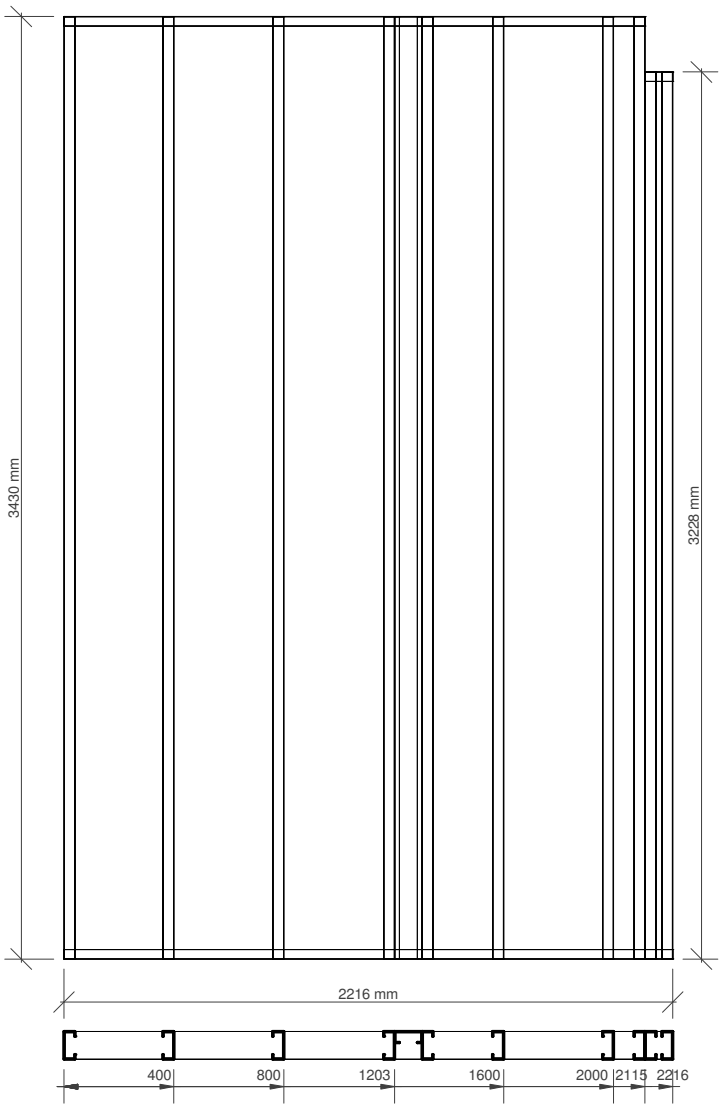

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PEX314

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
1	PGC100X0.90	360 mm
3	PGC100X0.90	716 mm
2	PGC100X0.90	3277 mm
4	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGC150x1.60	1498 mm
2	PGU 100x0.90	100 mm
1	PGU 100x0.90	440 mm
1	PGU 100x0.90	1498 mm
1	PGU 100x0.90	1538 mm
2	PGU 100x0.90	2409 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

Esta tapa se colocara en panel adyacente en etapa de montaje

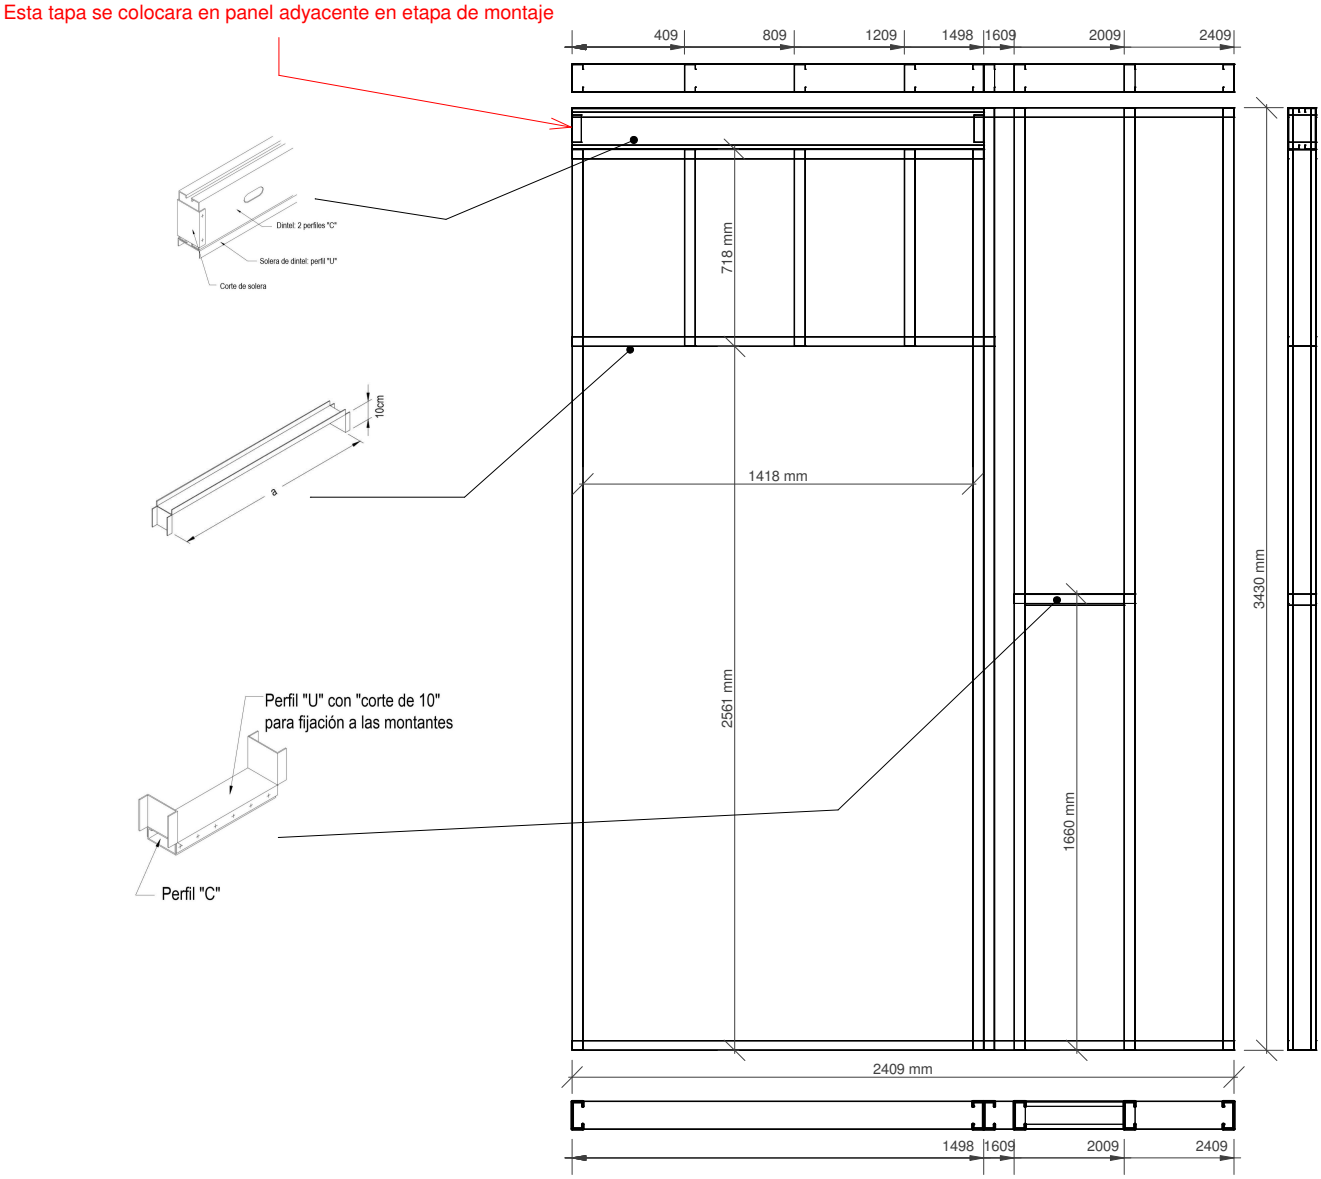

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PEX401

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
2	PGC100X0.90	716 mm
2	PGC100X0.90	2133 mm
2	PGC100X0.90	3277 mm
5	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGC150x1.60	1098 mm
2	PGU 100x0.90	100 mm
1	PGU 100x0.90	1098 mm
2	PGU 100x0.90	1178 mm
2	PGU 100x0.90	1775 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

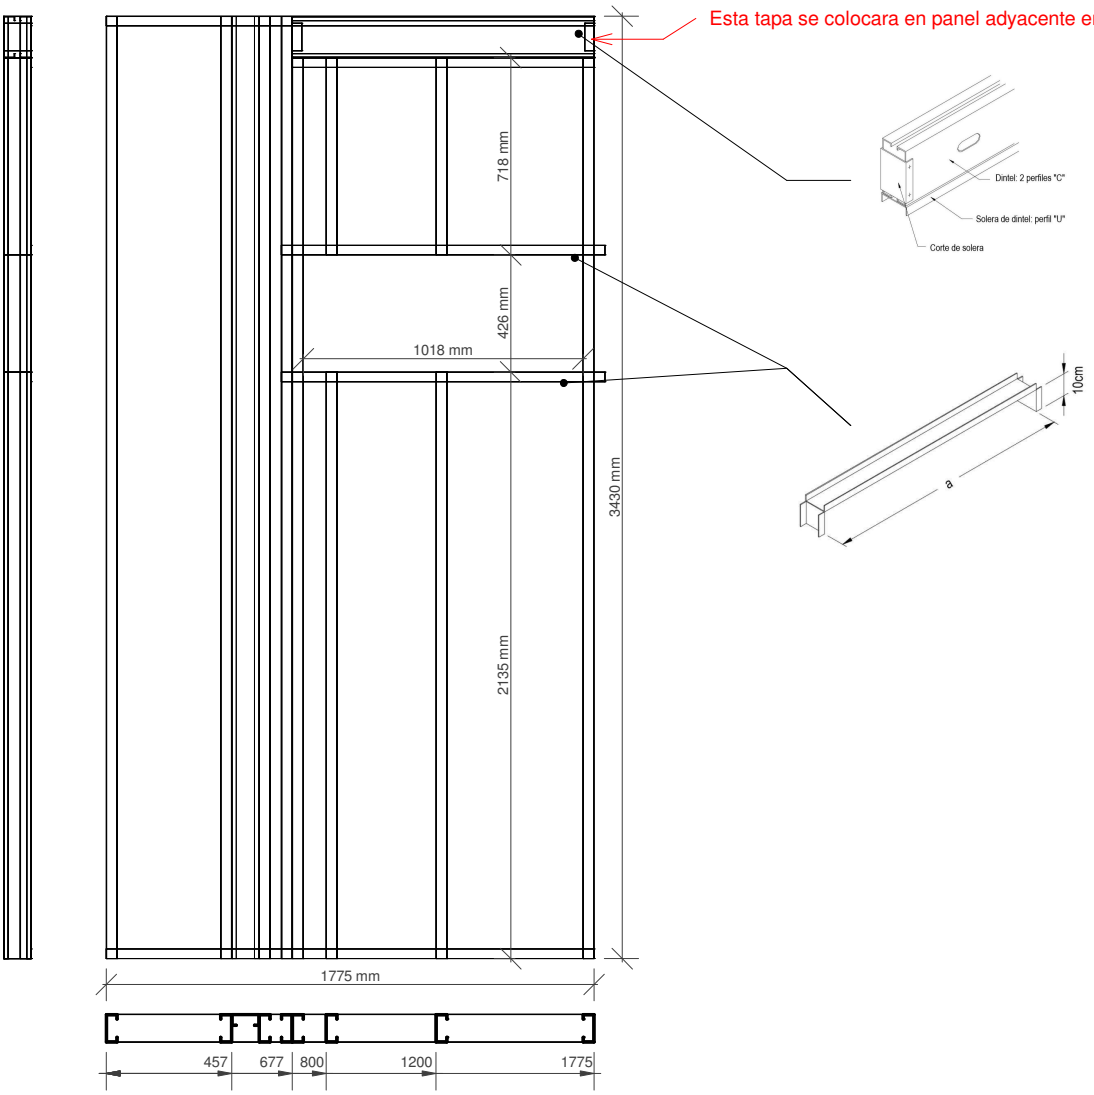

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PEX402

ESCALA 1:25

LIsta de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
1	PGC100X0.90	185 mm
4	PGC100X0.90	716 mm
4	PGC100X0.90	2133 mm
2	PGC100X0.90	3277 mm
5	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGC150x1.60	1598 mm
2	PGU 100x0.90	100 mm
1	PGU 100x0.90	265 mm
1	PGU 100x0.90	1598 mm
2	PGU 100x0.90	1678 mm
2	PGU 100x0.90	2225 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

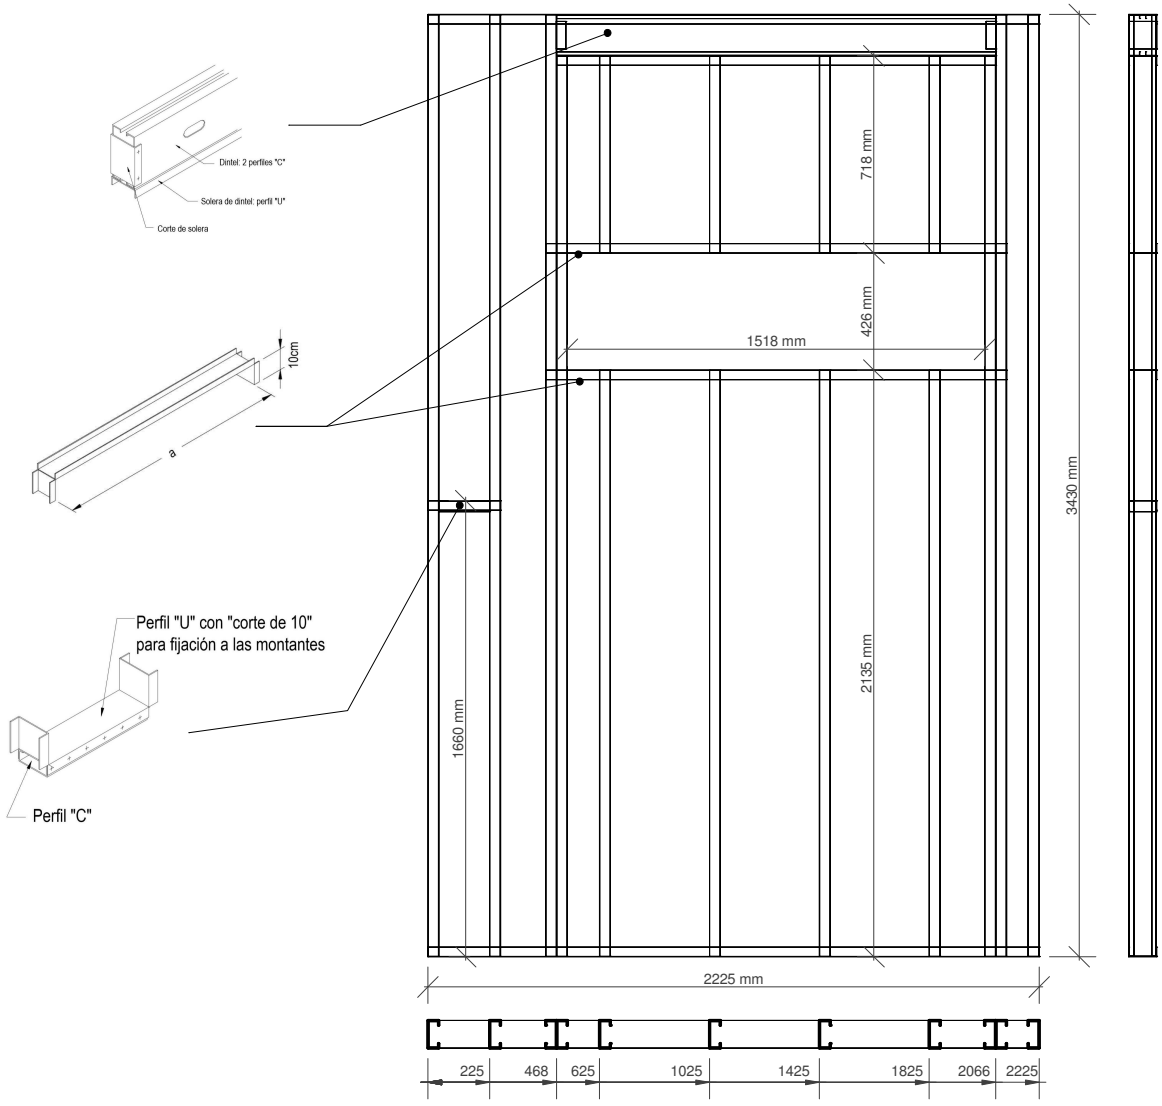

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PEX403

ESCALA 1:25

LIsta de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
1	PGC100X0.90	391 mm
3	PGC100X0.90	716 mm
3	PGC100X0.90	2133 mm
2	PGC100X0.90	3277 mm
4	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGC150x1.60	1598 mm
2	PGU 100x0.90	100 mm
1	PGU 100x0.90	471 mm
1	PGU 100x0.90	1598 mm
2	PGU 100x0.90	1678 mm
2	PGU 100x0.90	2289 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

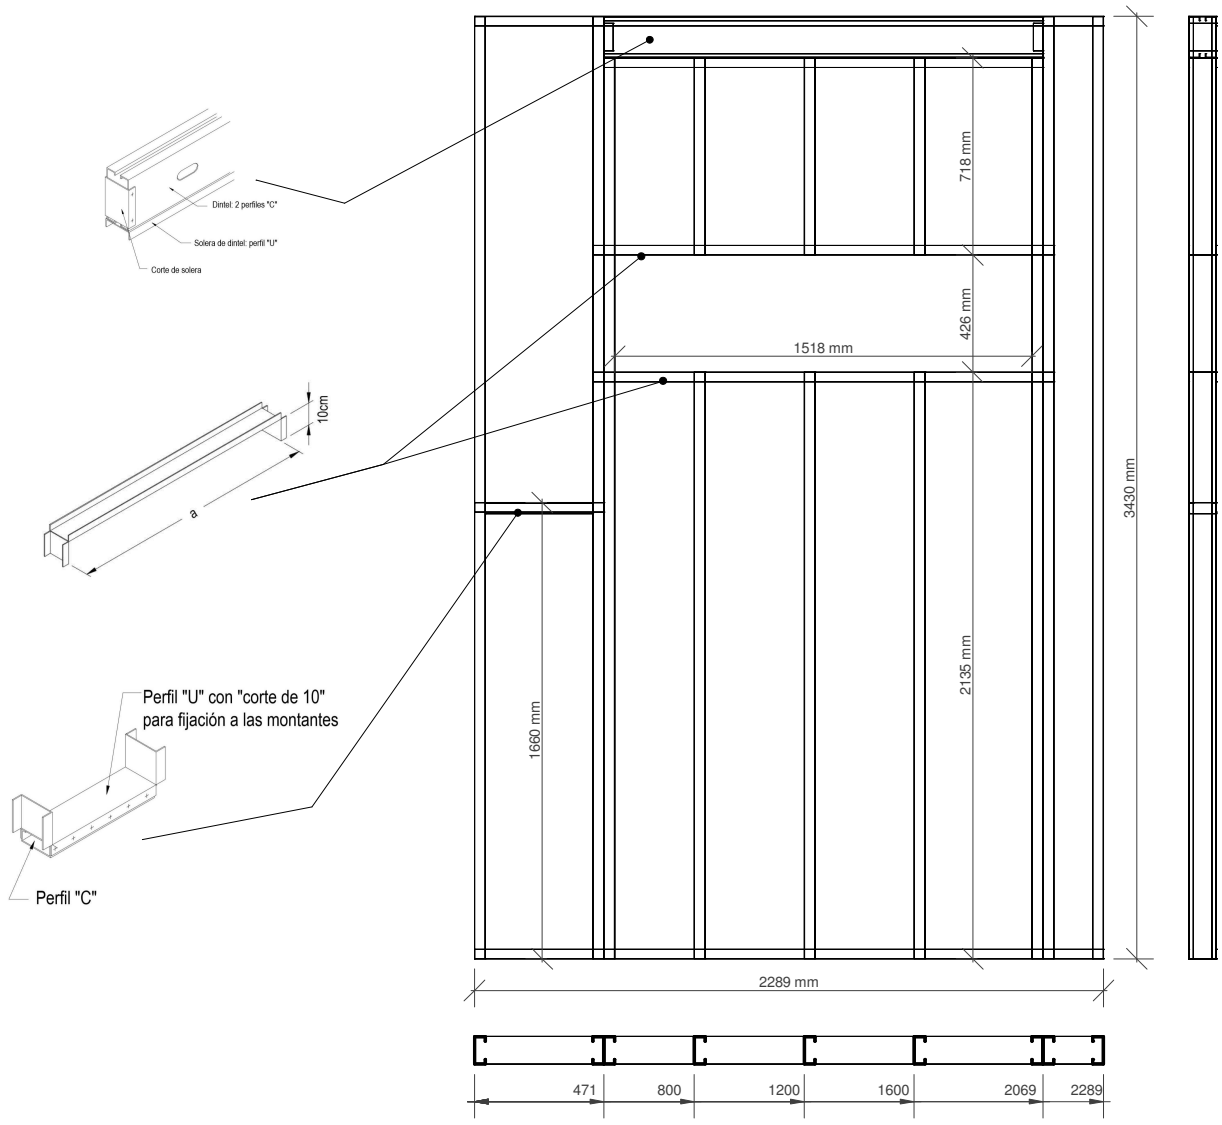

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PEX404

ESCALA 1:25

LIsta de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
1	PGC100X0.90	170 mm
1	PGC100X0.90	361 mm
3	PGC100X0.90	716 mm
3	PGC100X0.90	2133 mm
2	PGC100X0.90	3277 mm
4	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGC150x1.60	1598 mm
2	PGU 100x0.90	100 mm
1	PGU 100x0.90	250 mm
1	PGU 100x0.90	441 mm
1	PGU 100x0.90	1598 mm
2	PGU 100x0.90	1678 mm
2	PGU 100x0.90	2289 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

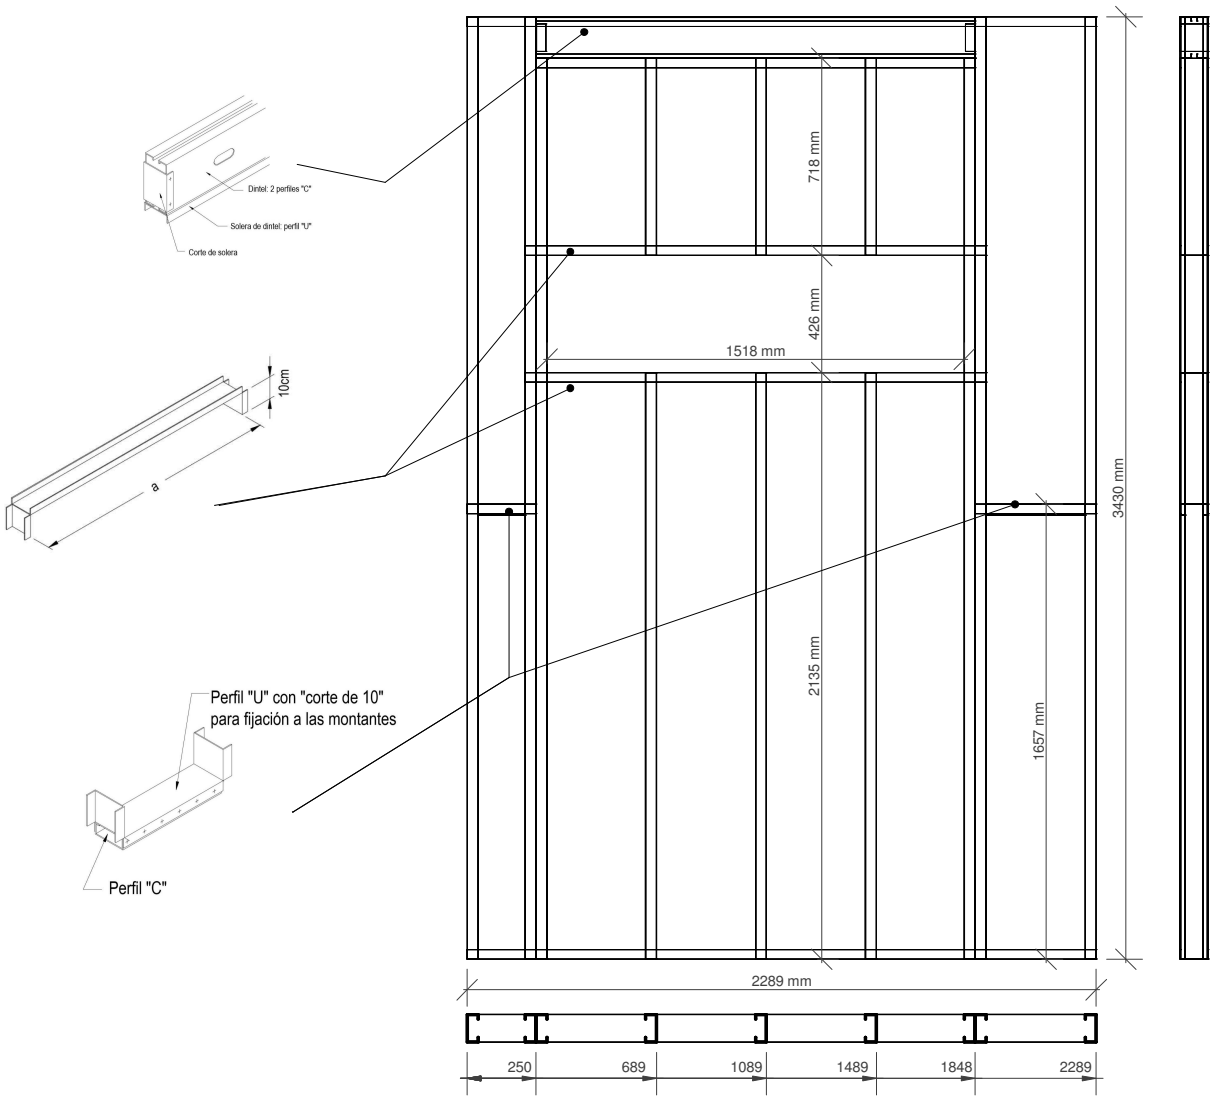

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PEX405

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
4	PGC100X0.90	716 mm
4	PGC100X0.90	2133 mm
2	PGC100X0.90	3277 mm
2	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGC150x1.60	1598 mm
2	PGU 100x0.90	100 mm
1	PGU 100x0.90	1598 mm
2	PGU 100x0.90	1678 mm
2	PGU 100x0.90	1802 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

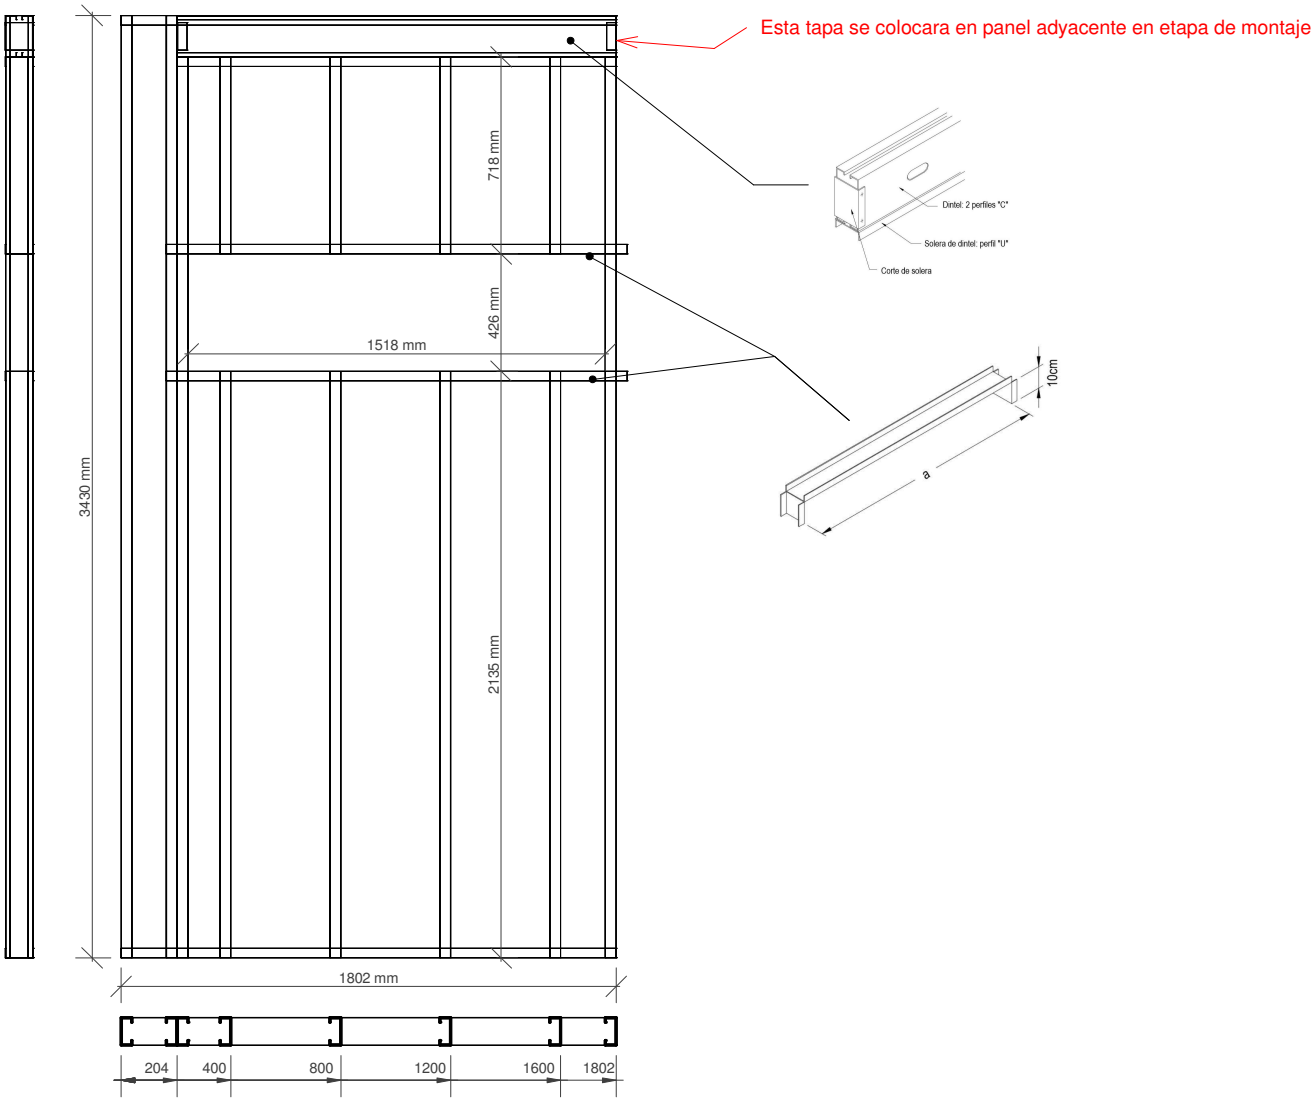

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PEX406

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
1	PGC100X0.90	175 mm
3	PGC100X0.90	716 mm
3	PGC100X0.90	2133 mm
2	PGC100X0.90	3277 mm
8	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGC150x1.60	1098 mm
2	PGU 100x0.90	100 mm
1	PGU 100x0.90	255 mm
1	PGU 100x0.90	1098 mm
2	PGU 100x0.90	1178 mm
2	PGU 100x0.90	2198 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

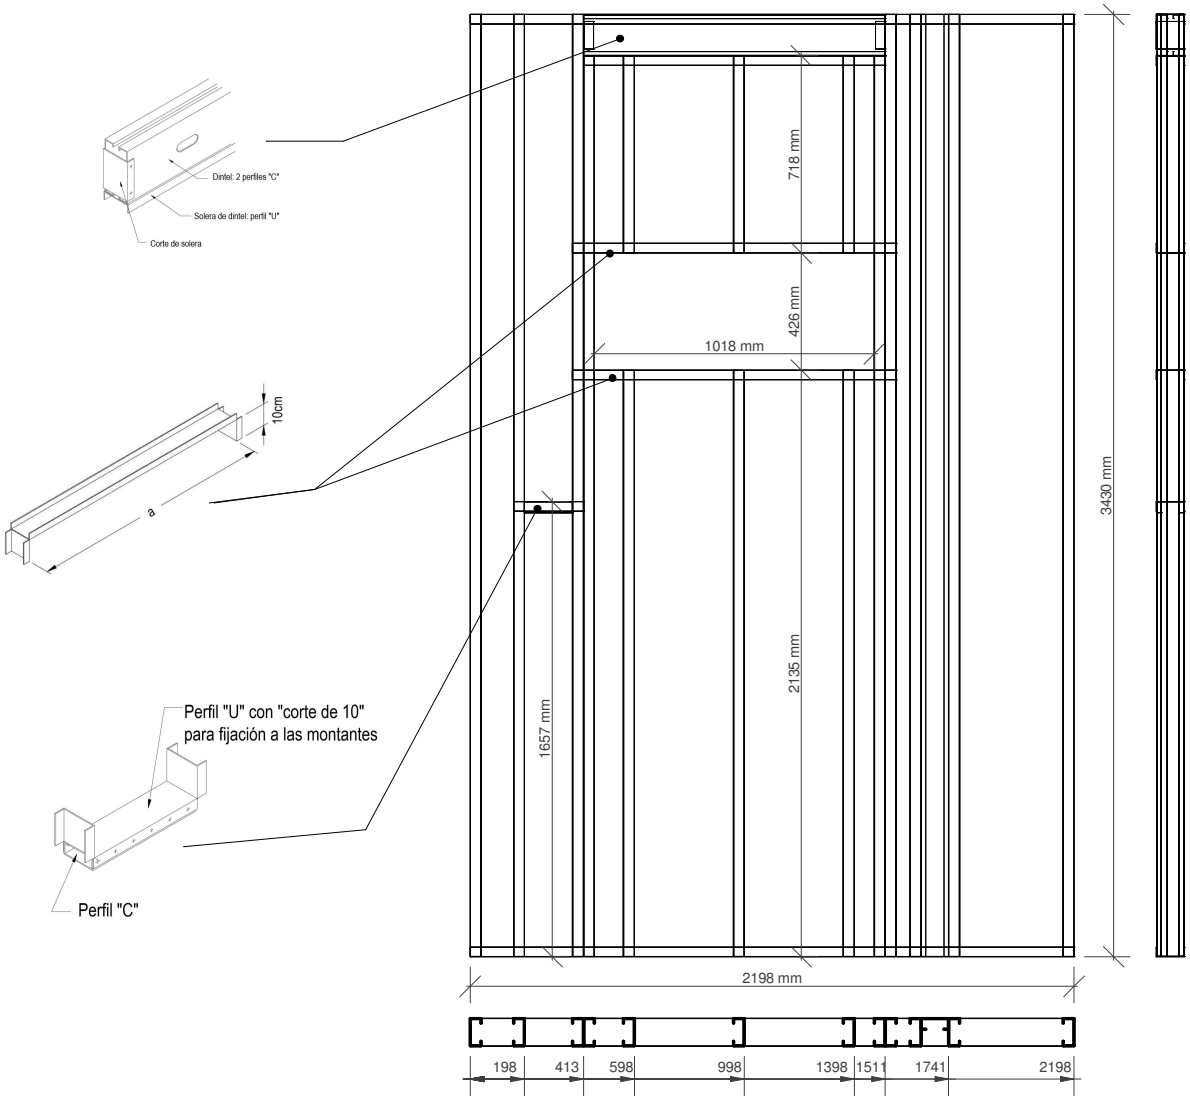

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PEX407

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
1	PGC100X0.90	167 mm
1	PGC100X0.90	261 mm
4	PGC100X0.90	698 mm
4	PGC100X0.90	766 mm
4	PGC100X0.90	2133 mm
4	PGC100X0.90	3327 mm
9	PGC100X0.90	3428 mm
4	PGU 100x0.90	50 mm
1	PGU 100x0.90	247 mm
1	PGU 100x0.90	341 mm
2	PGU 100x0.90	698 mm
2	PGU 100x0.90	738 mm
2	PGU 100x0.90	778 mm
2	PGU 100x0.90	2409 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

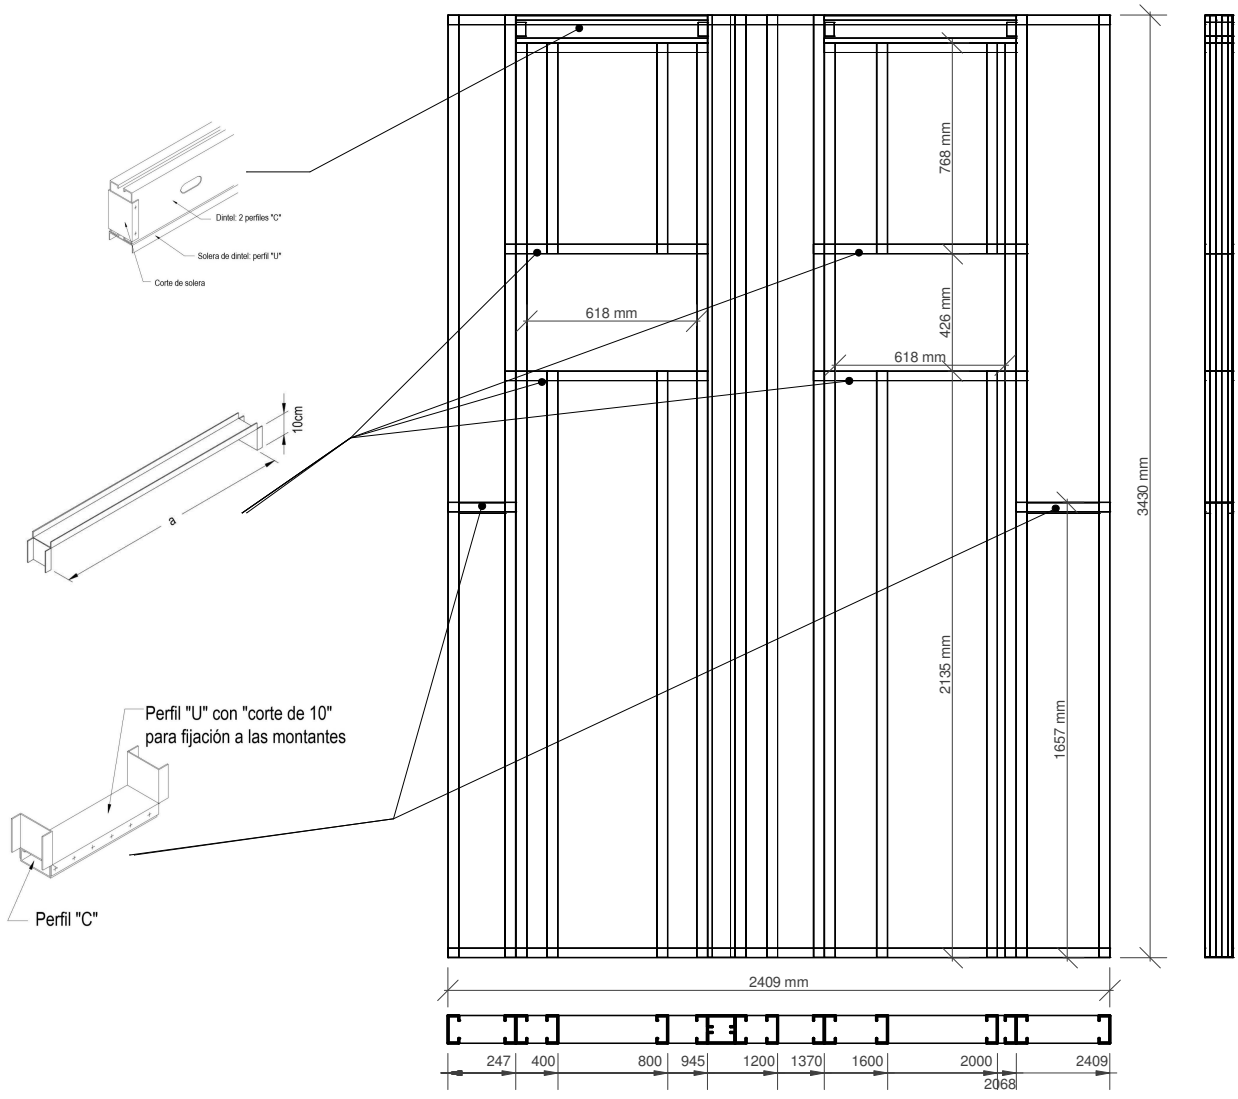

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PEX408

ESCALA 1:25

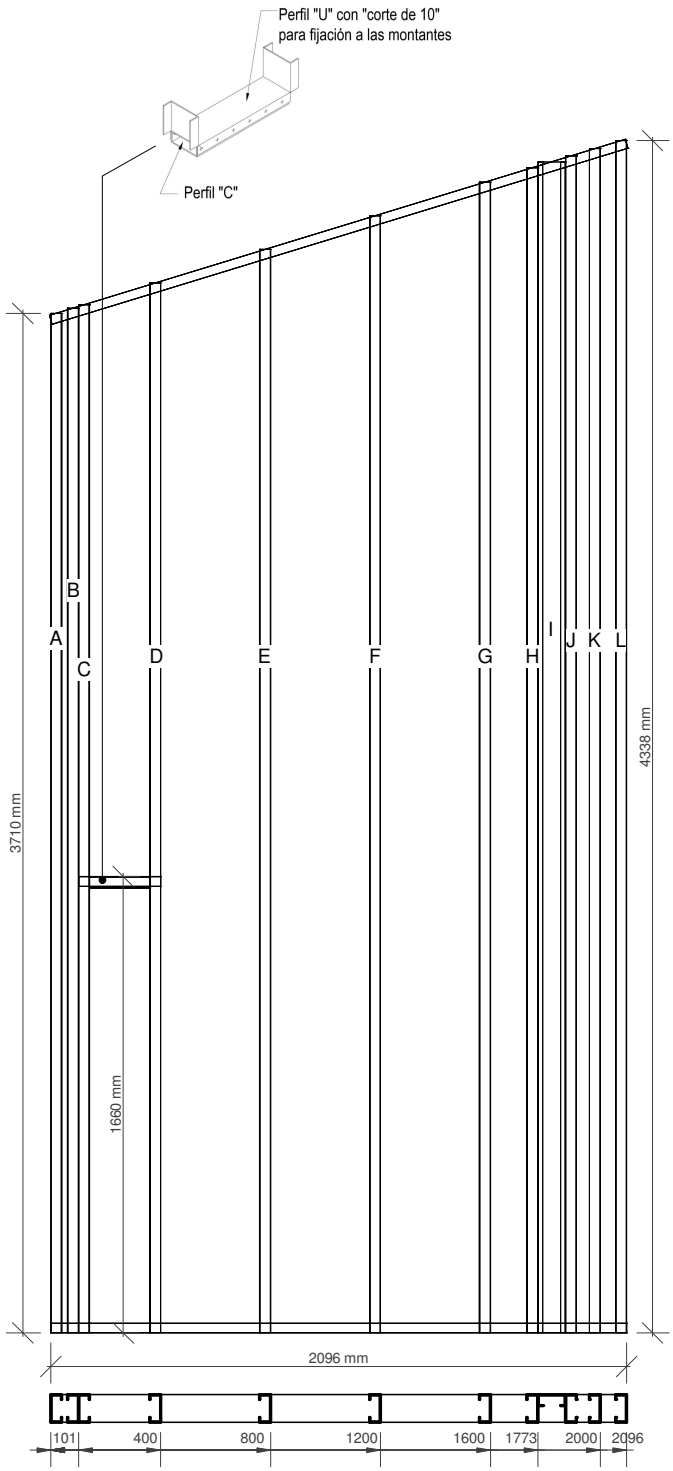

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
1	PGC100X0.90	219 mm
1	PGC100X0.90	3709 mm (A)
1	PGC100X0.90	3728 mm (B)
1	PGC100X0.90	3740 mm (C)
1	PGC100X0.90	3819 mm (D)
1	PGC100X0.90	3941 mm (E)
1	PGC100X0.90	4064 mm (F)
1	PGC100X0.90	4186 mm (G)
1	PGC100X0.90	4239 mm (H)
1	PGC100X0.90	4260 mm (I)
1	PGC100X0.90	4282 mm (J)
1	PGC100X0.90	4308 mm (K)
1	PGC100X0.90	4337 mm (L)
1	PGU 100x0.90	299 mm
1	PGU 100x0.90	2096 mm
1	PGU 100x0.90	2191 mm

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PEX409

ESCALA 1:25

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

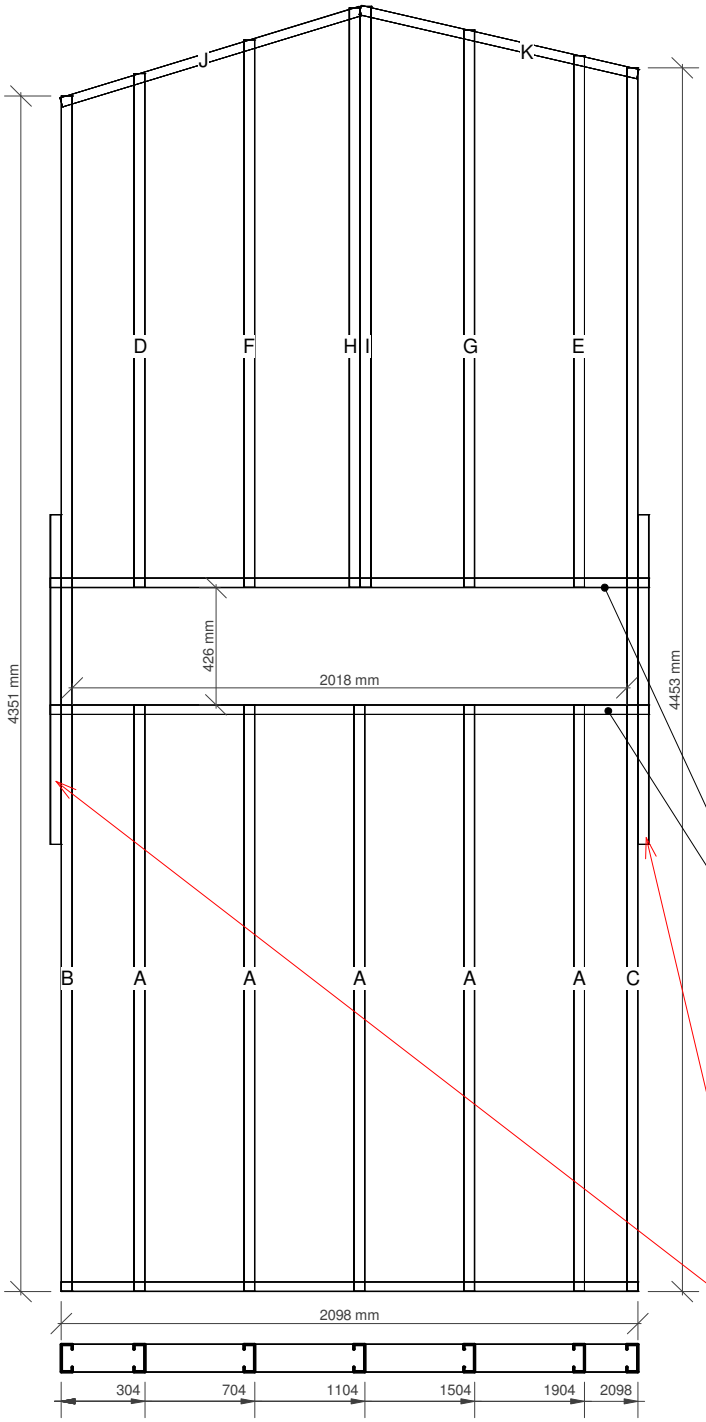

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
2	PGC100X0.90	1200 mm
1	PGC100X0.90	1870 mm (D)
1	PGC100X0.90	1936 mm (E)
1	PGC100X0.90	1992 mm (F)
1	PGC100X0.90	2028 mm (G)
1	PGC100X0.90	2109 mm (H)
1	PGC100X0.90	2114 mm (I)
5	PGC100X0.90	2133 mm (A)
1	PGC100X0.90	4350 mm (B)
1	PGC100X0.90	4452 mm (C)
1	PGU 100x0.90	1036 mm (K)
1	PGU 100x0.90	1138 mm (J)
1	PGU 100x0.90	2098 mm
2	PGU 100x0.90	2178 mm



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PEX410

ESCALA 1:25

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

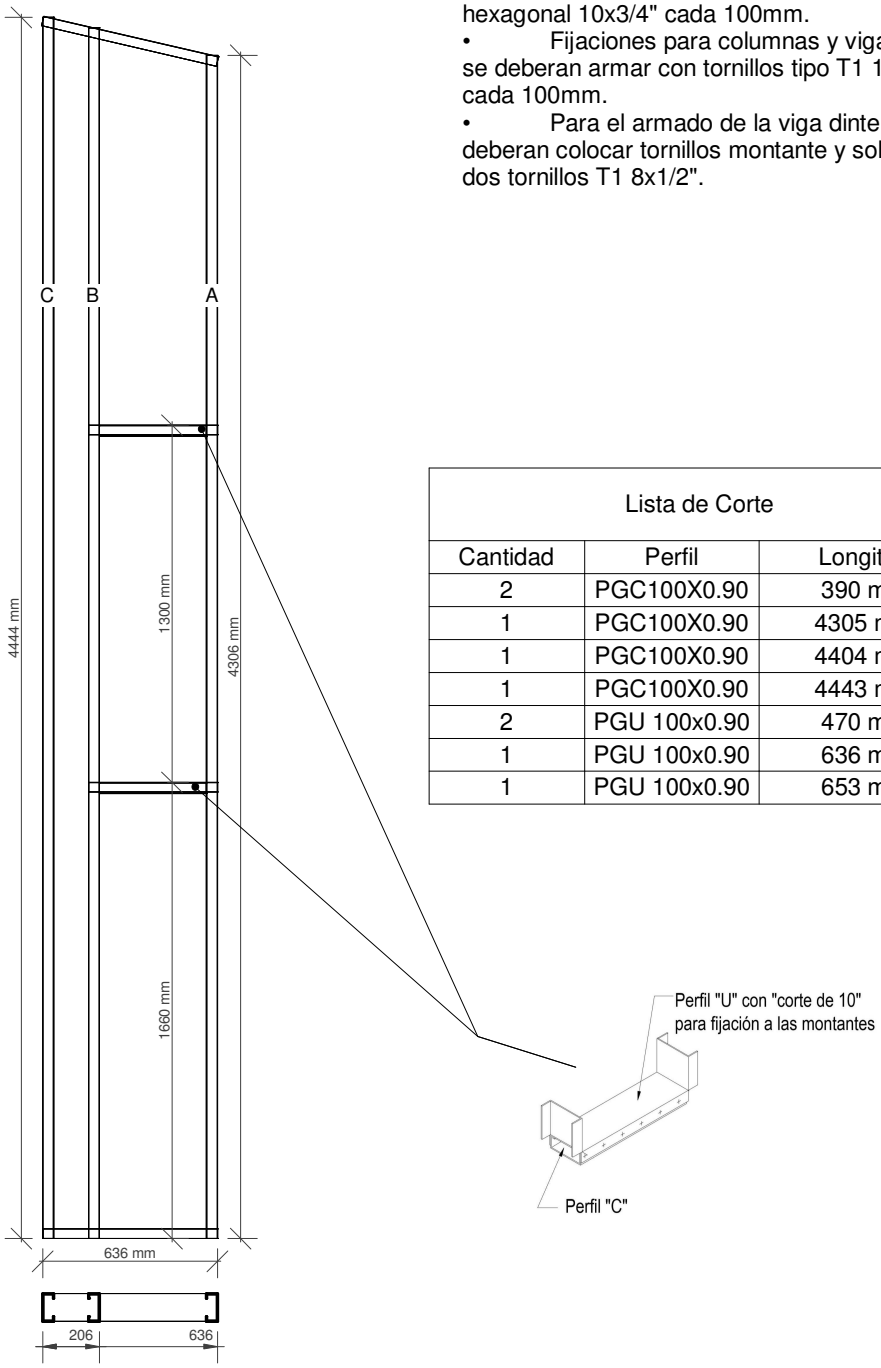

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
2	PGC100X0.90	390 mm
1	PGC100X0.90	4305 mm (A)
1	PGC100X0.90	4404 mm (B)
1	PGC100X0.90	4443 mm (C)
2	PGU 100x0.90	470 mm
1	PGU 100x0.90	636 mm
1	PGU 100x0.90	653 mm

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PEX411

ESCALA 1:25

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

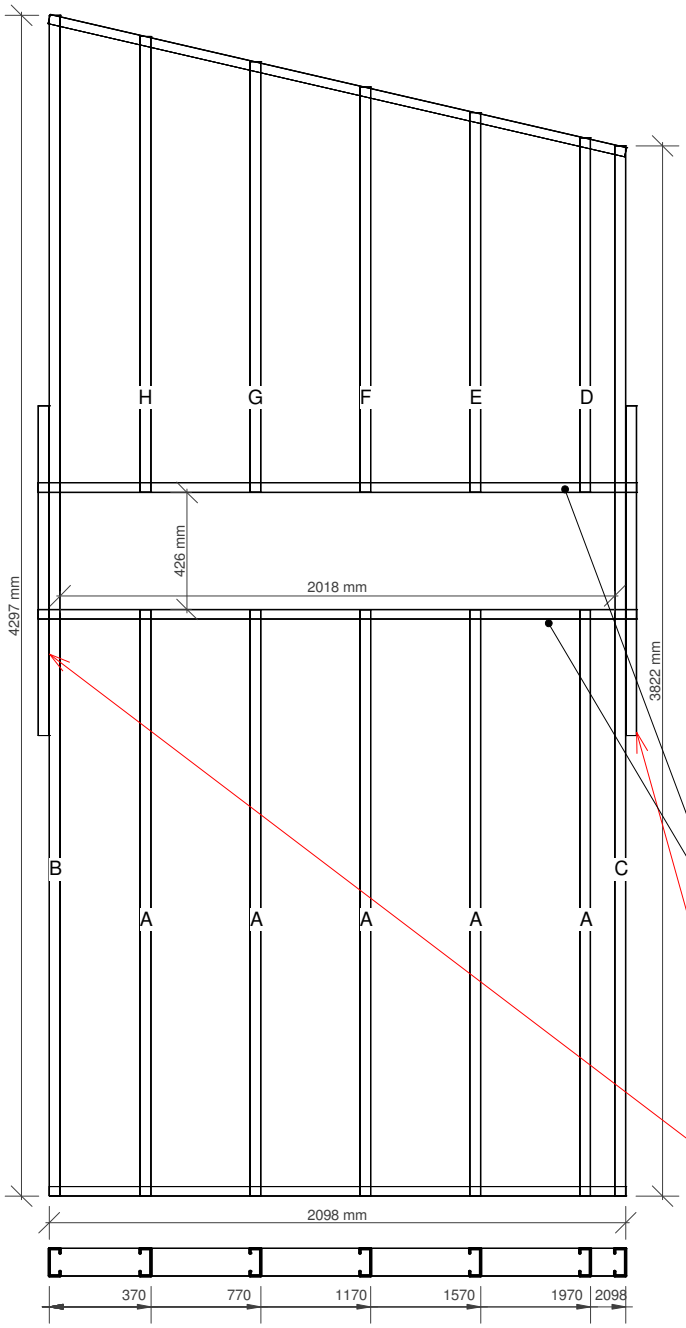



Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
2	PGC100X0.90	1200 mm
1	PGC100X0.90	1289 mm (D)
1	PGC100X0.90	1382 mm (E)
1	PGC100X0.90	1474 mm (F)
1	PGC100X0.90	1566 mm (G)
1	PGC100X0.90	1659 mm (H)
5	PGC100X0.90	2133 mm (A)
1	PGC100X0.90	3821 mm (C)
1	PGC100X0.90	4296 mm (B)
1	PGU 100x0.90	2098 mm
1	PGU 100x0.90	2153 mm
2	PGU 100x0.90	2178 mm

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PEX412

ESCALA 1:25

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

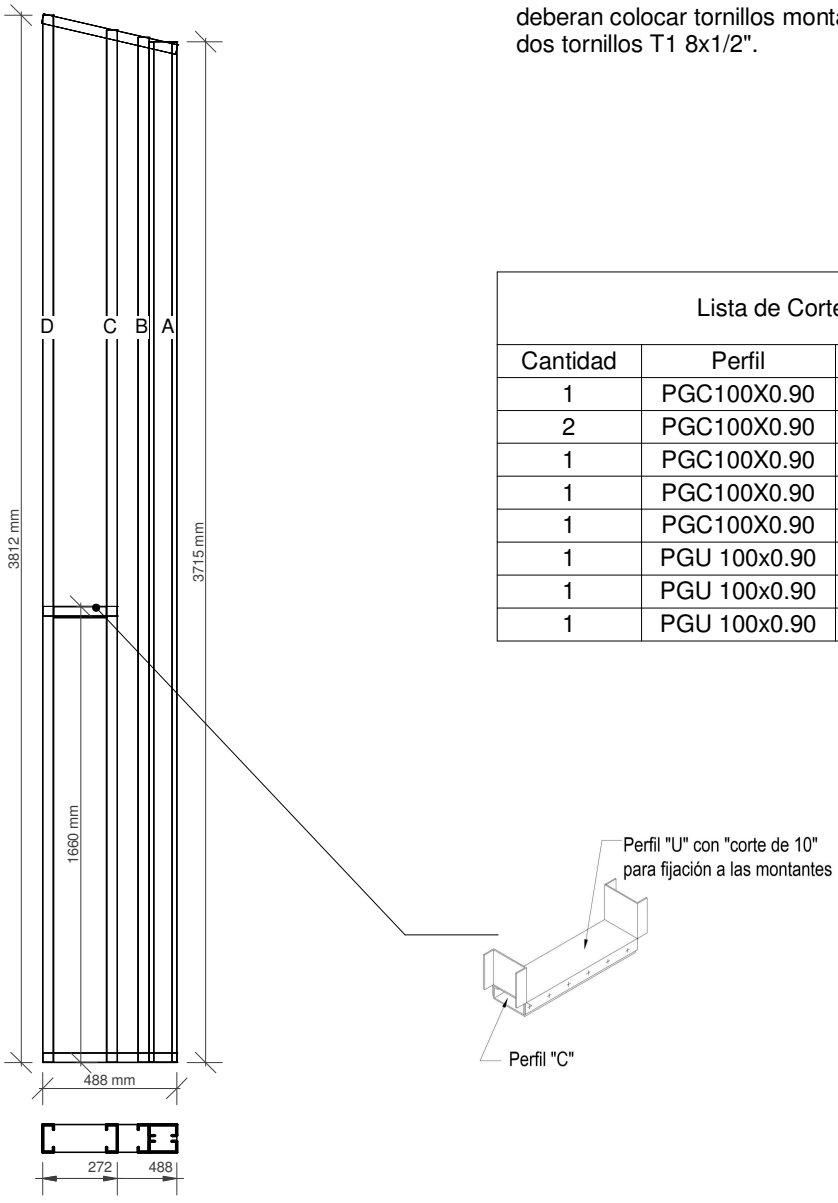

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
1	PGC100X0.90	192 mm
2	PGC100X0.90	3714 mm (A)
1	PGC100X0.90	3730 mm (B)
1	PGC100X0.90	3757 mm (C)
1	PGC100X0.90	3811 mm (D)
1	PGU 100x0.90	272 mm
1	PGU 100x0.90	488 mm
1	PGU 100x0.90	501 mm

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PEX413

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
4	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGU 100x0.90	1020 mm

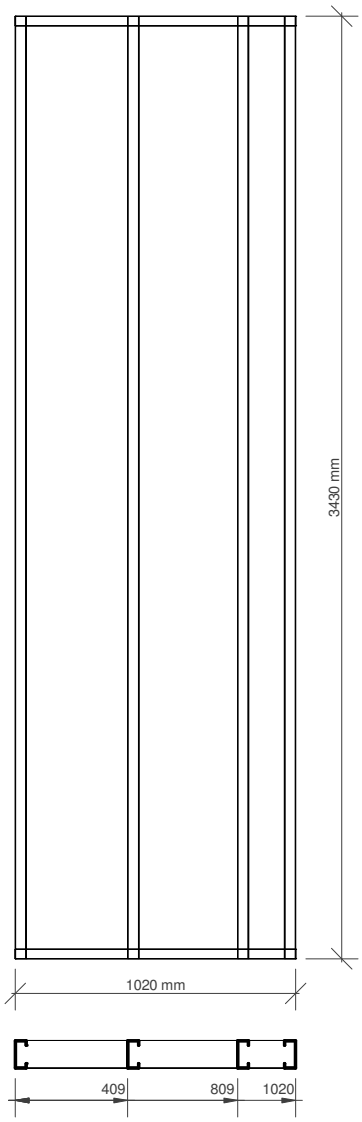

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PIN 101

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
3	PGC100X0.90	1605 mm
4	PGC100X0.90	3277 mm
2	PGC150x1.60	1370 mm
1	PGU 100x0.90	93 mm
1	PGU 100x0.90	100 mm
3	PGU 100x0.90	1370 mm
1	PGU 100x0.90	1371 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

Esta tapa se colocara en panel adyacente en etapa de montaje

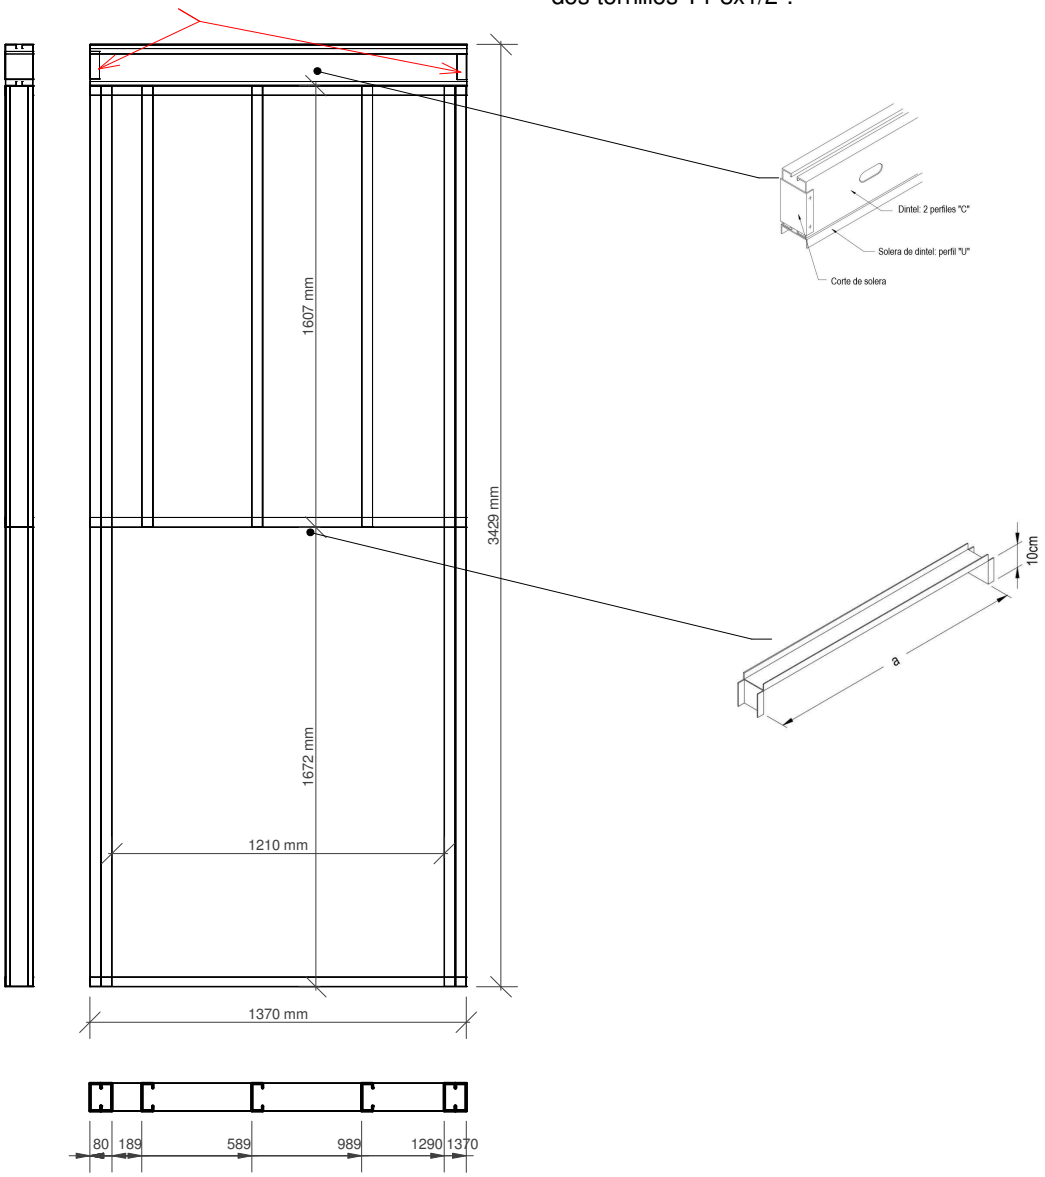

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PIN 102

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
3	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGU 100x0.90	819 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

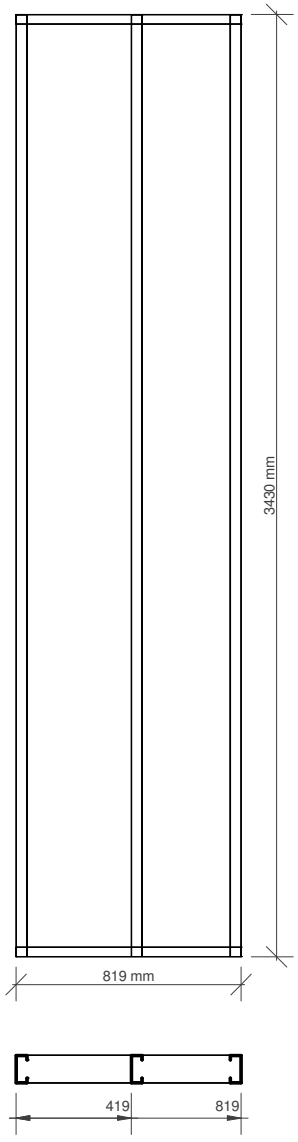

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PIN 103

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
3	PGC100X0.90	1605 mm
4	PGC100X0.90	3277 mm
5	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGC150x1.60	1370 mm
1	PGU 100x0.90	100 mm
1	PGU 100x0.90	103 mm
2	PGU 100x0.90	1370 mm
2	PGU 100x0.90	1692 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

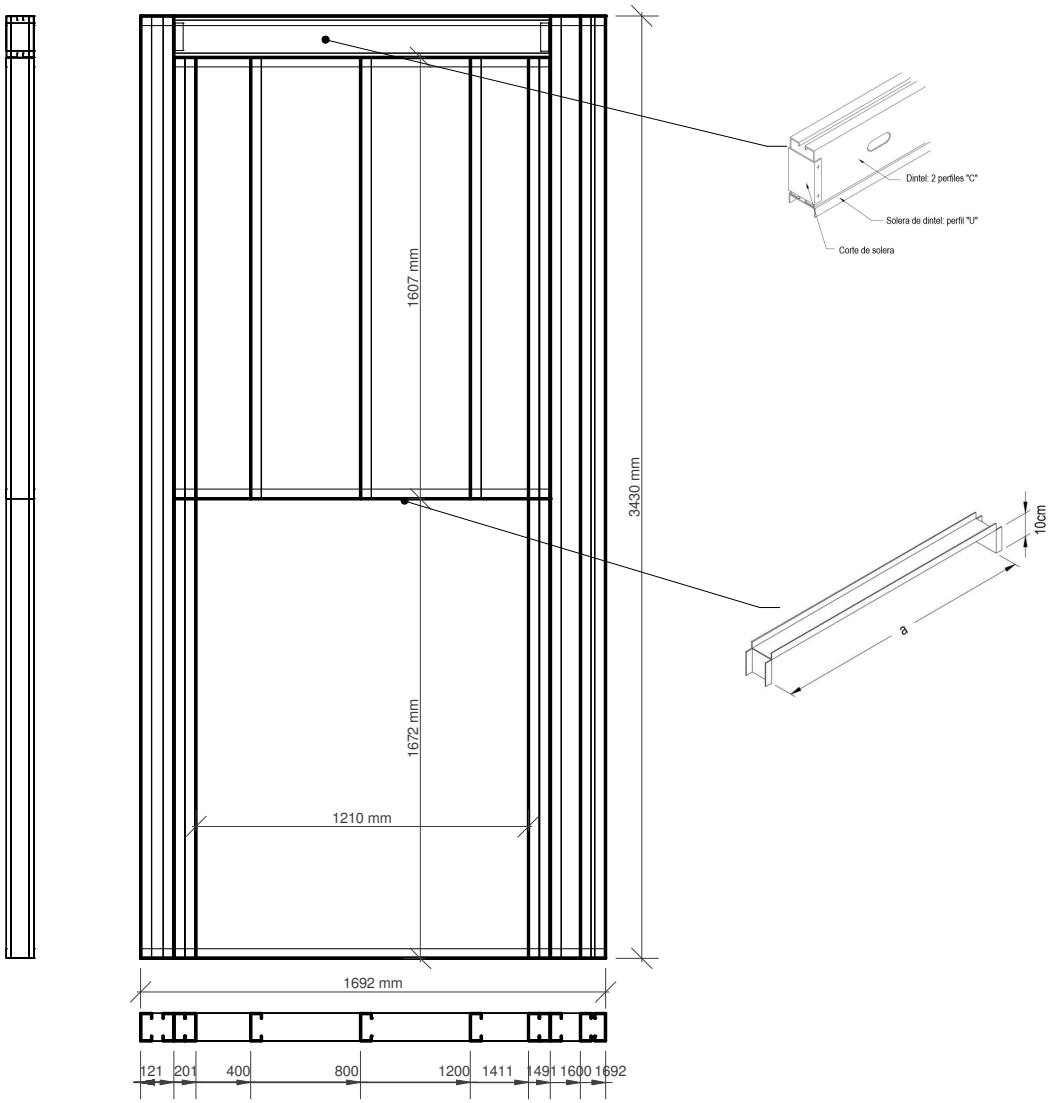

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PIN 104

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
4	PGC100X0.90	716 mm
4	PGC100X0.90	1483 mm
1	PGC100X0.90	3277 mm
5	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGC150x1.60	1558 mm
1	PGU 100x0.90	100 mm
1	PGU 100x0.90	103 mm
1	PGU 100x0.90	1558 mm
2	PGU 100x0.90	1638 mm
2	PGU 100x0.90	1908 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

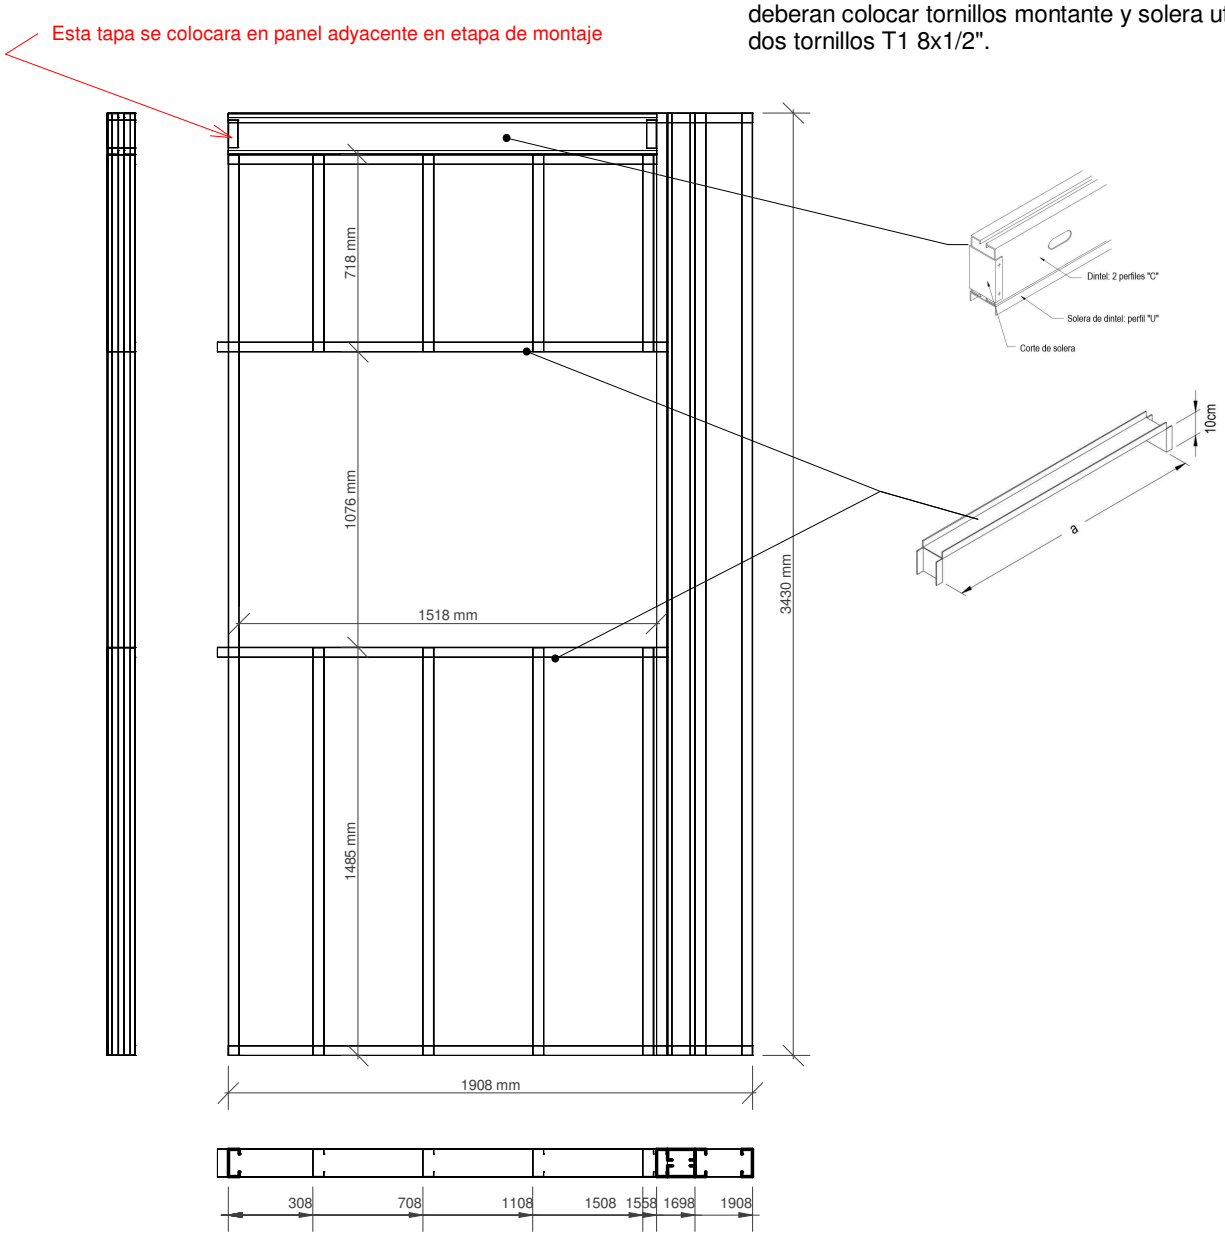

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PIN 105

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
4	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGU 100x0.90	1189 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

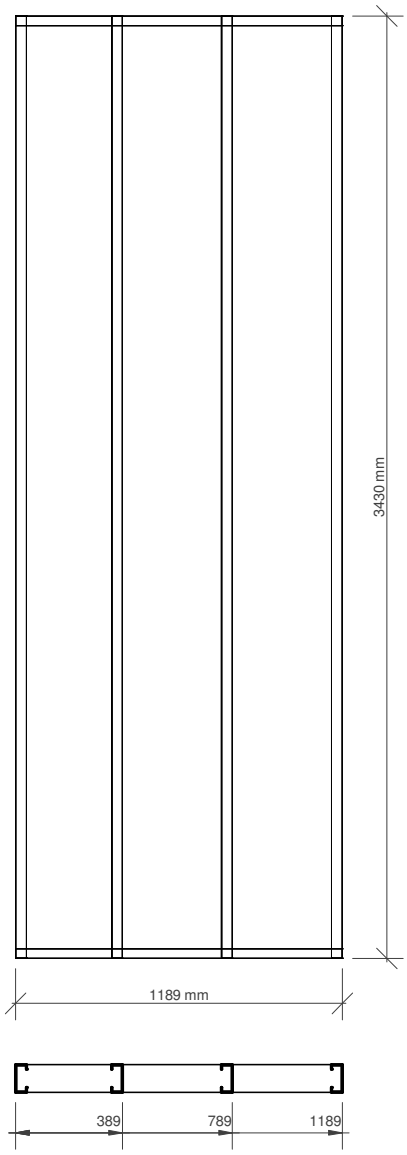

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PIN 106

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
2	PGC100X0.90	1198 mm
3	PGC100X0.90	1216 mm
2	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGU 100x0.90	50 mm
1	PGU 100x0.90	1198 mm
3	PGU 100x0.90	1278 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

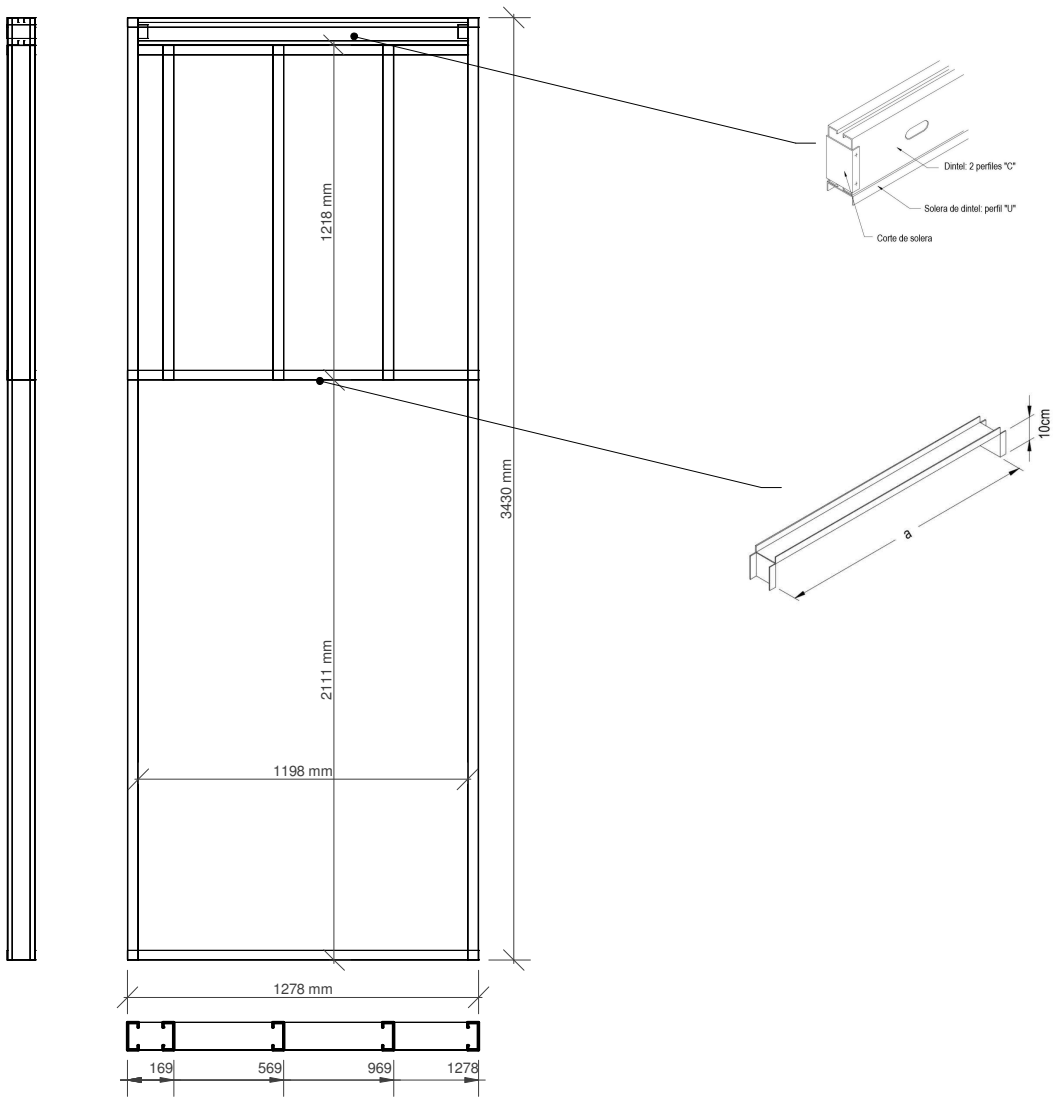

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PIN 107

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
3	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGU 100x0.90	401 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PIN 108

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
6	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGU 100x0.90	502 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".





GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PIN 109

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
5	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGU 100x0.90	1278 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

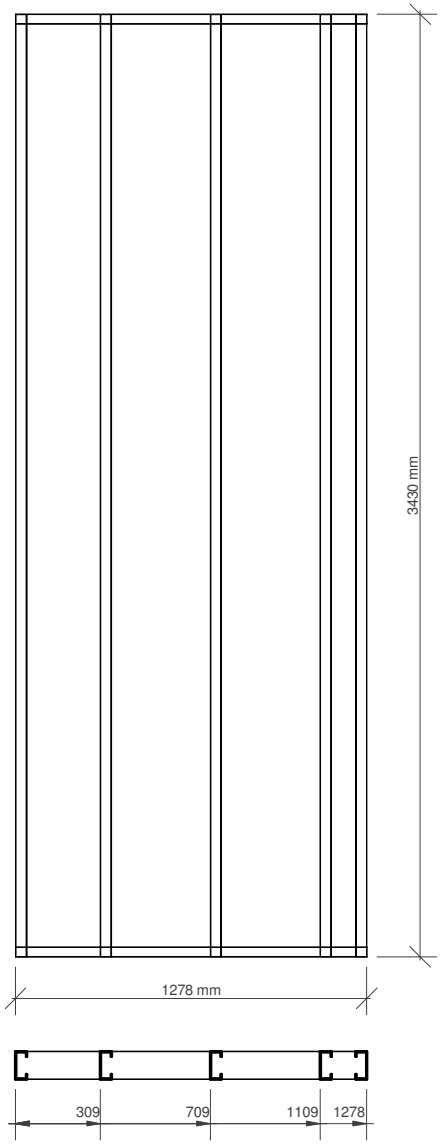

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PIN 110

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
3	PGC100X0.90	1216 mm
2	PGC100X0.90	1399 mm
2	PGC100X0.90	3327 mm
2	PGU 100x0.90	50 mm
4	PGU 100x0.90	1399 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

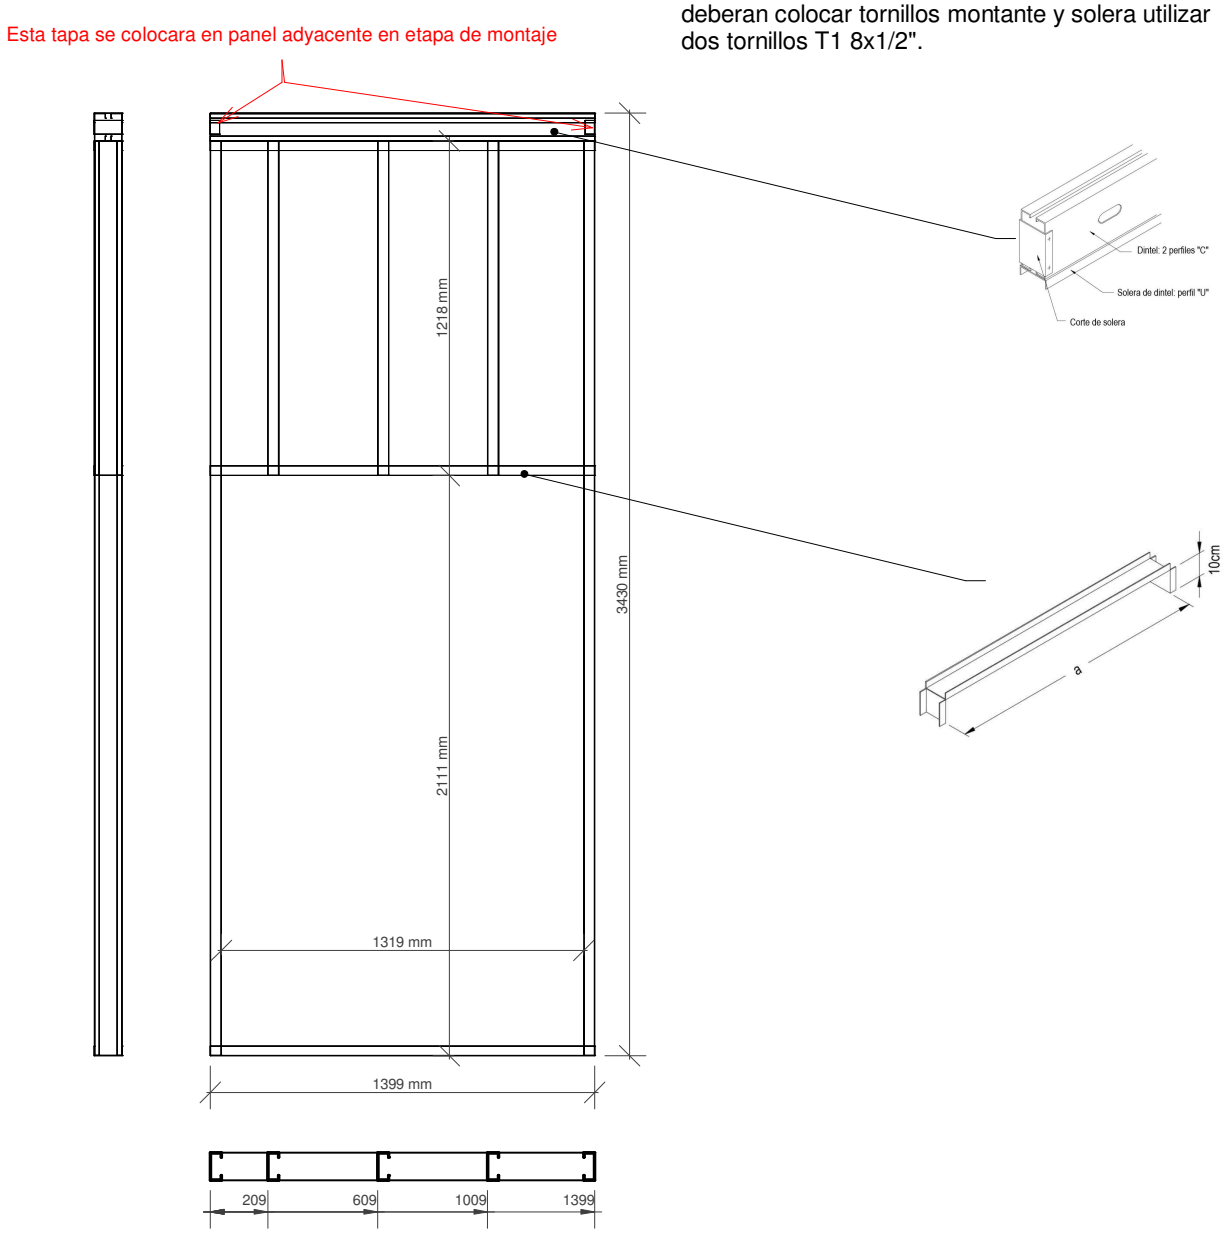

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PIN 111

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
3	PGC100X0.90	1033 mm
1	PGC100X0.90	1078 mm
5	PGC100X0.90	1317 mm
7	PGC100X0.90	3428 mm
1	PGU 100x0.90	948 mm
2	PGU 100x0.90	1059 mm
2	PGU 100x0.90	2423 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

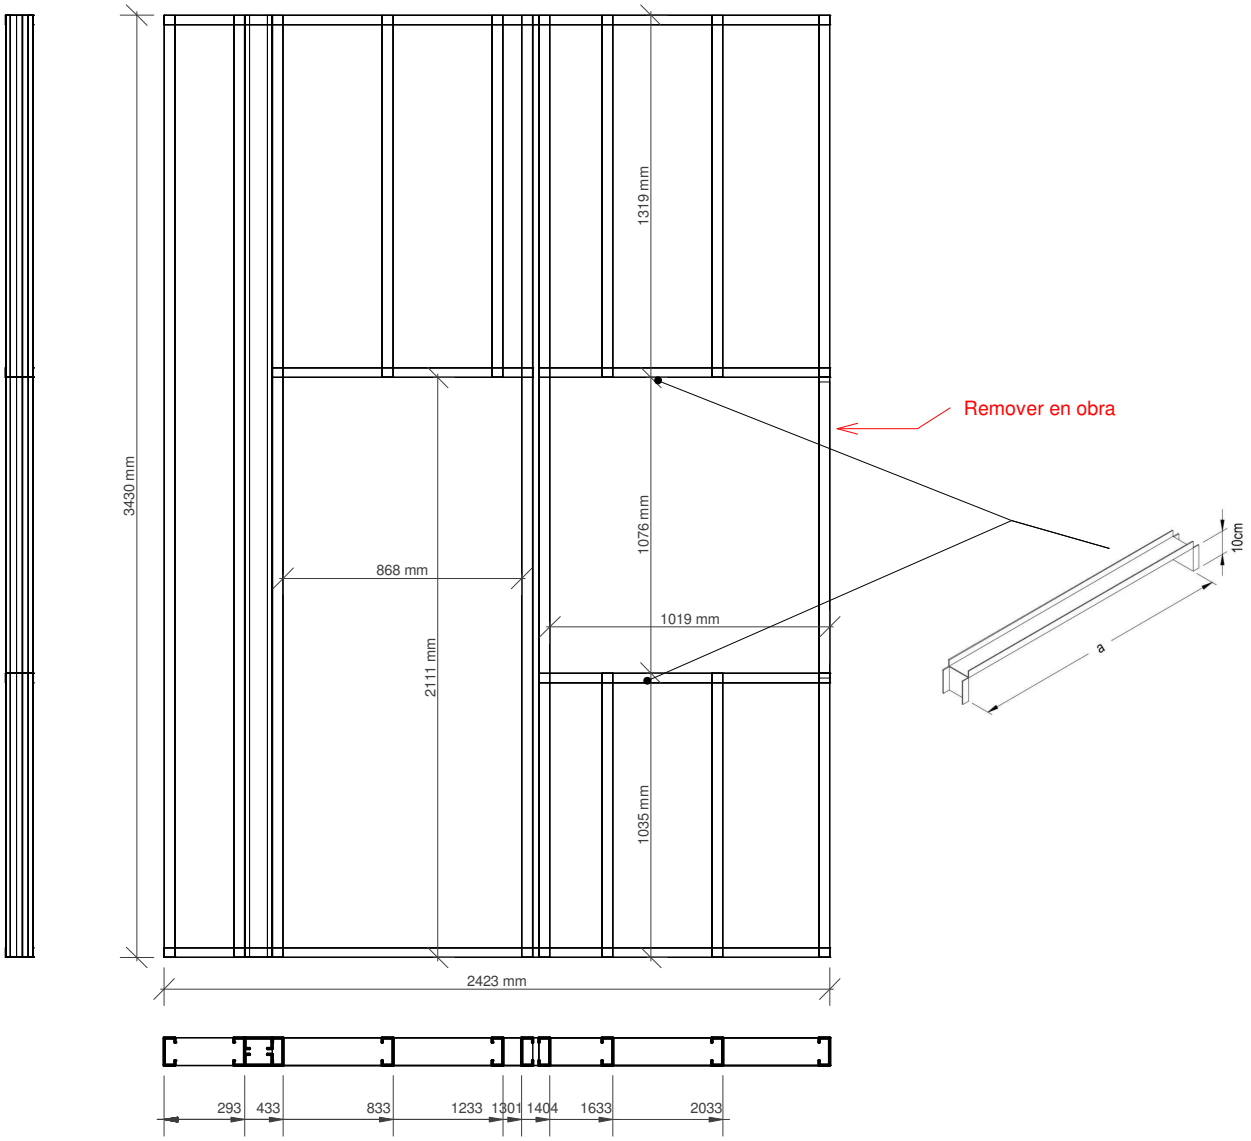

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PIN 112

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
3	PGC100X0.90	1033 mm
1	PGC100X0.90	1078 mm
5	PGC100X0.90	1317 mm
5	PGC100X0.90	3428 mm
1	PGU 100x0.90	948 mm
2	PGU 100x0.90	1059 mm
2	PGU 100x0.90	2127 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

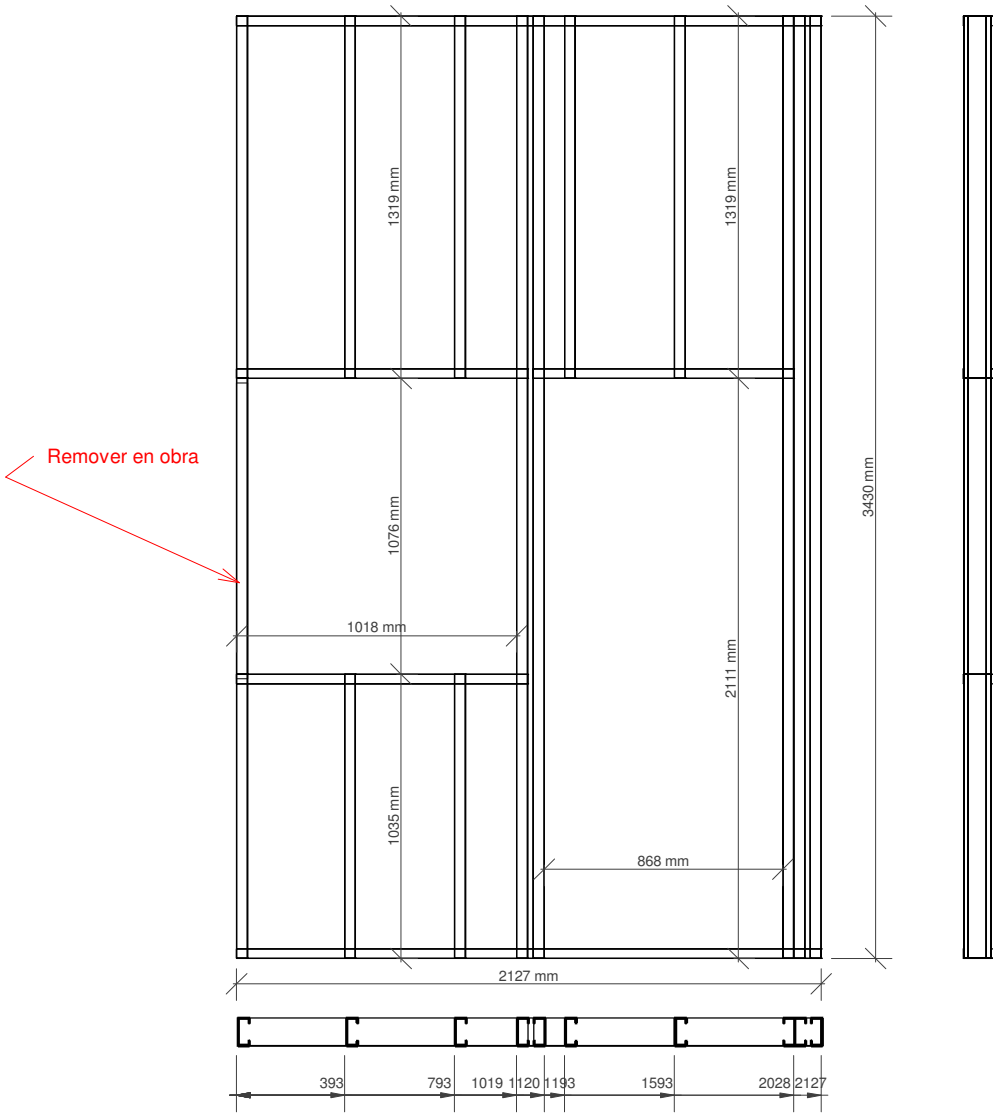

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PIN 113

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
3	PGC100X0.90	1317 mm
6	PGC100X0.90	3428 mm
1	PGU 100x0.90	1298 mm
2	PGU 100x0.90	1865 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

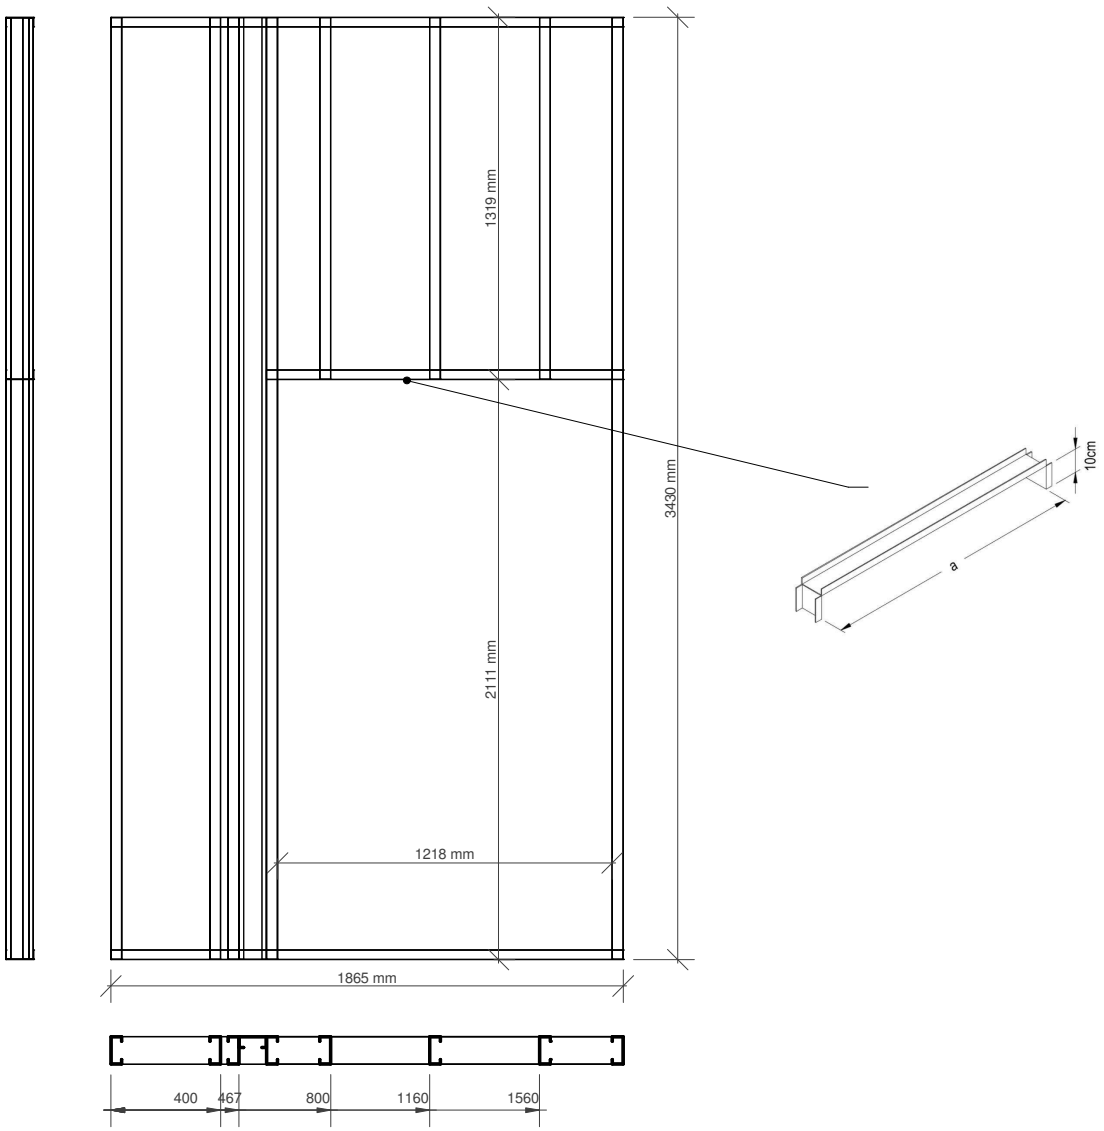

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PIN 114

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
4	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGU 100x0.90	1009 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

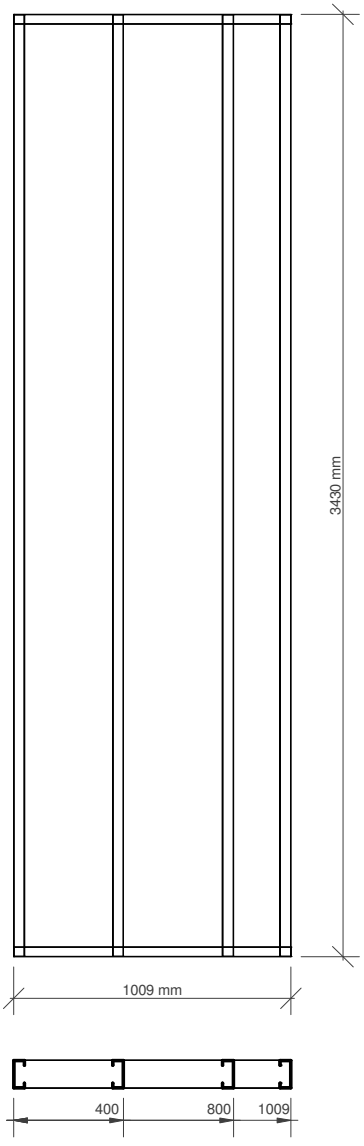

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PIN 115

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
5	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGU 100x0.90	1490 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

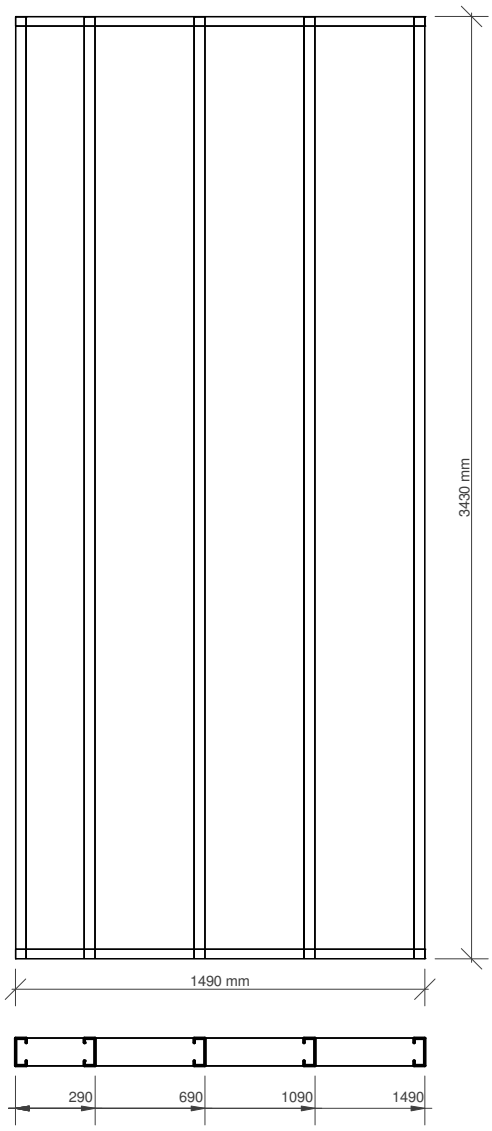

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PIN 116

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
6	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGU 100x0.90	1898 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

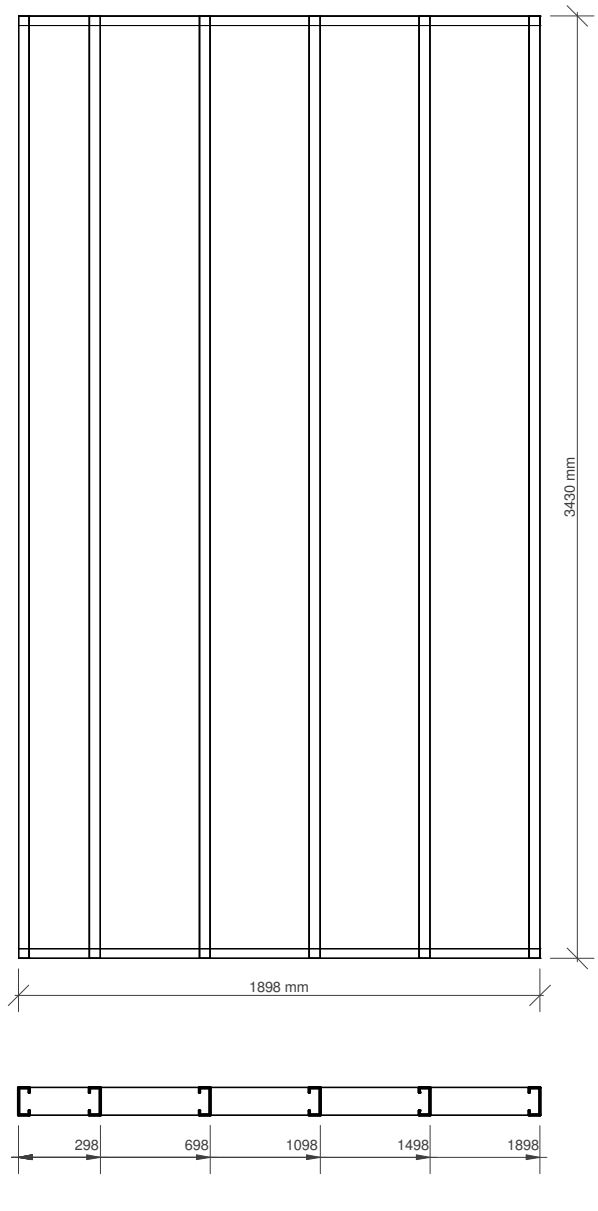

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PIN 117

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
4	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGU 100x0.90	1209 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

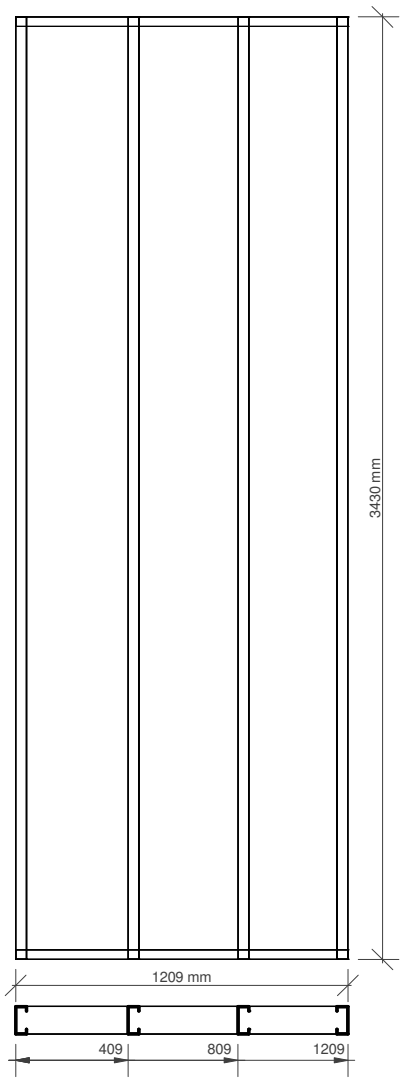

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PIN201

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
5	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGU 100x0.90	1495 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

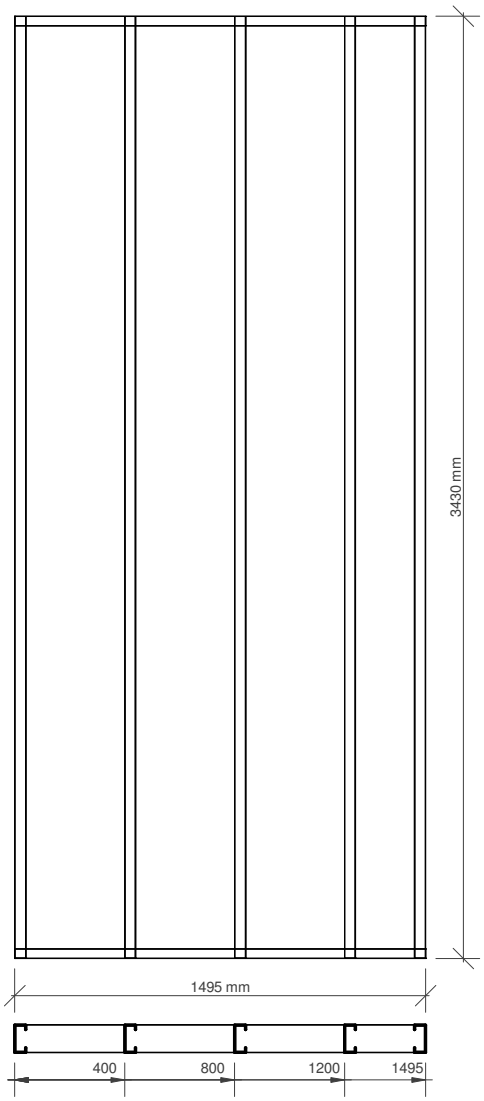

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PIN202

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
4	PGC100X0.90	1083 mm
4	PGC100X0.90	1317 mm
5	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGU 100x0.90	1509 mm
2	PGU 100x0.90	1630 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

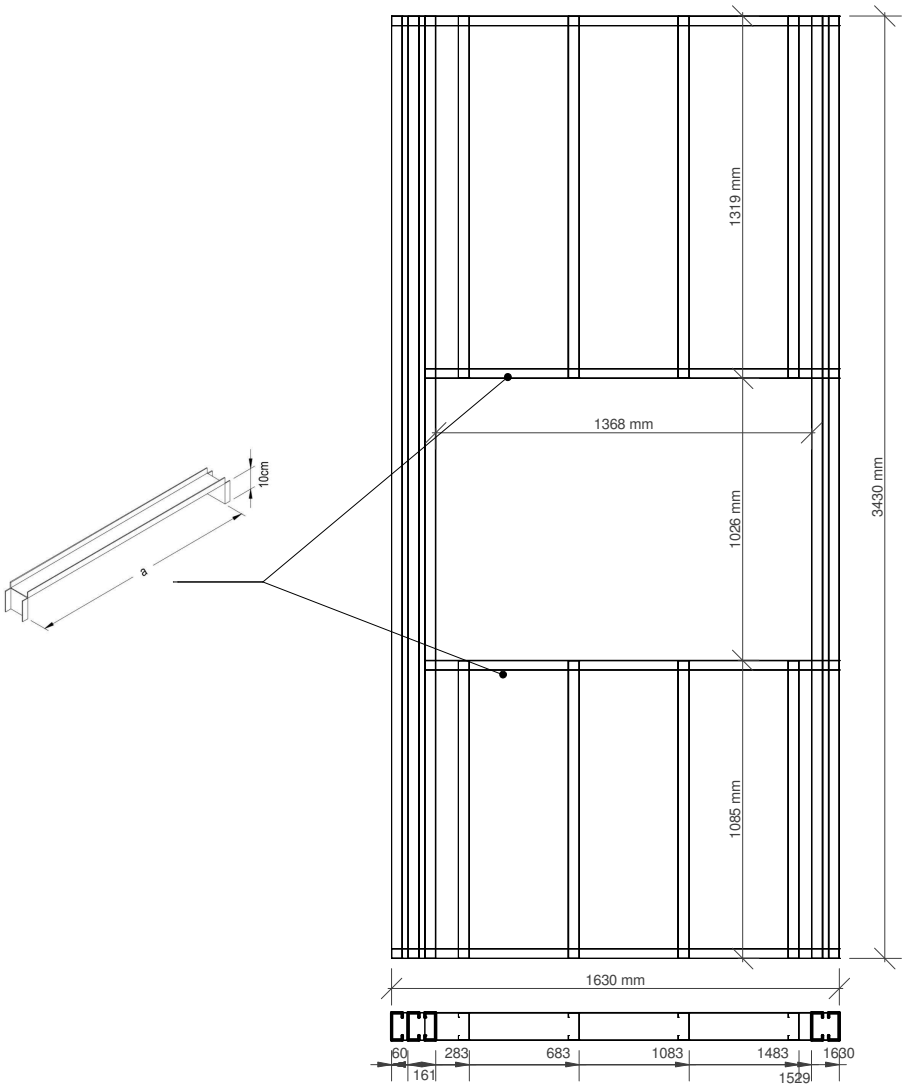

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PIN203

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
2	PGC100X0.90	1166 mm
2	PGC100X0.90	3277 mm
2	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGC150x1.60	1298 mm
2	PGU 100x0.90	100 mm
1	PGU 100x0.90	1298 mm
1	PGU 100x0.90	1338 mm
2	PGU 100x0.90	1603 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

Esta tapa se colocara en panel adyacente en etapa de montaje

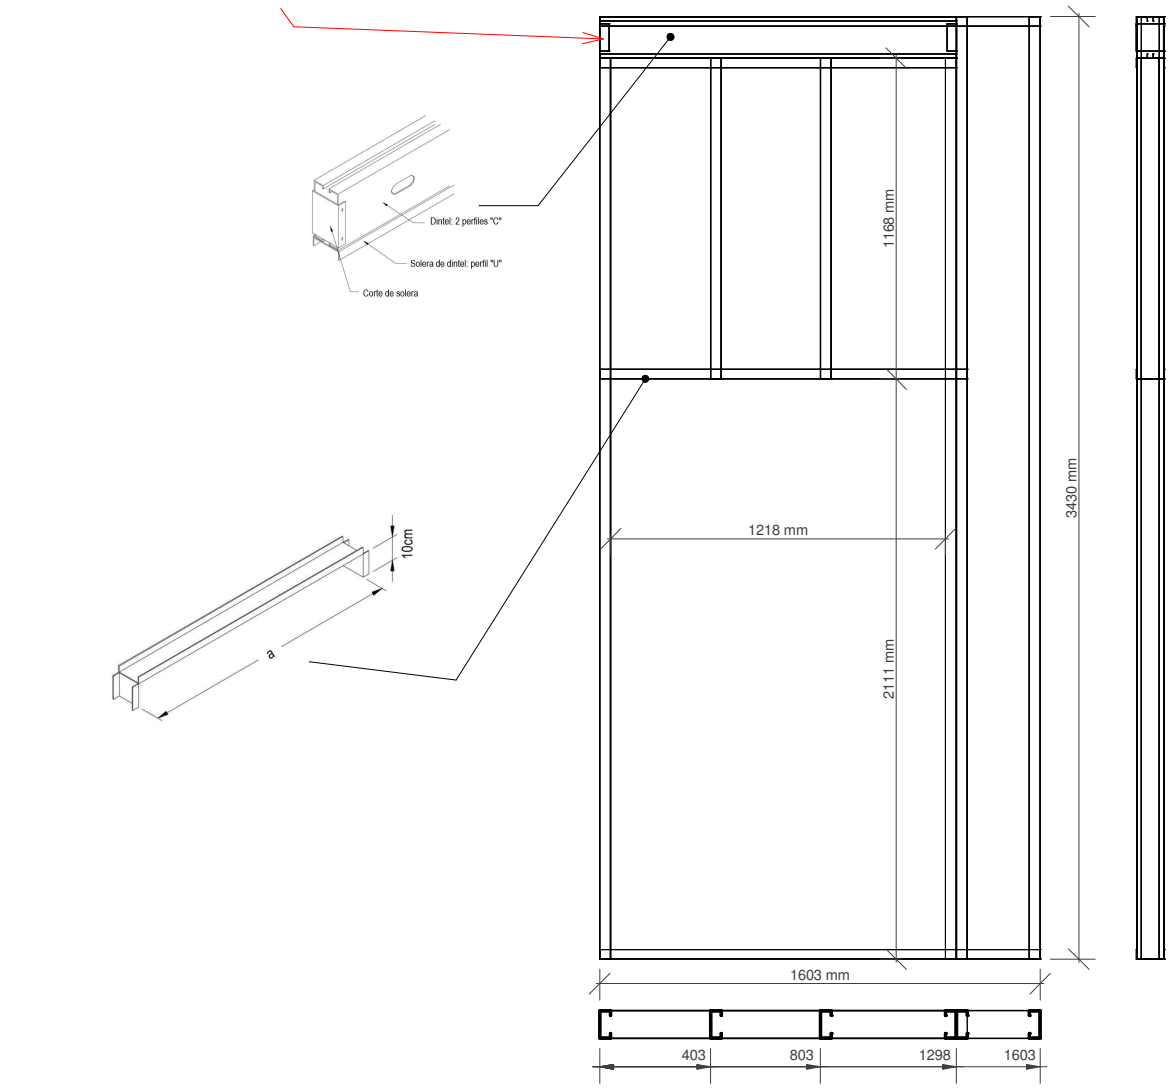

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PIN204

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
7	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGU 100x0.90	2089 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

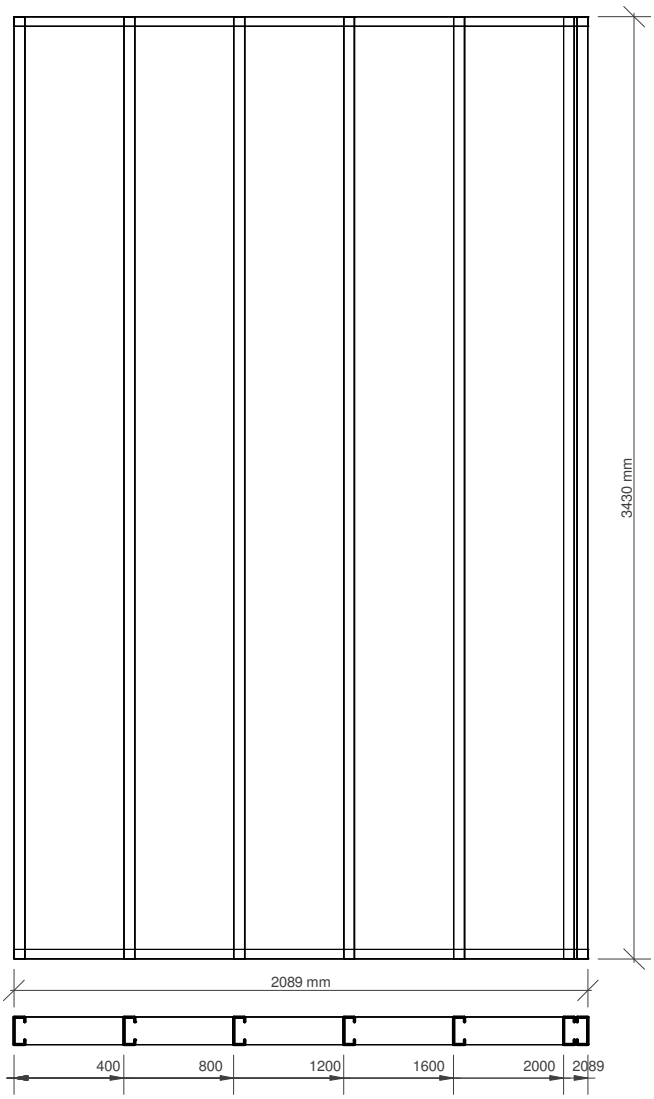

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PIN205

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
2	PGC100X0.90	3276 mm
4	PGC100X0.90	3428 mm
1	PGU 100x0.90	100 mm
1	PGU 100x0.90	718 mm
1	PGU 100x0.90	818 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

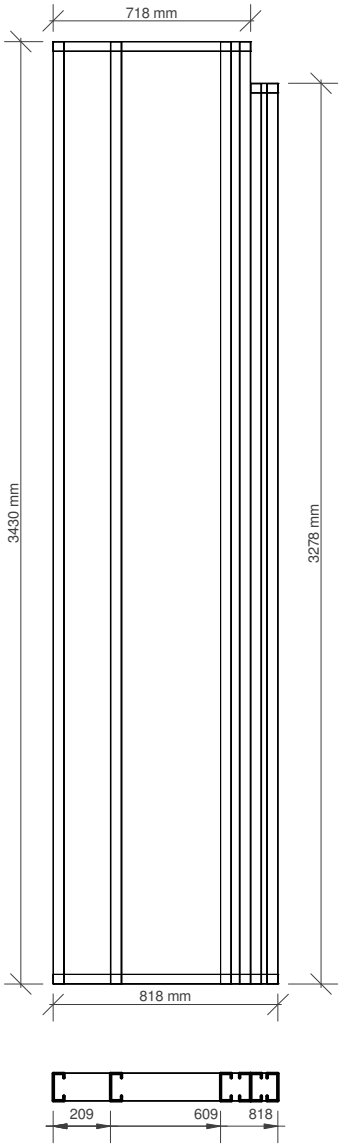

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PIN206

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
7	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGU 100x0.90	2114 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

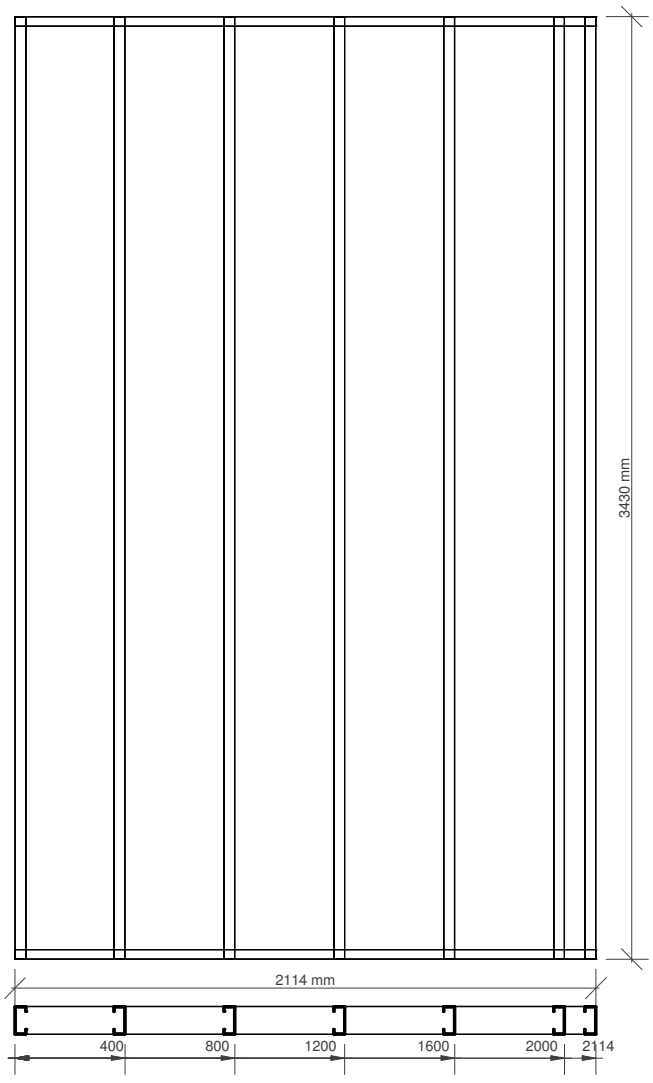

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PIN207

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
13	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGU 100x0.90	2400 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

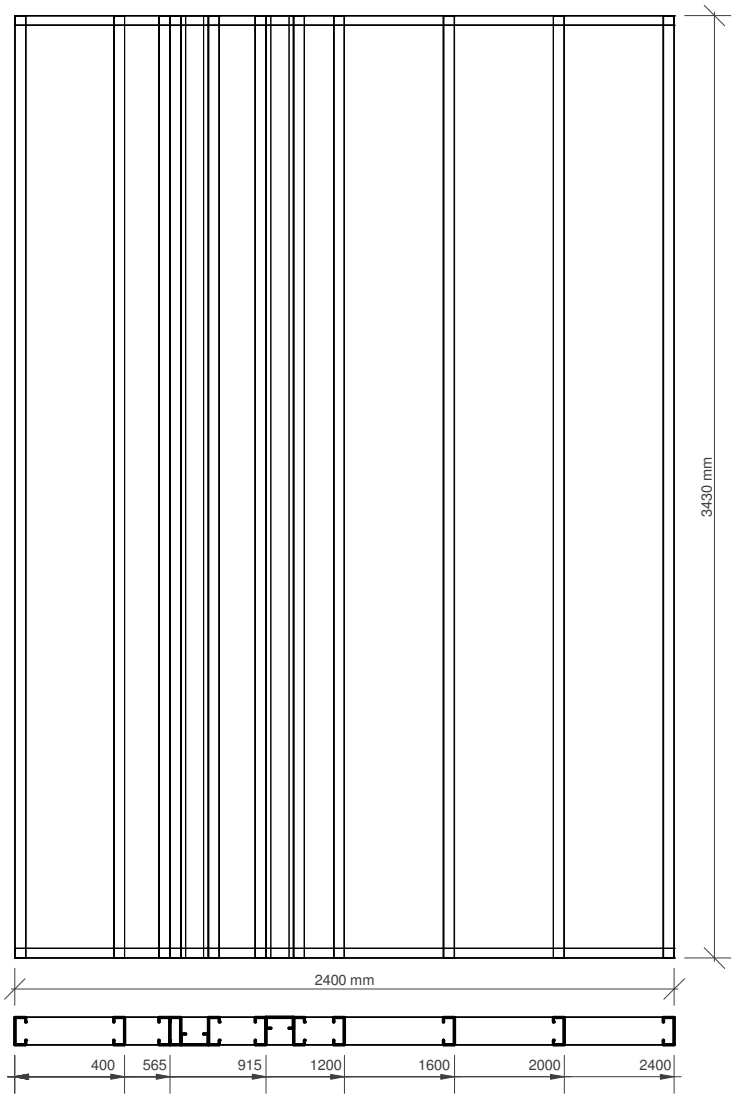

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PIN208

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
14	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGU 100x0.90	2000 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

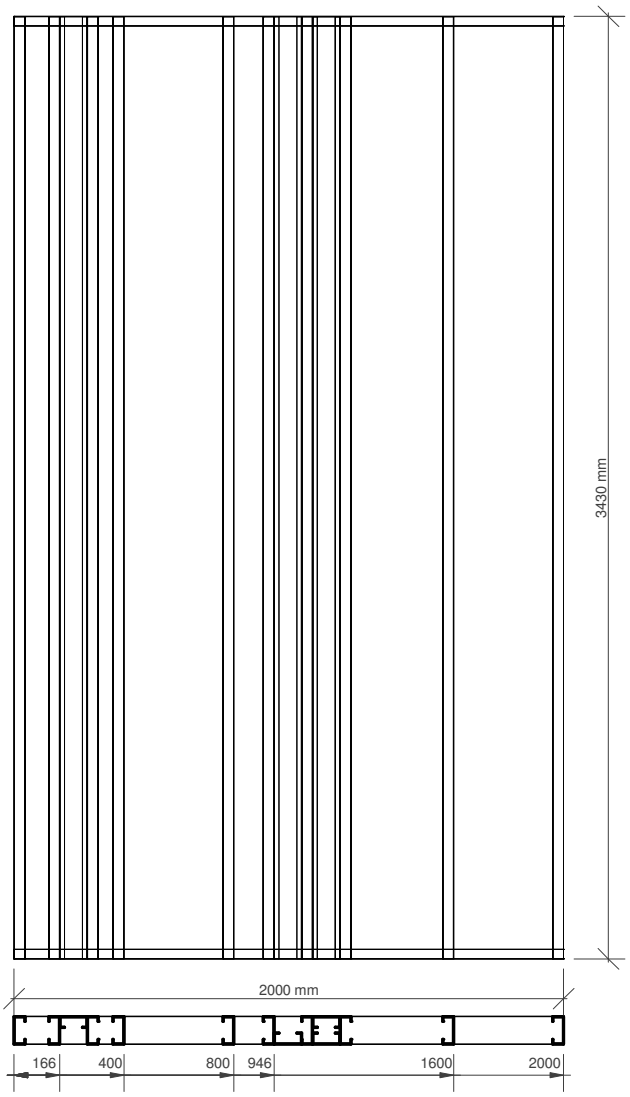

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PIN209

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
3	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGU 100x0.90	698 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

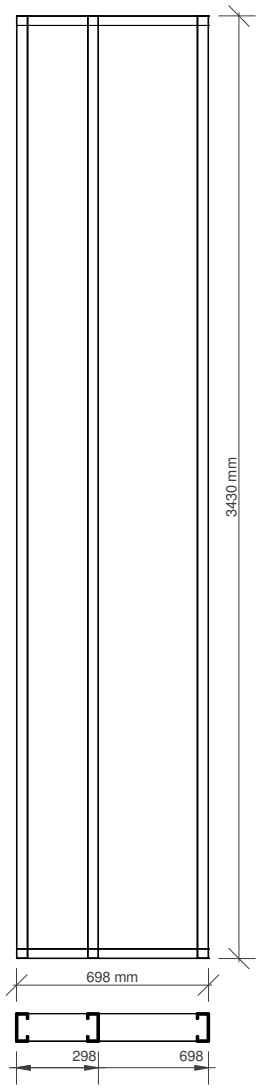

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PIN210

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
2	PGC100X0.90	808 mm
2	PGC100X0.90	1216 mm
1	PGC100X0.90	3327 mm
6	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGU 100x0.90	50 mm
1	PGU 100x0.90	848 mm
1	PGU 100x0.90	950 mm
2	PGU 100x0.90	1639 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

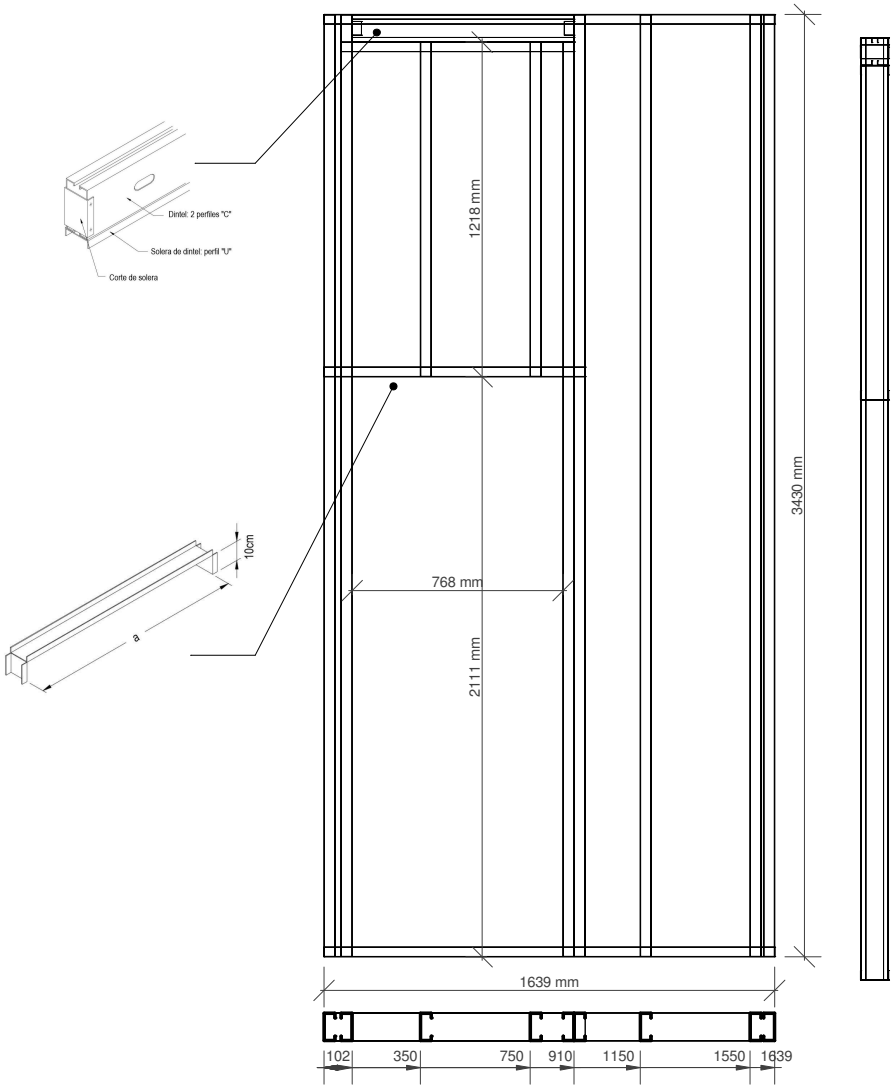

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PIN211

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
6	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGU 100x0.90	1672 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

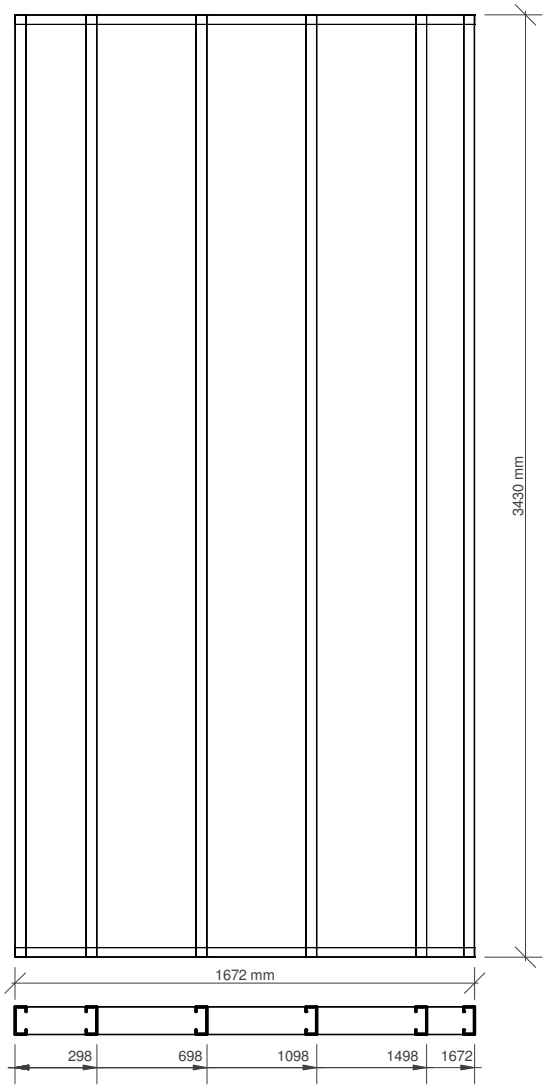

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PIN212

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
4	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGU 100x0.90	1037 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

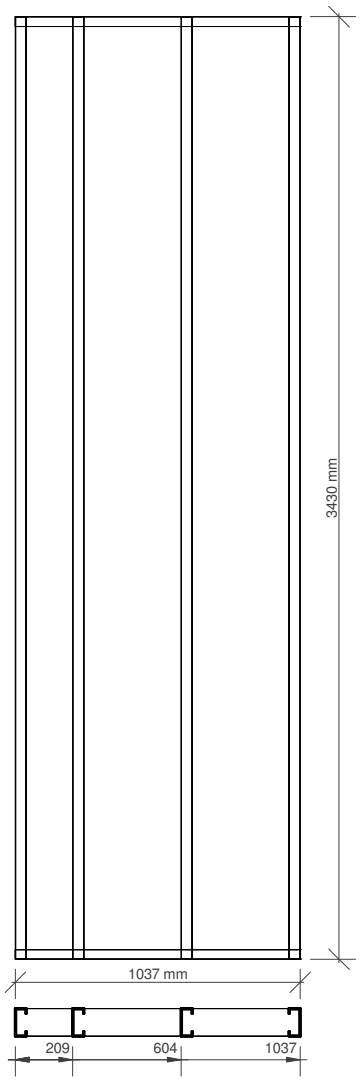

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PIN213

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
2	PGC100X0.90	3276 mm
4	PGC100X0.90	3428 mm
1	PGU 100x0.90	100 mm
1	PGU 100x0.90	718 mm
1	PGU 100x0.90	818 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

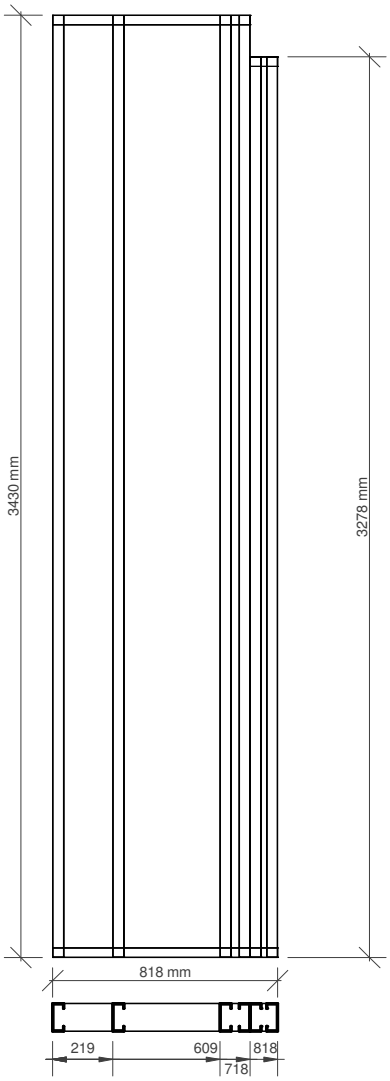

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PIN214

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
2	PGC100X0.90	3276 mm
5	PGC100X0.90	3428 mm
1	PGU 100x0.90	100 mm
1	PGU 100x0.90	1481 mm
1	PGU 100x0.90	1581 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

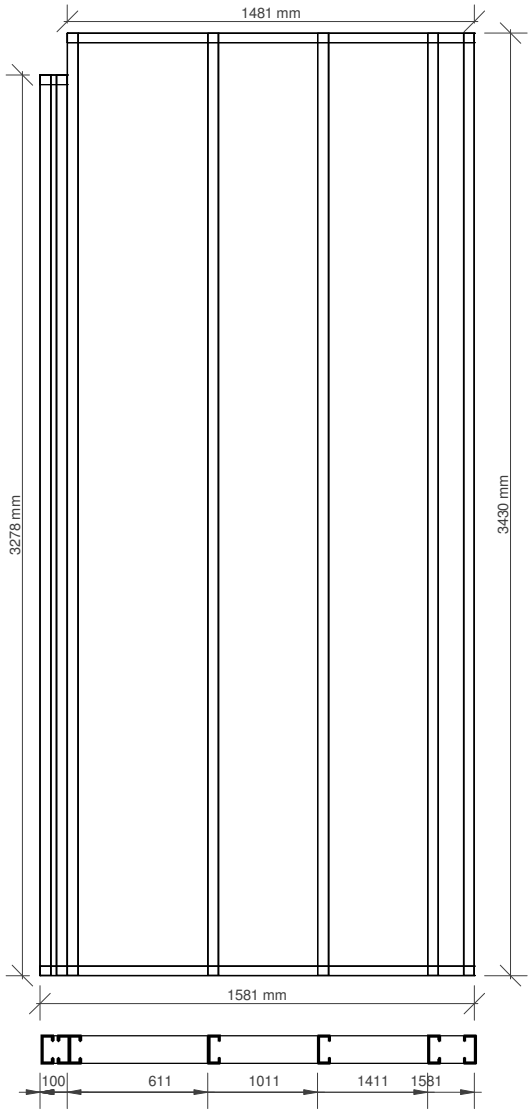

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PIN215

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
2	PGC100X0.90	3276 mm
6	PGC100X0.90	3428 mm
1	PGU 100x0.90	100 mm
1	PGU 100x0.90	1481 mm
1	PGU 100x0.90	1581 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

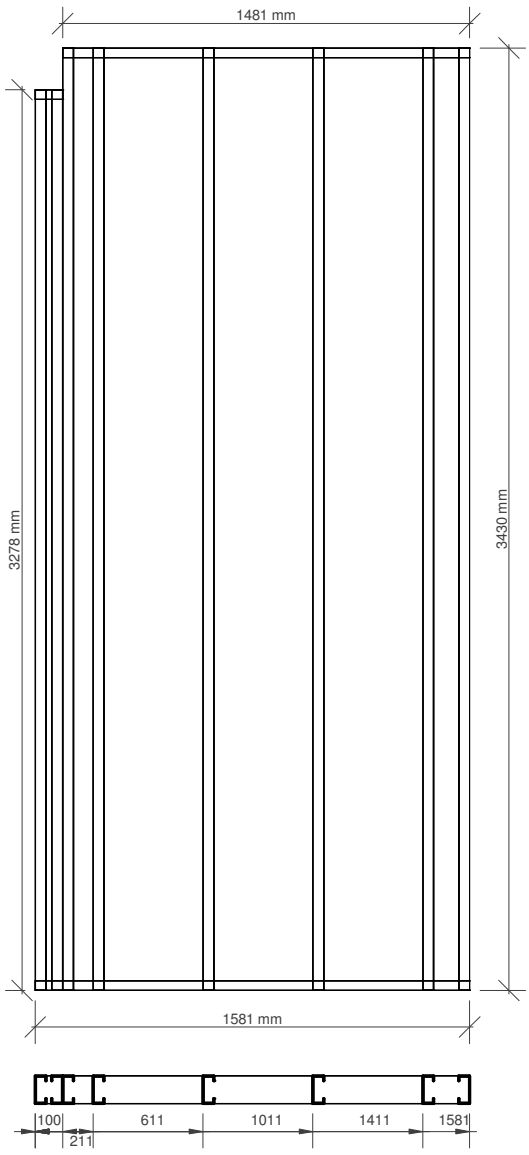

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PIN216

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
6	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGU 100x0.90	1514 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

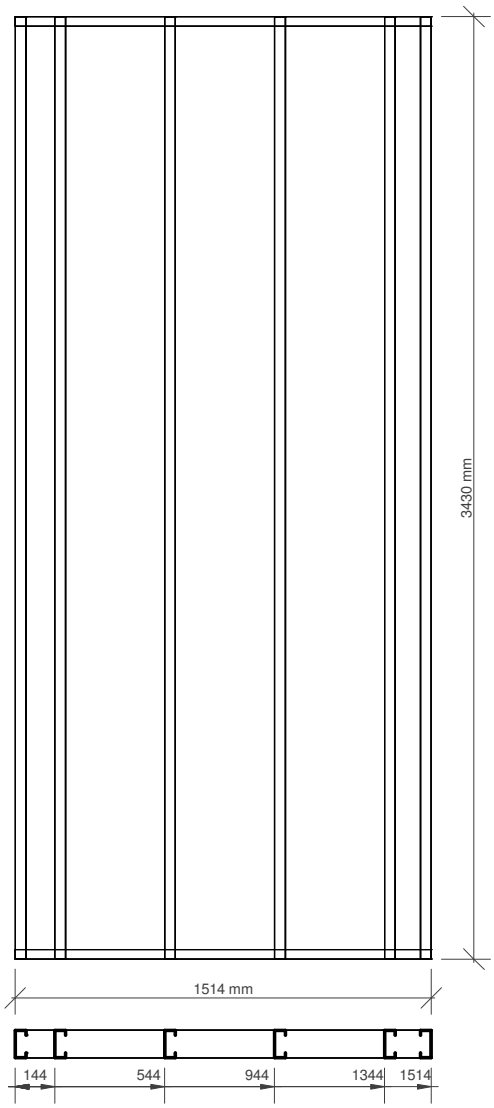

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PIN217

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
6	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGU 100x0.90	1514 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

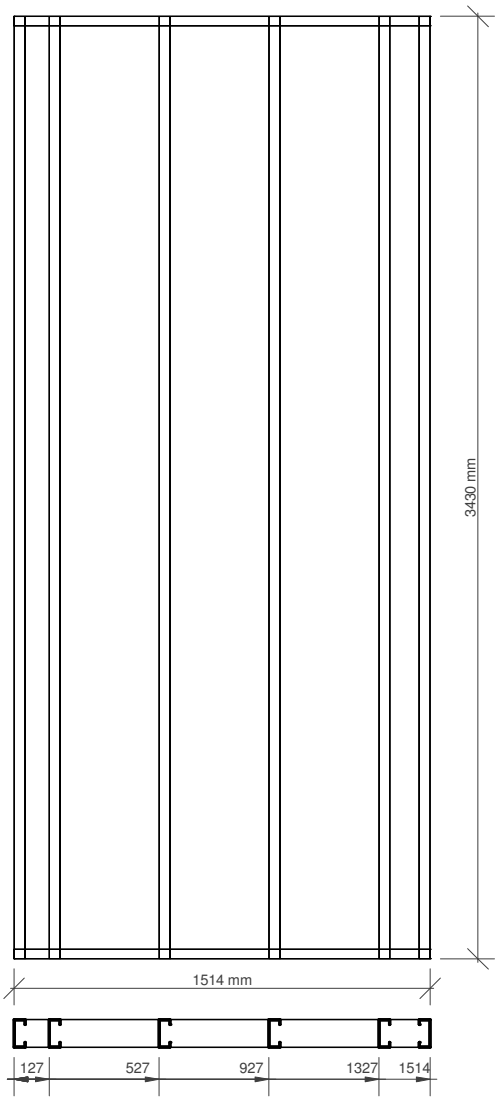

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PIN218

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
11	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGU 100x0.90	2114 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

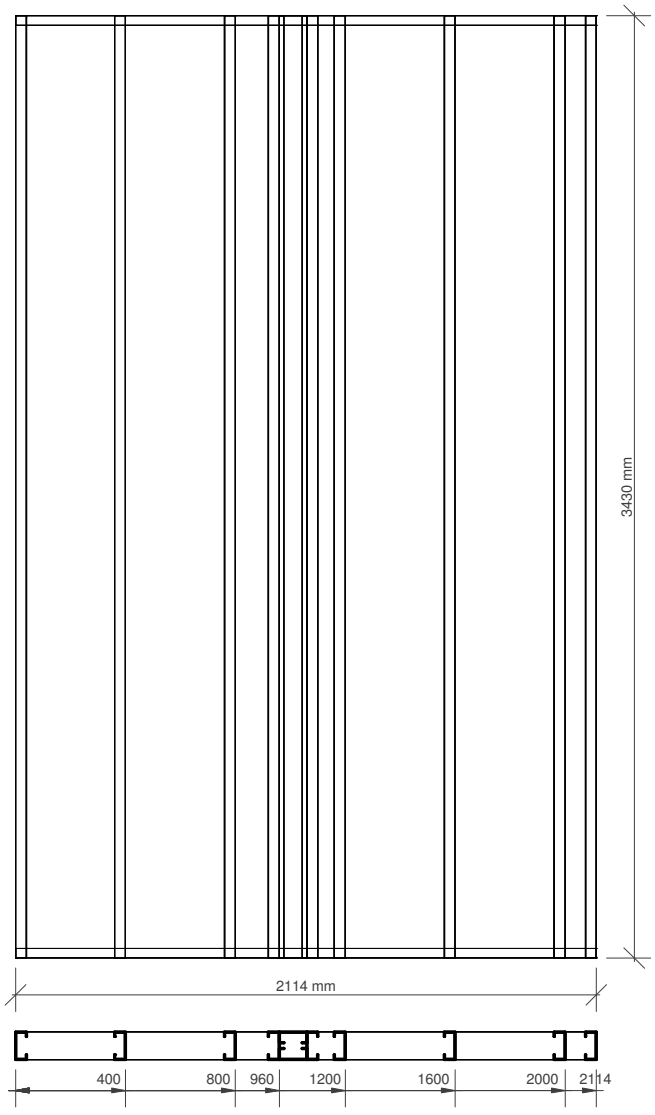

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PIN219

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
10	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGU 100x0.90	2400 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

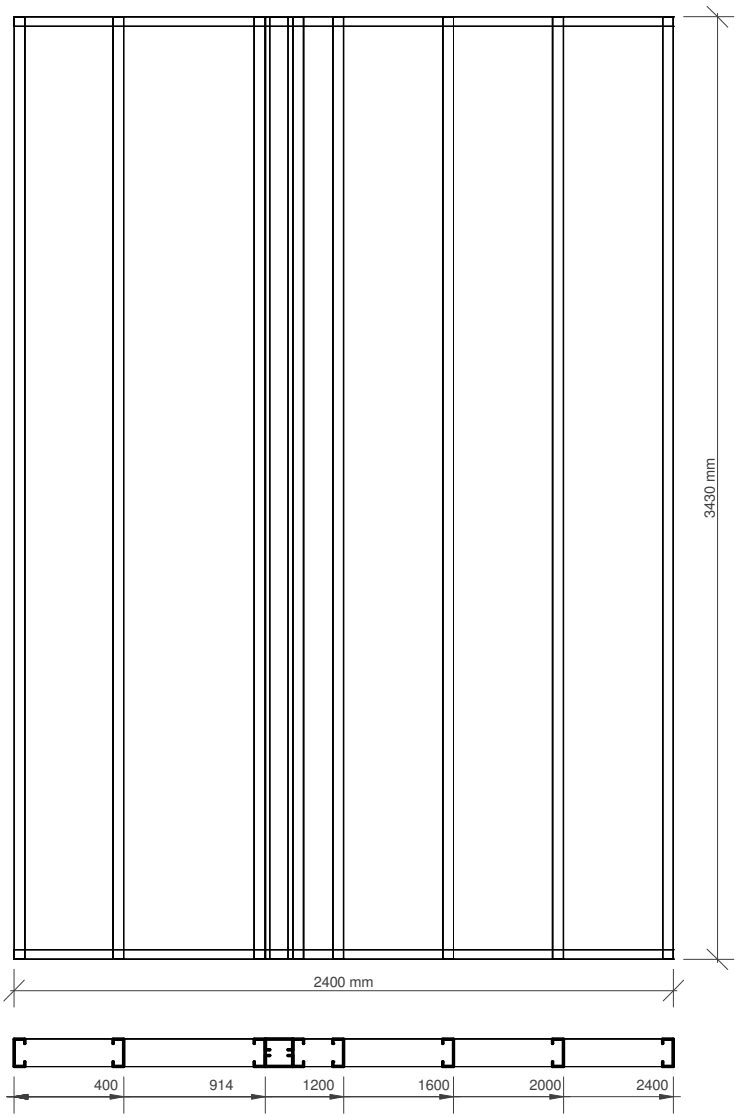

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PIN220

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
8	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGU 100x0.90	1600 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

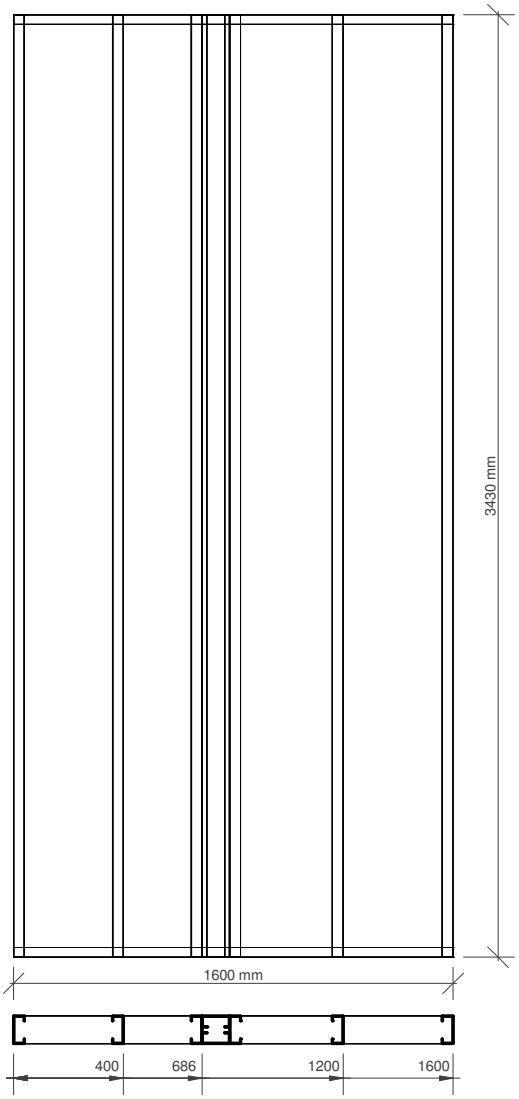

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PIN221

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
4	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGU 100x0.90	1098 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

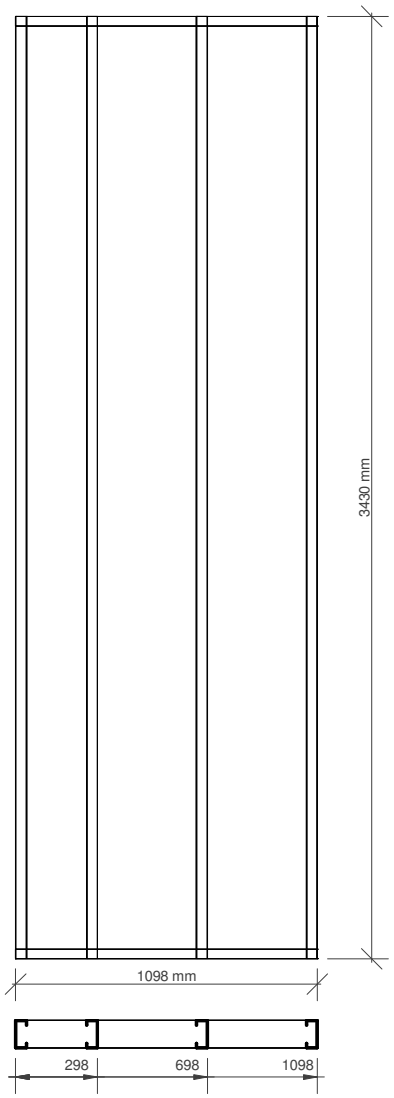

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PIN222

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
2	PGC100X0.90	3276 mm
5	PGC100X0.90	3428 mm
1	PGU 100x0.90	100 mm
1	PGU 100x0.90	1481 mm
1	PGU 100x0.90	1581 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

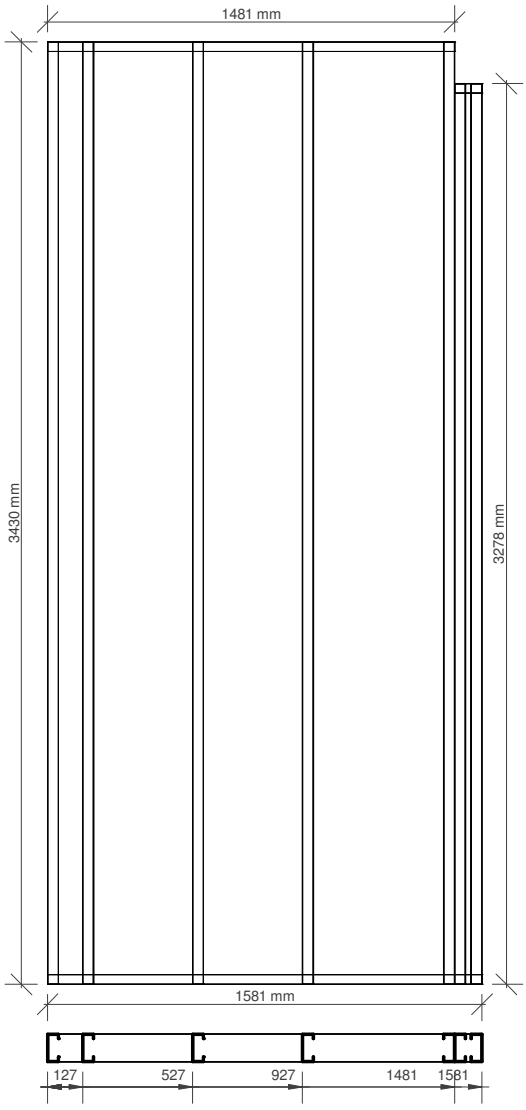

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PIN223

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
4	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGU 100x0.90	1111 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

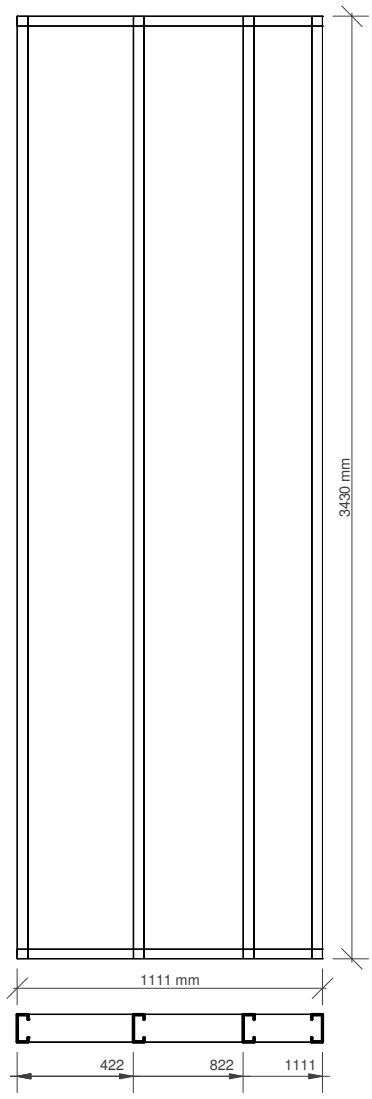

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PIN224

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
2	PGC100X0.90	3276 mm
3	PGC100X0.90	3428 mm
1	PGU 100x0.90	100 mm
1	PGU 100x0.90	711 mm
1	PGU 100x0.90	811 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

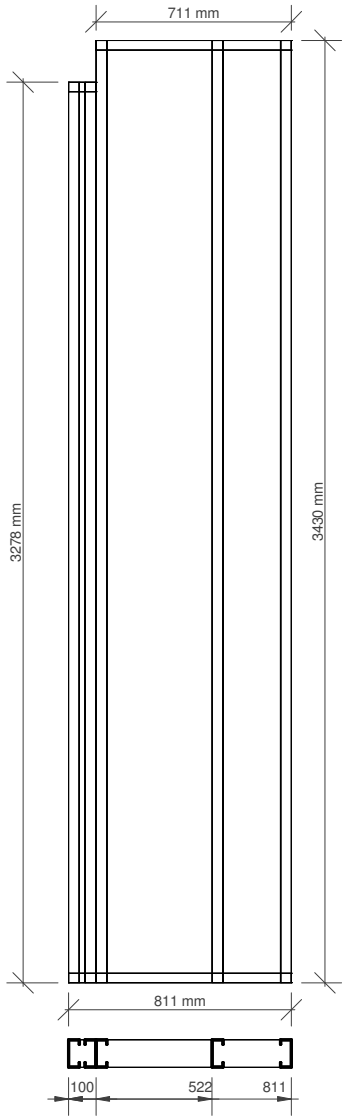

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PIN225

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
2	PGC100X0.90	3276 mm
3	PGC100X0.90	3428 mm
1	PGU 100x0.90	100 mm
1	PGU 100x0.90	719 mm
1	PGU 100x0.90	819 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

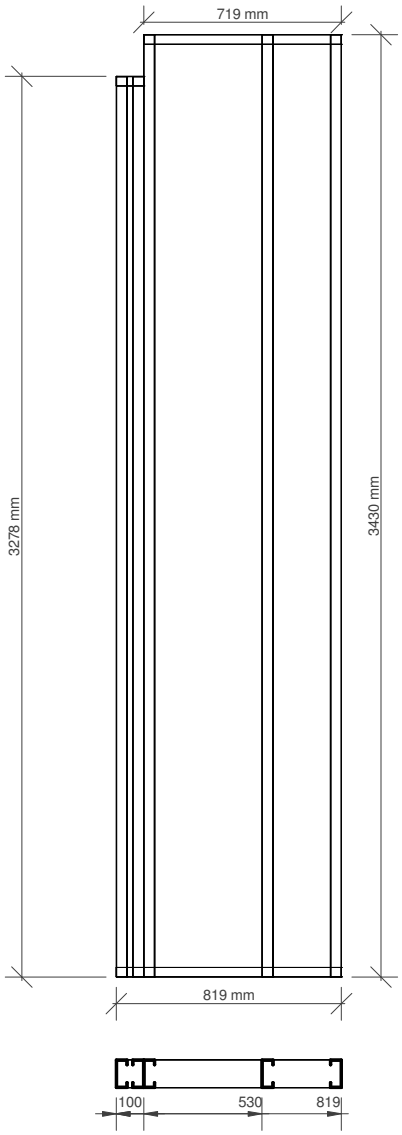

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PIN226

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
2	PGC100X0.90	3276 mm
5	PGC100X0.90	3428 mm
1	PGU 100x0.90	100 mm
1	PGU 100x0.90	1517 mm
1	PGU 100x0.90	1617 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

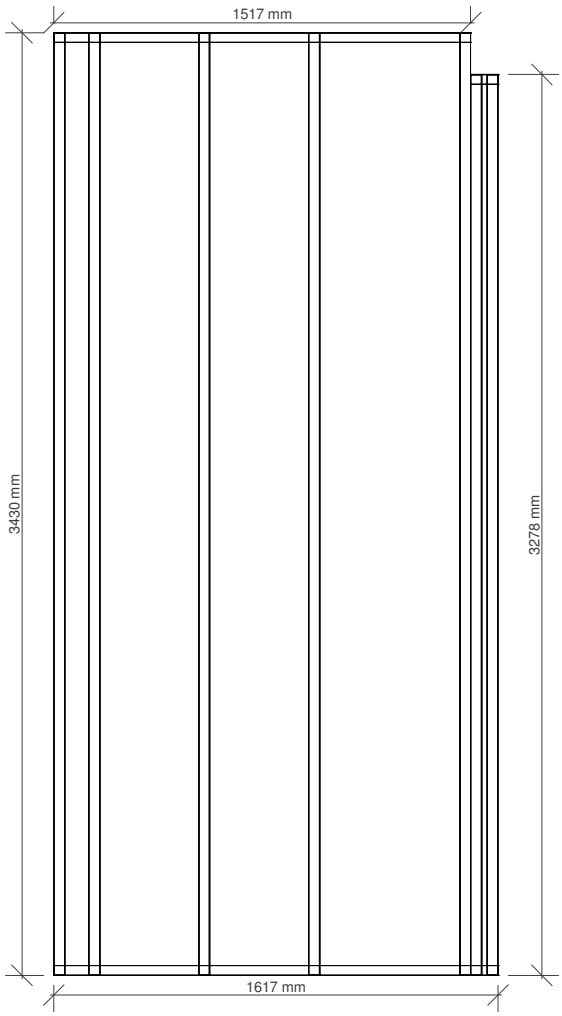



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PIN227

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
7	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGU 100x0.90	2114 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

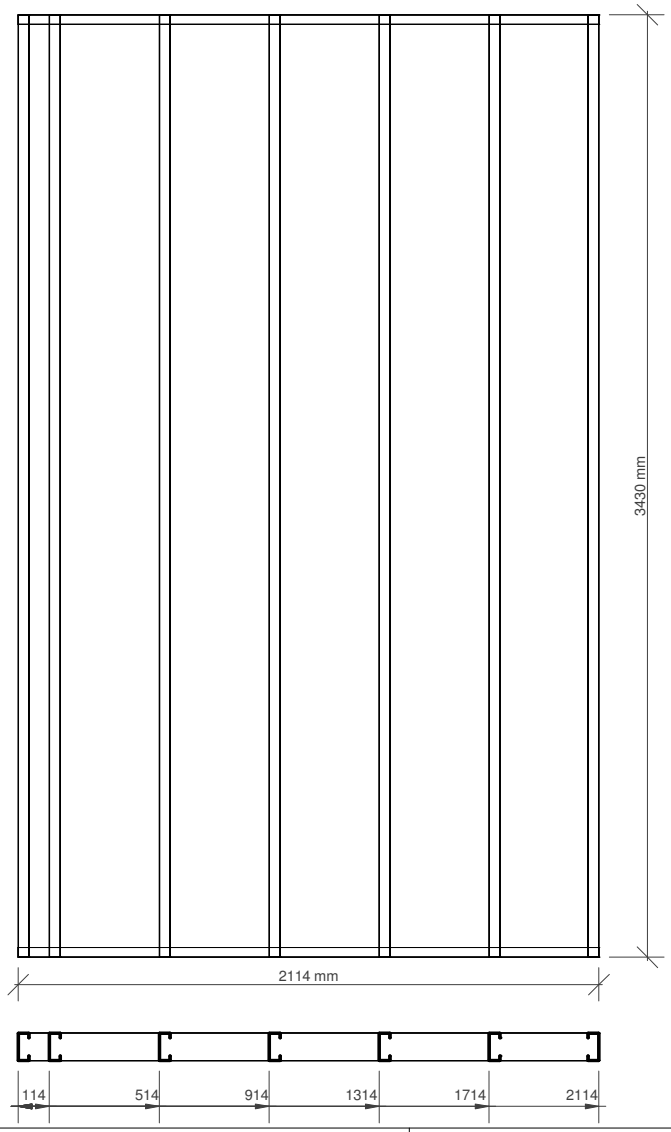

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PIN 301

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
8	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGU 100x0.90	1600 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

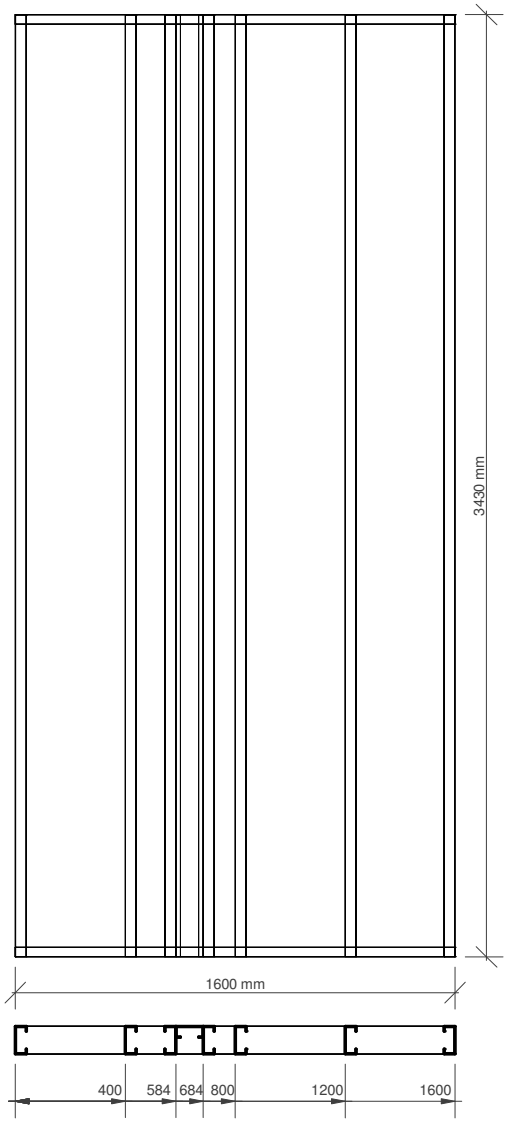

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PIN 302

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
5	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGU 100x0.90	1283 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

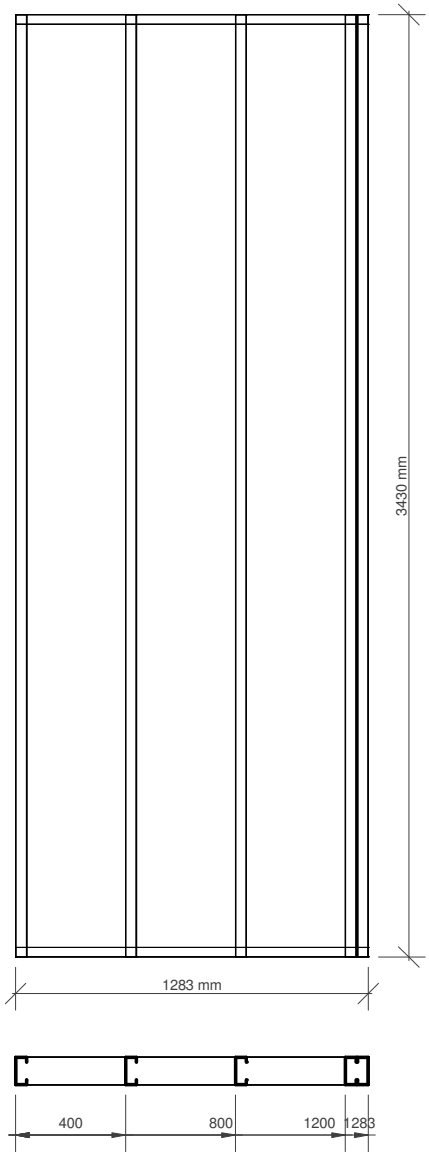

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PIN 303

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
6	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGU 100x0.90	1714 mm

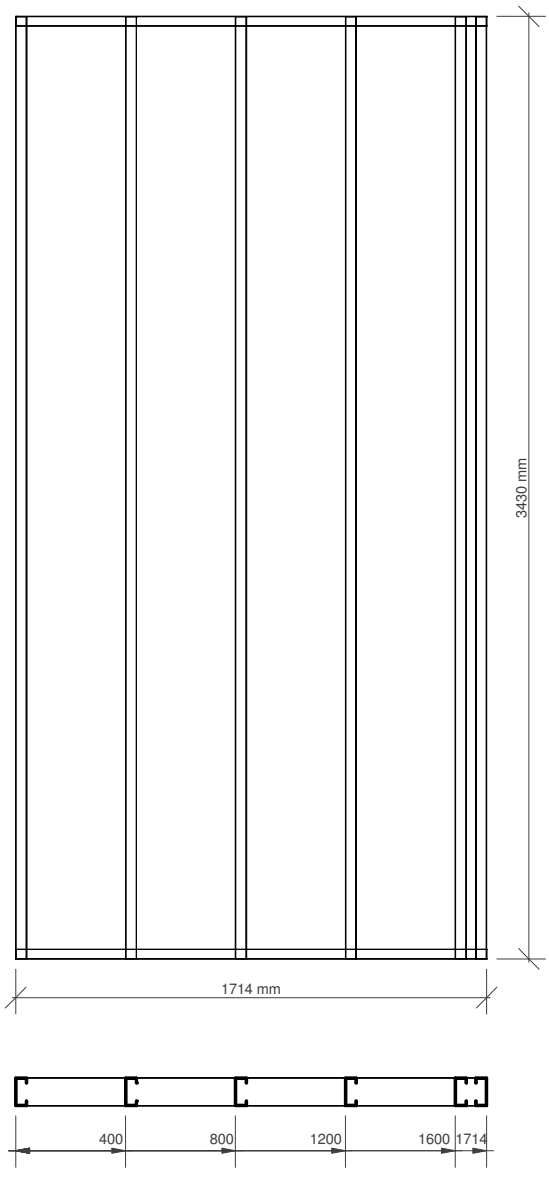

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PIN 304

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
2	PGC100X0.90	1033 mm
2	PGC100X0.90	1166 mm
2	PGC100X0.90	3277 mm
4	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGC150x1.60	1098 mm
2	PGU 100x0.90	100 mm
1	PGU 100x0.90	1098 mm
2	PGU 100x0.90	1178 mm
2	PGU 100x0.90	1611 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

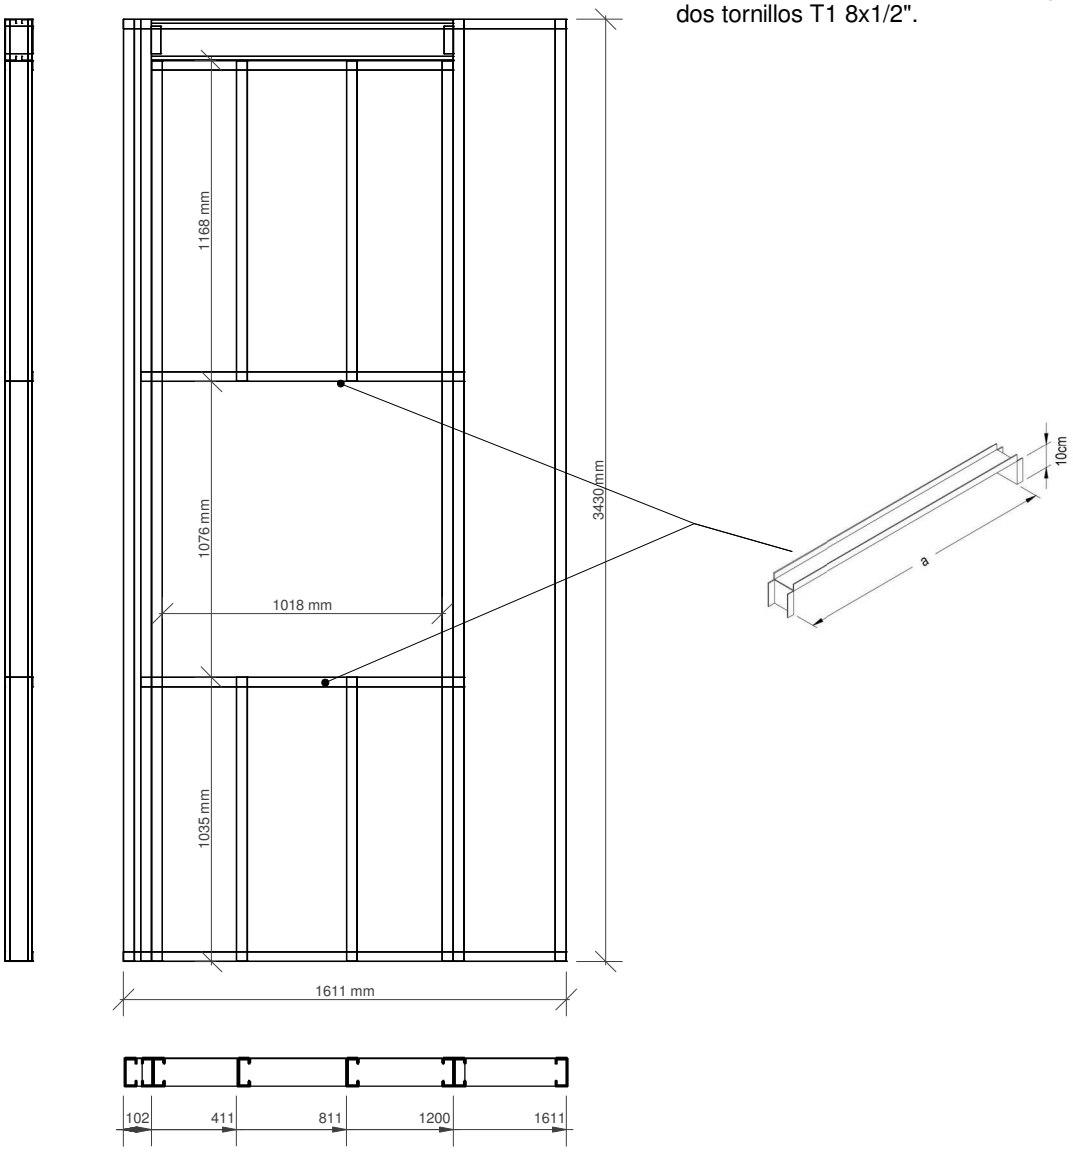

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PIN 305

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
2	PGC100X0.90	1317 mm
7	PGC100X0.90	3428 mm
1	PGU 100x0.90	848 mm
2	PGU 100x0.90	2198 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

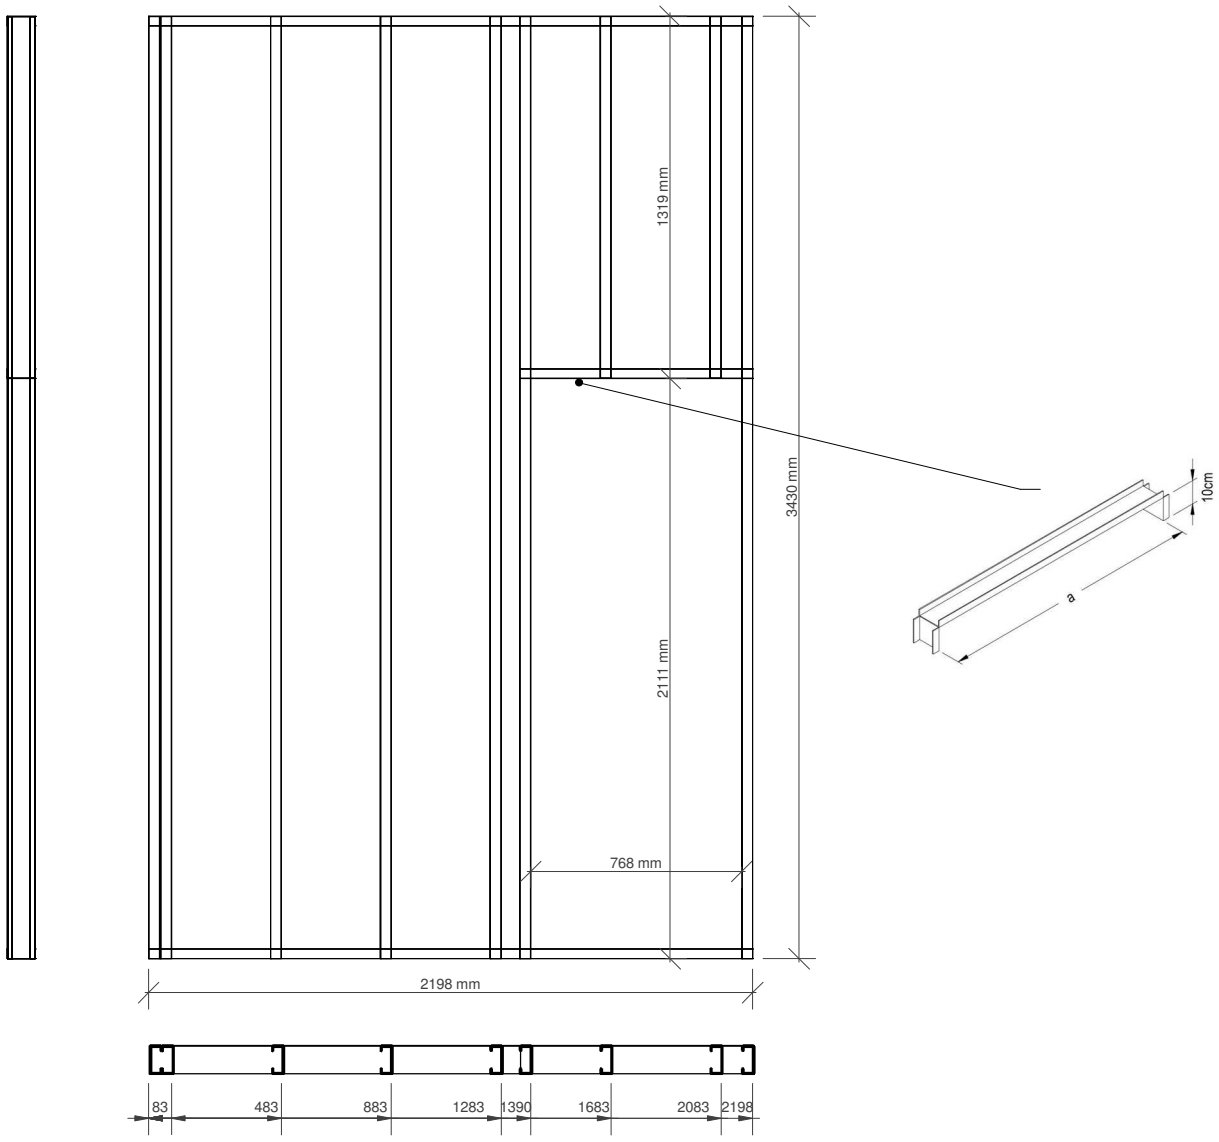

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PIN 306

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
2	PGC100X0.90	1033 mm
2	PGC100X0.90	1166 mm
2	PGC100X0.90	3277 mm
5	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGC150x1.60	1098 mm
2	PGU 100x0.90	100 mm
1	PGU 100x0.90	1098 mm
2	PGU 100x0.90	1138 mm
2	PGU 100x0.90	2011 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

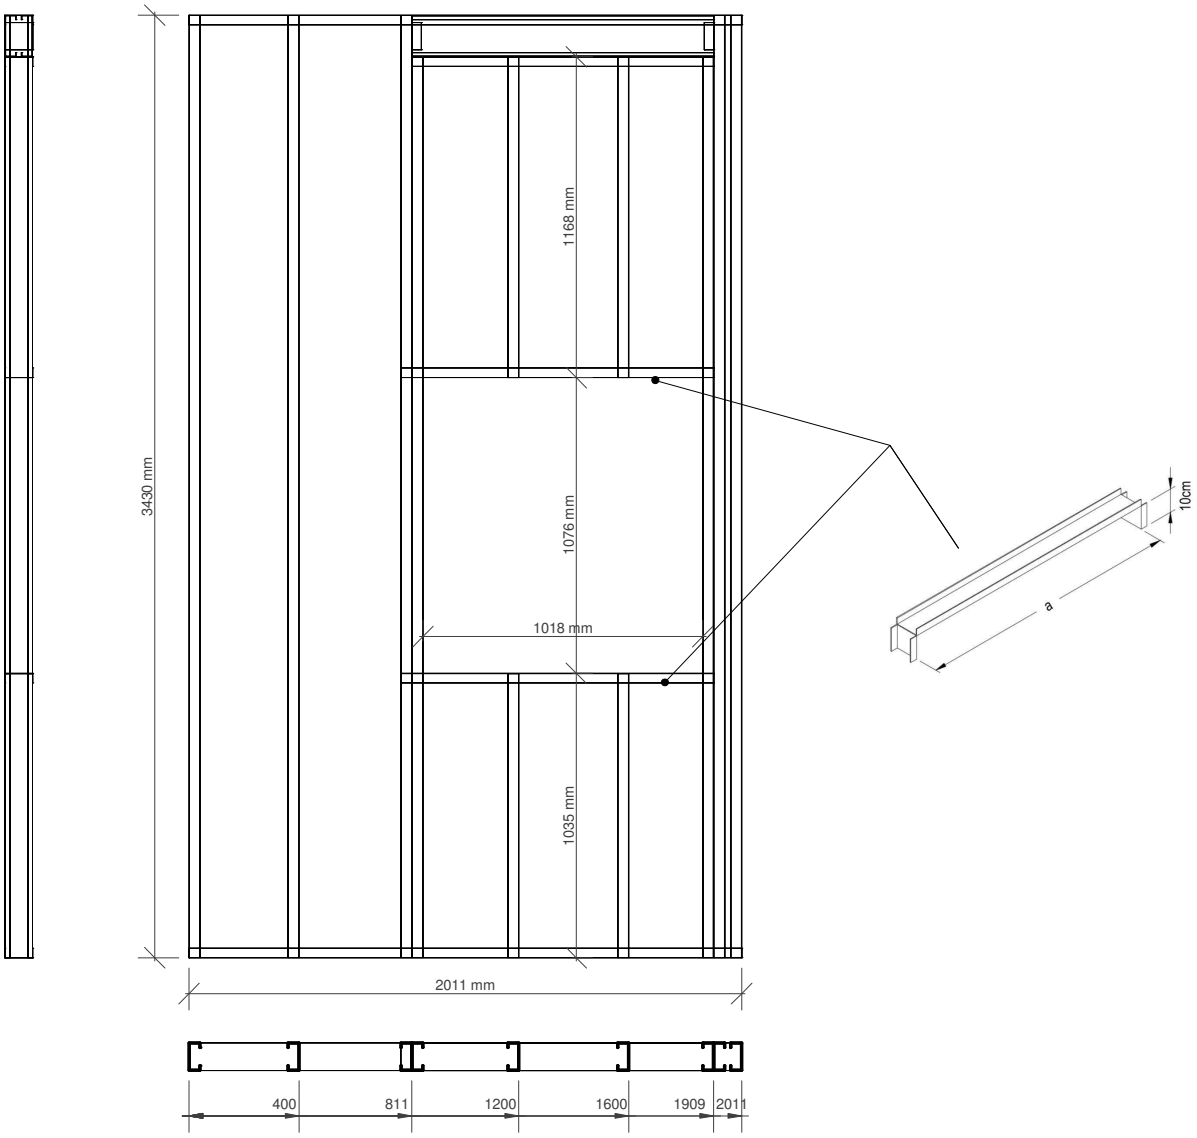

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PIN 307

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
9	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGU 100x0.90	1914 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

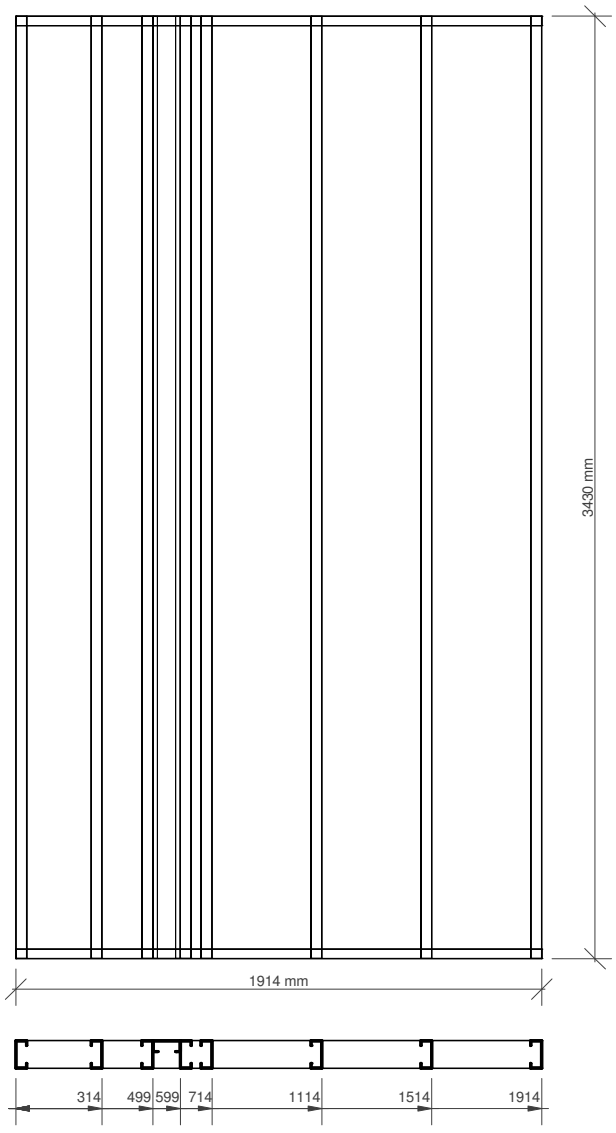

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PIN 308

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
4	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGU 100x0.90	1184 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

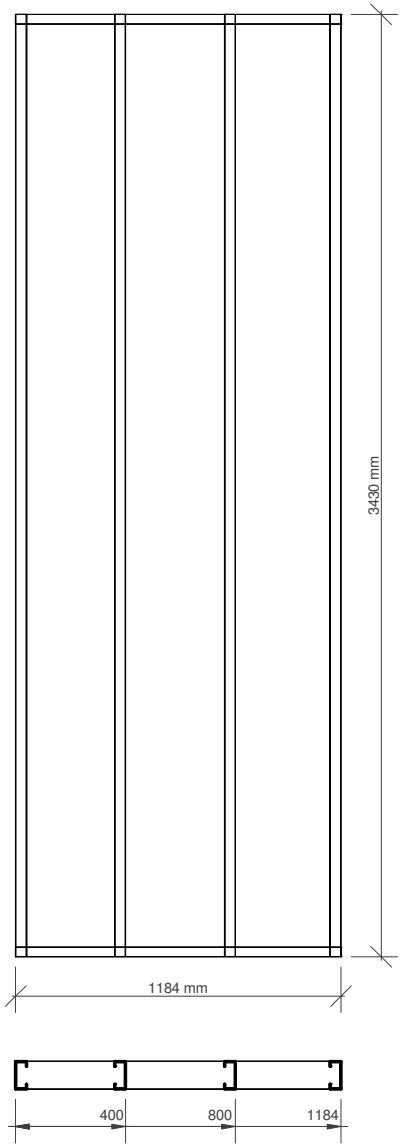

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PIN 309

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
6	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGU 100x0.90	1889 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

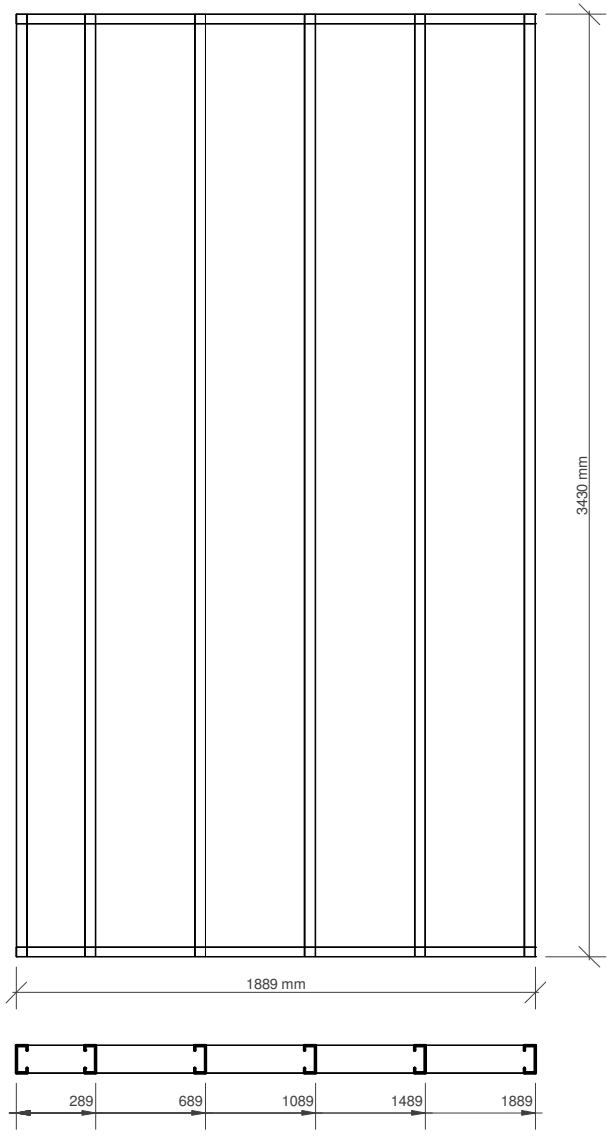

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PIN 310

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
2	PGC100X0.90	1317 mm
7	PGC100X0.90	3428 mm
1	PGU 100x0.90	998 mm
2	PGU 100x0.90	2215 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

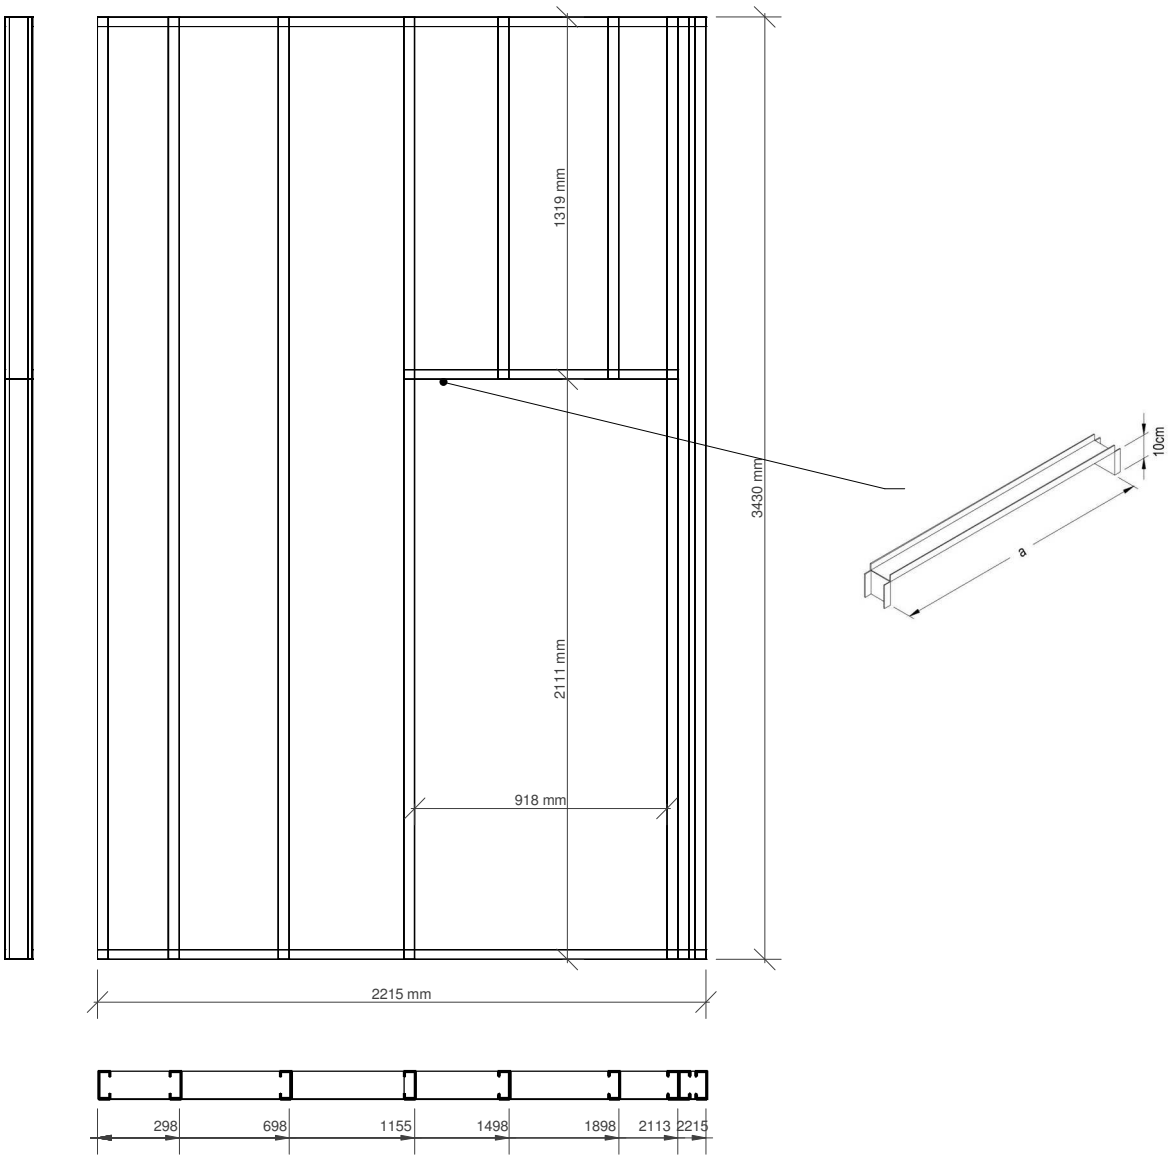

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PIN 311

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
4	PGC100X0.90	1317 mm
4	PGC100X0.90	3428 mm
1	PGU 100x0.90	1498 mm
2	PGU 100x0.90	2114 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

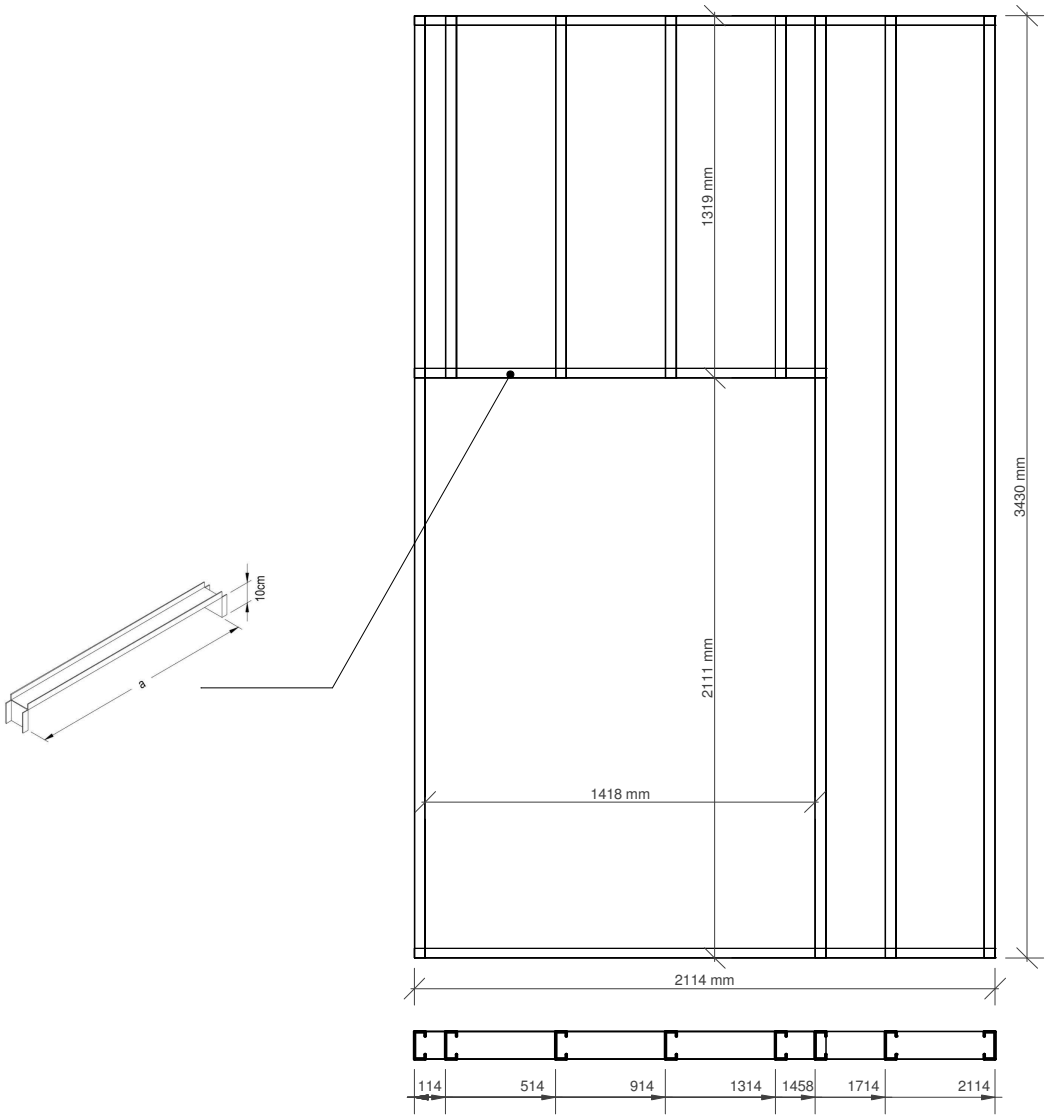

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PIN401

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
1	PGC100X0.90	1317 mm
2	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGC100X0.90	3429 mm
1	PGU 100x0.90	848 mm
2	PGU 100x0.90	1600 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

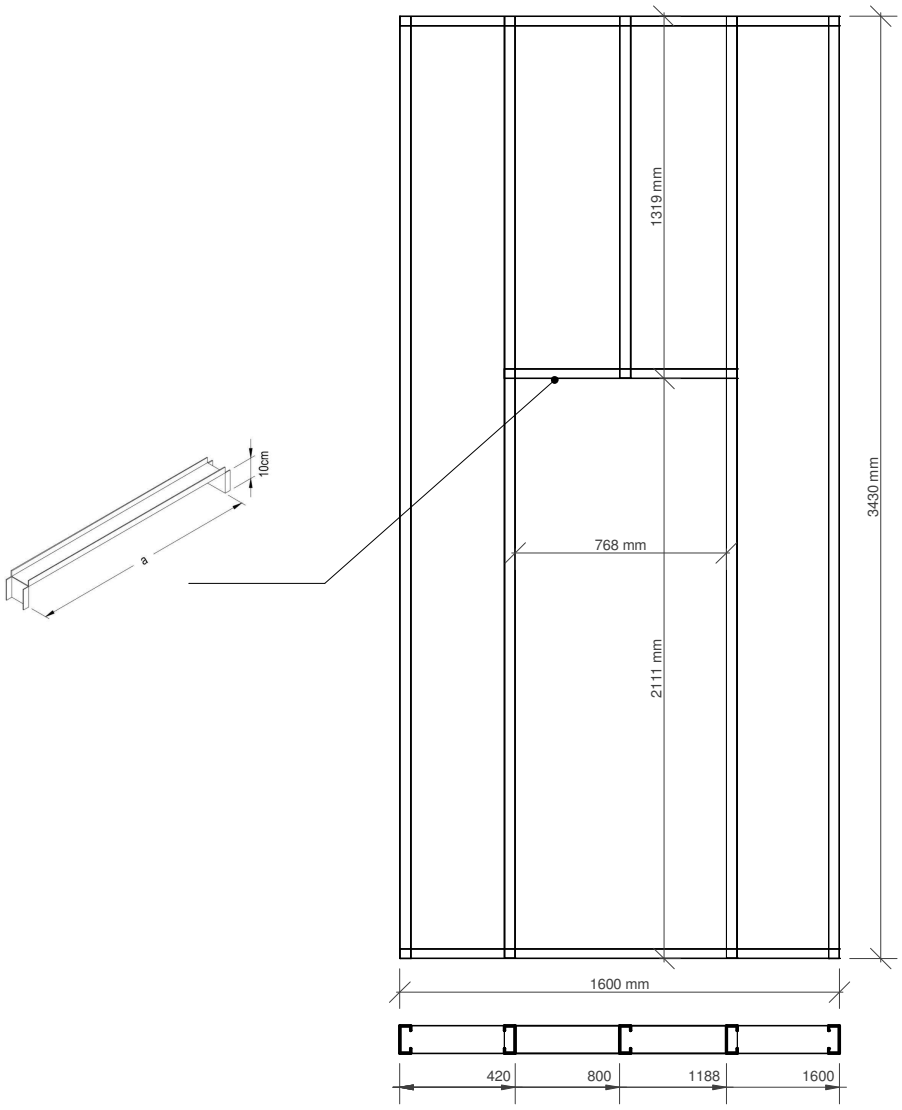

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PIN402

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
3	PGC100X0.90	3428 mm
1	PGC100X0.90	3429 mm
2	PGU 100x0.90	1200 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

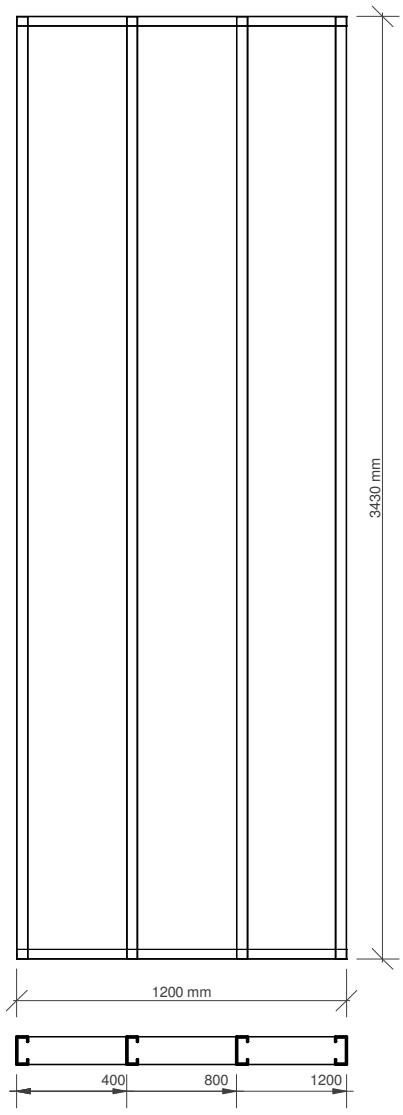

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PIN403

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
7	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGU 100x0.90	2298 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

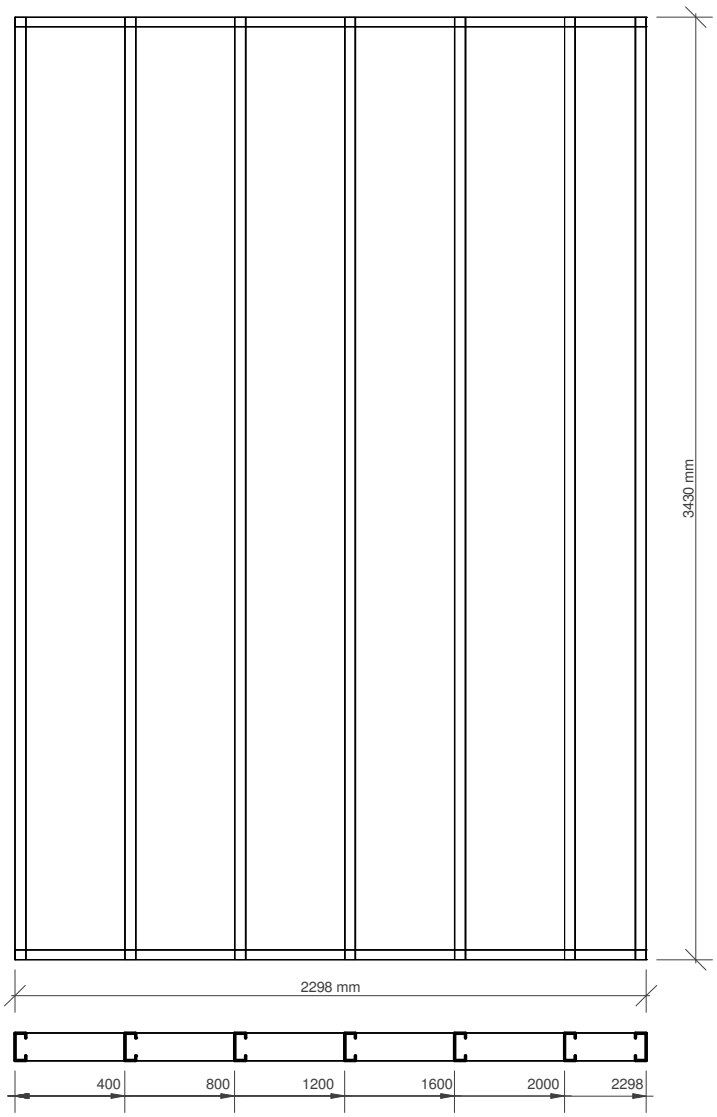

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PIN404

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
5	PGC100X0.90	3428 mm
2	PGU 100x0.90	1363 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

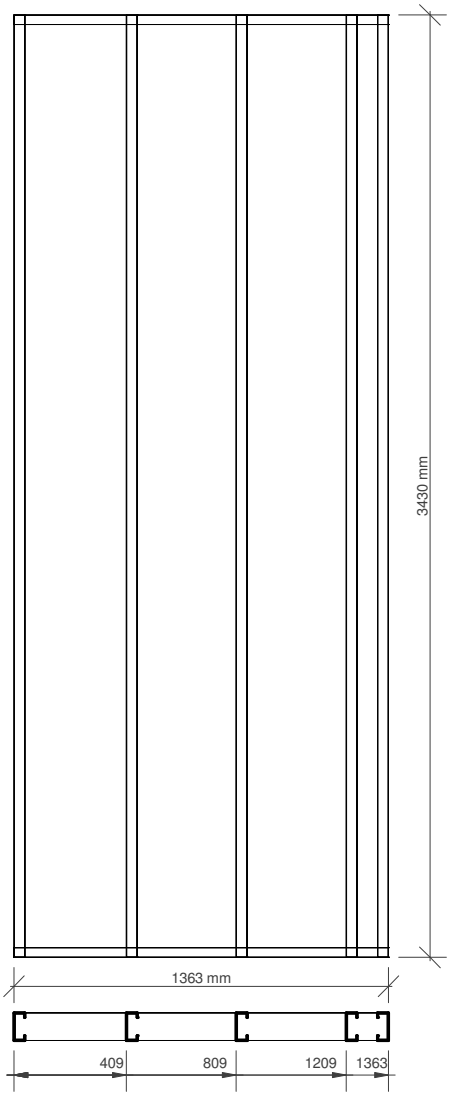

Proyección frontal

2

1 : 25

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PIN405

ESCALA 1:25

Lista de Corte		
Cantidad	Perfil	Longitud
2	PGC100X0.90	1317 mm
7	PGC100X0.90	3428 mm
1	PGU 100x0.90	888 mm
2	PGU 100x0.90	1772 mm

Notas:

- La flecha en la denominación de paneles indica el punto de vista de cada panel en la planta de paneles.
- Las cotas progresivas respecto del extremo izquierdo de la vista del panle. Las cotas indican en la parte superior de los paneles la progresión correspondiente al ALMA de los montantes sobre la grilla.
- Las medidas son entre soleras.
- las medidas son el "mm".
- Las columnas compuestas por dobles deben ser fijados entre si con tornillos cabeza hexagonal 10x3/4" cada 100mm.
- Fijaciones para columnas y vigas tubo: se deberan armar con tornillos tipo T1 10x3/4" cada 100mm.
- Para el armado de la viga dintel se deberan colocar tornillos montante y solera utilizar dos tornillos T1 8x1/2".

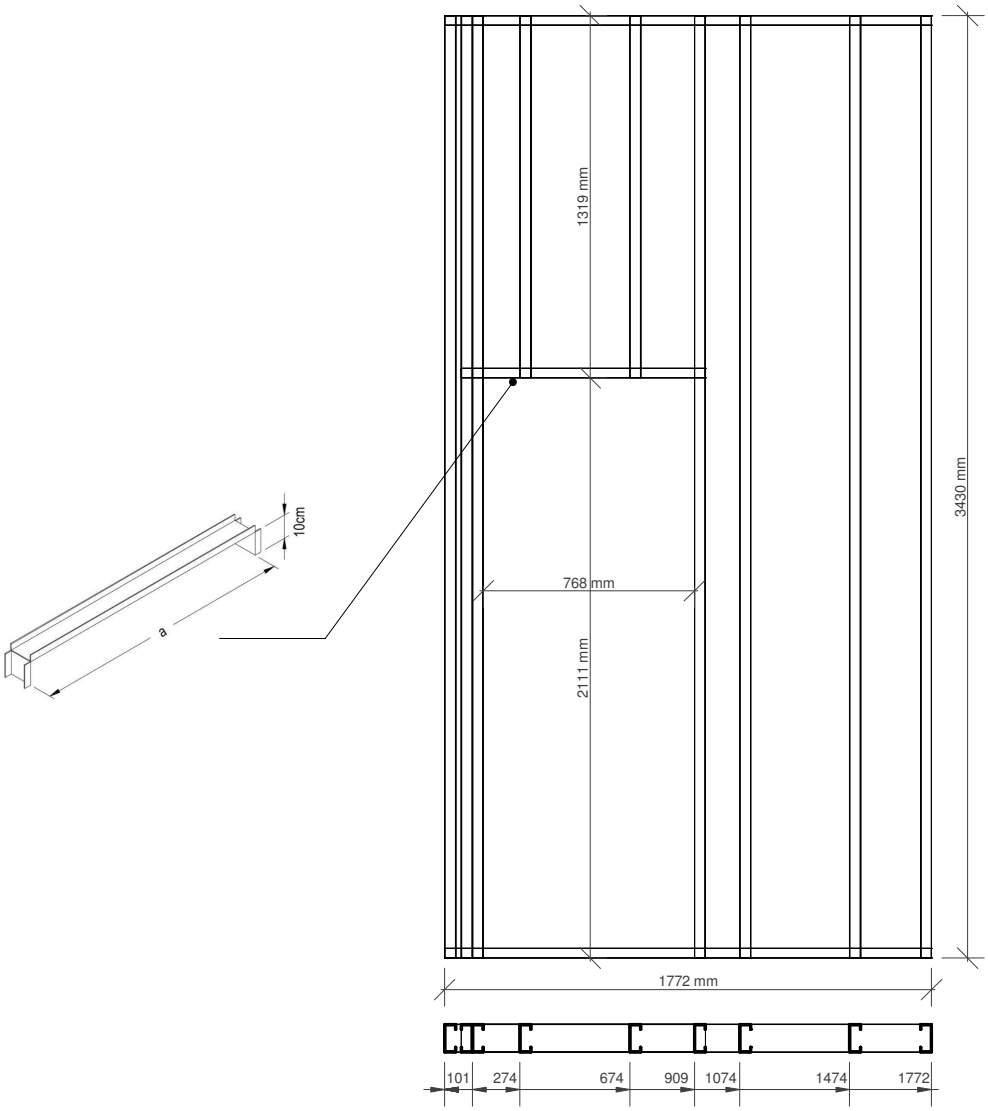

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUD

OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA SALTA

PIN406

ESCALA 1:25
